

**GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO**

**ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**TACNA - TACNA - TACNA**

**“PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL MARCO  
DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES PRONATEL Y EL GOBIERNO  
REGIONAL DE TACNA”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 19 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2024**

**TOMO I DE I**

**TACNA, 26 DE MARZO DE 2024**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO**

**“PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA”**

---

**ÍNDICE**

---

|                                                                        | <b>N° Pág.</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. ORIGEN                                                              | 1              |
| II. SITUACIONES ADVERSAS                                               | 1              |
| III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO | 17             |
| IV. CONCLUSIÓN                                                         | 17             |
| V. RECOMENDACIONES                                                     | 17             |
| APÉNDICE                                                               | 18             |

---

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO**

**“PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se remite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L475-2024-091, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2012-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

**II. SITUACIONES ADVERSAS**

De la revisión efectuada a la información recabada respecto a la ejecución y supervisión del Convenio n.° 025-2015/GOB.REG.TACNA, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL – ahora el Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL<sup>1</sup> y el Gobierno Regional de Tacna, suscrito el 1 de octubre de 2015, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas entre ambas entidades, a fin de contribuir a la sostenibilidad del proyecto “Instalación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”, para garantizar su continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para el beneficio de la población de las localidades e instituciones beneficiarias, se identificó tres (3) situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos.

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

**1. DESCONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, EN EL CONVENIO SUSCRITO CON PRONATEL SOBRE EL “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA”, PONE EN RIESGO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN DESMESTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD BENEFICIARIAS.**

**a) Condición**

**Respecto al Convenio de Cooperación Interinstitucional**

La Ley n.° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tiene como propósito impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, promoviendo el despliegue de la infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y

---

<sup>1</sup> Decreto Supremo n.° 018-2018-MTC, Decreto Supremo que dispone la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, publicado el 10 de diciembre de 2018, en mérito a la cual, toda referencia al FITEL como persona jurídica de Derecho Público o la Secretaría Técnica del FITEL debe entenderse hecha al PRONATEL.

el conocimiento. Es así que, por medio de la referida ley, se declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) que integra a todas las capitales de provincia del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren todos los distritos, a fin de hacer posible la masificación de la Banda Ancha en el país.

En atención a ello, FITEL formuló el proyecto *“Instalación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”*, en adelante el Proyecto, el cual permitiría incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos y centros poblados de Tacna, al implementar redes de transporte y acceso en localidades rurales de la región y así proveer el servicio de internet en las Instituciones Educativas, Centros de Salud y Comisarías del distrito.

Al respecto, el 1 de octubre de 2015, el titular del Gobierno Regional de Tacna, en adelante “Entidad”, suscribió el Convenio de Cooperación Institucional n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA, convenio de cooperación interinstitucional con el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, ahora Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL, el cual tuvo como objeto único dispuesto en su Cláusula Cuarta: “El desarrollo de actividades conjuntas entre el FITEL y el Gobierno Regional de Tacna, a efectos de *contribuir a la sostenibilidad del proyecto para garantizar su continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para el beneficio de la población de las localidades beneficiarias del proyecto*” (Subrayado agregado).

El referido convenio, además establece compromisos entre las partes con la finalidad de llevar a cabo los objetivos del proyecto, para tal efecto las partes designaron en la cláusula décima tercera de dicho convenio, al coordinador de cada Entidad, precisando: “(…) cada una de las partes acuerda designar a un coordinar *con capacidad para tomar decisiones operativas que resulten necesarias a fin de asegurar la ejecución del presente convenio. Los coordinadores designados pueden ser reemplazados conforme lo señale la parte correspondiente, para lo cual bastará la remisión de una comunicación por escrito a la otra parte*” (subrayado agregado), tal designación se muestra a continuación:

**Imagen n.º 1**  
**Coordinadores designados por el Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Por el FITEL:</b>    |                                                           |
| Cargo                   | : Jefe Responsable del Área de Supervisión de Proyectos   |
| Teléfono                | : 615-7800 anexo 2601                                     |
| Correo                  | : mponce@mtc.gob.pe                                       |
| <b>Por el GR-TACNA:</b> |                                                           |
| Cargo                   | : Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tacna |
| Teléfono                | : 052 -583030 anexo 253                                   |
| Correo                  | : kgarcia@regiontacna.gob.pe                              |

**Fuente:** Clausula Décima Tercera del Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA.

Como puede verse, la información del coordinador por parte de la Entidad, corresponde al Gerente General Regional que ejerció funciones en el período 2015; sin embargo, a la fecha corresponde se actualice tal designación con los datos del funcionario que actualmente ocupa el cargo de Gerente General Regional, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cláusula Quinta del referido convenio y que se describen a continuación:

**“5.2 EL GR-TACNA se compromete a lo siguiente:**

- 5.2.1 **Aceptar el equipamiento que le otorgue el FITEL, conforme a lo señalado en el numeral 5.1.5 del presente Convenio, y brindar el mantenimiento y futuras reposiciones de los mismos que resulten necesarias para su óptimo funcionamiento.**
- 5.2.2 **Financiar el costo de los servicios que brinde el operador en las entidades públicas bajo su jurisdicción, las mismas que deben encontrarse ubicadas en las localidades beneficiarias del PROYECTO.**
- 5.2.3 **Gestionar la elaboración de contenidos orientados a los sectores salud y educación beneficiarias del PROYECTO, que estén bajo la competencia del GR-TACNA.**
- 5.2.4 **Velar que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias que contempla el PROYECTO, se realicen haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el PROYECTO.**
- 5.2.5 **Realizar una evaluación anual de los beneficios obtenidos por el PROYECTO a través del levantamiento de indicadores establecidos por el FITEL, información que servirá de insumo para la evaluación ex post del PROYECTO.**
- 5.2.6 **Implementar proyectos complementarios de desarrollo social, gestión territorial y seguridad, soportados sobre la red de transporte terrestre de banda ancha implementada.**
- 5.2.7 **Participar en coordinación con el FITEL en la elaboración del Plan de Trabajo, el mismo que será aprobado por FITEL y será presentado al ADJUDICATARIO, cuatro (04) meses después de la suscripción del Contrato de Financiamiento del PROYECTO” (Énfasis agregado).**

Asimismo, respecto a la vigencia del convenio se acordó que se extendería por el plazo que dure la vigencia del Contrato de Financiamiento no reembolsable del Proyecto que suscriban el Contratista y PRONATEL, el mismo cuya vigencia se extenderá hasta el 21 de julio de 2032, fecha en que debe culminar el período de operación de la Red de Acceso, como se desarrollará más adelante.

### **Respecto a la ejecución del proyecto de Instalación de Banda Ancha en la región Tacna**

El 9 de mayo de 2018, PRONATEL suscribió el contrato de financiamiento con la empresa Orocom S.A.C. para la ejecución del Proyecto *“Instalación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”*, con un monto de financiamiento de US\$ 25 902 859,44 dólares americanos, consignando que la población beneficiada será de 17 401 habitantes y que los objetivos del proyecto son los siguientes:

- a) **Atender la demanda de acceso a internet y de acceso a intranet en cincuenta y dos (52) Localidades Beneficiarias, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas**
- b) **Brindar una conexión de acceso a internet e intranet a ciento tres (103) instituciones Abonadas Obligatorias conformadas por: veinticuatro (24) establecimientos de salud, once (11) comisarías y sesenta y ocho (68) locales escolares de gestión estatal.**
- c) **Desarrollar programas de Construcción de Capacidades, que comprenden las actividades de sensibilización y difusión, elaboración de contenidos y capacitación en cada una de las Localidades Beneficiarias.**

Conforme a los objetivos del Proyecto, se implementó una Red de Transporte de fibra óptica, e instaló una Red de Acceso inalámbrico, cuya operación y mantenimiento se encuentra aún en ejecución hasta el 21 de julio de 2032, como se detalla a continuación:

- **La Red de Transporte, estará conformada por cerca de seiscientos once (611) kilómetros de fibra óptica ADSS de cuarenta y ocho (48) hilos, que será desplegada sobre la**

infraestructura de las redes de alta tensión, media tensión eléctrica y postes en algunos tramos de las redes viales disponibles en la Región Tacna.

- La Red de Acceso, es la infraestructura y el equipamiento electrónico que permitirá a los usuarios finales acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones y acceso a intranet utilizando para ellos la Red de Transporte.

Es así, que el 21 de julio de 2022, PRONATEL y el contratista Orocom S.A.C. suscribieron el Acta de Conformidad de Instalaciones y Pruebas de la Red de Acceso, dando inicio al periodo de operación del proyecto por un periodo de 120 meses, teniendo como fecha de culminación el 21 de julio de 2032, resulta oportuno mencionar que, el inicio del periodo de operación del proyecto dio inicio a la provisión del servicio de internet en las instituciones abonadas obligatorias, entre ellos, instituciones educativas y establecimientos de salud bajo el ámbito de la Entidad, listadas a continuación:

**Cuadro n.º 1**  
**Instituciones Abonadas Obligatorias beneficiarias del proyecto**  
**Instituciones Educativas**

| Nº | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA   | PROVINCIA | DISTRITO               | LOCALIDAD                                       |
|----|--------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | TACNA     | CALANA                 | CERRO BLANCO                                    |
| 2  | IE 376                               | TACNA     | CALANA                 | PIEDRA BLANCA                                   |
| 3  | IE 377                               | TACNA     | CALANA                 | SANTA RITA                                      |
| 4  | 443 SANTA TERESITA                   | TACNA     | INCLAN                 | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROTER SAMA              |
| 5  | IE 329                               | TACNA     | INCLAN                 | TOMASIRI                                        |
| 6  | 354 VIRGEN MARIA                     | TACNA     | INCLAN                 | SAMA GRANDE                                     |
| 7  | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN            | TACNA     | INCLAN                 | SAMA GRANDE                                     |
| 8  | 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEEL     | TACNA     | LA YARADA DE LOS PALOS | PESCADORES SANTA ROSA                           |
| 9  | 42044 ALFONSO UGARTE                 | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | LOS PALOS                                       |
| 10 | 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | PUEBLO LIBRE                                    |
| 11 | 42261 NUEVO COPARE                   | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | COPARE II (NUEVO COPARE)                        |
| 12 | 340 DIVINO NIÑO JESUS                | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              |
| 13 | 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON  | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         |
| 14 | IE 356                               | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         |
| 15 | 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | LA ESPERANZA 1                                  |
| 16 | IE 407                               | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASOCIACION DE CRIAMEN 26 DE OCTUBRE LAS LAGUNAS |
| 17 | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR       | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 4                                  |
| 18 | IE 233                               | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   |
| 19 | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   |
| 20 | 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              |
| 21 | IE 304                               | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | LOS OLIVOS                                      |
| 22 | 42017 NEISER G. LLACSA ARCE          | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | LOS OLIVOS                                      |
| 23 | IE 352                               | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS    | LOS PALOS                                       |
| 24 | 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | TACNA     | PACHIA                 | CALIENTES                                       |
| 25 | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN           | TACNA     | PACHIA                 | MICULLA                                         |
| 26 | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE        | TACNA     | PACHIA                 | MICULLA                                         |
| 27 | 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | TACNA     | PACHIA                 | PACHIA                                          |
| 28 | IE 43507                             | TACNA     | PALCA                  | EL INGENIO LA LIBERTAD (ALTO INGENIO)           |
| 29 | 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | TACNA     | PALCA                  | PALCA                                           |

| N° | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                     | PROVINCIA     | DISTRITO          | LOCALIDAD                    |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 30 | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                | TACNA         | SAMA              | VILA VILA                    |
| 31 | IE 380                                                 | TACNA         | SAMA              | BUENA VISTA                  |
| 32 | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES                         | TACNA         | SAMA              | BOCA DEL RIO                 |
| 33 | IE 42259                                               | TACNA         | SAMA              | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)     |
| 34 | 42207 SAN PEDRO                                        | TACNA         | SAMA              | VILA VILA                    |
| 35 | IE 364                                                 | TACNA         | TACNA             | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO) |
| 36 | IE. 42205                                              | TARATA        | ESTIQUE           | ESTIQUE                      |
| 37 | 42125 JOSE MANUEL UBALDE                               | TARATA        | ESTIQUE           | TALABAYA                     |
| 38 | 339 ESTIQUE PAMPA                                      | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA     | ESTIQUE PAMPA                |
| 39 | 42086 HEROES ALBARRACIN                                | TARATA        | HEROES ALBARRACIN | CHUCATAMANI                  |
| 40 | IE 319                                                 | TARATA        | SITAJARA          | SITAJARA                     |
| 41 | 42096 MATEO PUMACAHUA                                  | TARATA        | SUSAPAYA          | SUSAPAYA                     |
| 42 | 332 YABROCO                                            | TARATA        | SUSAPAYA          | YABROCO                      |
| 43 | RAMON COPAJA                                           | TARATA        | TARATA            | PUEBLO LIBRE UMUTE           |
| 44 | 310 TARUCACHI                                          | TARATA        | TARUCACHI         | TARUCACHI                    |
| 45 | 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI                          | TARATA        | TICACO            | TICACO                       |
| 46 | IE 311                                                 | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA                      |
| 47 | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                 | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA                      |
| 48 | IE 347                                                 | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUENA                    |
| 49 | TUPAC AMARU II                                         | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUENA                    |
| 50 | 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ                        | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN        |
| 51 | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE                         | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA                   |
| 52 | 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA                   |
| 53 | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI                       | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS                   |
| 54 | 428 LAS VILCAS - ITE                                   | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS                   |
| 55 | MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA BLINDADA DEL FUERTE ARICA | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN        |
| 56 | IE 42233                                               | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | ALTO CAMIARA                 |
| 57 | 432 SITANA                                             | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PAMPA SITANA                 |
| 58 | 403 PUENTE CAMIARA                                     | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PUENTE CAMIARA               |
| 59 | 430 VIRGEN DEL CARMEN                                  | CANDARAVE     | CAMILACA          | NUEVA CAMILACA               |
| 60 | IE 326                                                 | CANDARAVE     | CAMILACA          | ALTO CAMILACA                |
| 61 | IE 349                                                 | CANDARAVE     | CAMILACA          | CAMBAYA                      |
| 62 | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                              | CANDARAVE     | CAMILACA          | CAMBAYA                      |
| 63 | 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                           | CANDARAVE     | CAMILACA          | CORAGUAYA                    |
| 64 | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI                           | CANDARAVE     | CAMILACA          | ALTO CAMILACA                |
| 65 | 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR                            | CANDARAVE     | CANDARAVE         | JIRATA                       |
| 66 | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                        | CANDARAVE     | CANDARAVE         | MULLINI                      |
| 67 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO                 | CANDARAVE     | QUILAHUANI        | QUILAHUANI                   |
| 68 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA SERRANO                 | CANDARAVE     | QUILAHUANI        | QUILAHUANI                   |

**Elaborado por:** Comisión de Control

**Fuente:** Contrato de Financiamiento del Proyecto.

**Cuadro n.º 2**  
**Instituciones Abonadas Obligatorias beneficiarias del proyecto**  
**Establecimientos de Salud**

| Nº | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | PROVINCIA     | DISTRITO               | LOCALIDAD                     |
|----|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1  | INCLAN                              | TACNA         | INCLAN                 | SAMA GRANDE                   |
| 2  | SANTA ROSA                          | TACNA         | LA YARADA DE LOS PALOS | PESCADORES SANTA ROSA         |
| 3  | 28 DE AGOSTO                        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) |
| 4  | 5 Y 6 LA YARADA                     | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS    | ASENTAMIENTO 5 Y 6            |
| 5  | LOS OLIVOS                          | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS    | LOS OLIVOS                    |
| 6  | LOS PALOS                           | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS    | LOS PALOS                     |
| 7  | PACHIA                              | TACNA         | PACHIA                 | PACHIA                        |
| 8  | PALCA                               | TACNA         | PALCA                  | PALCA                         |
| 9  | VILA VILA                           | TACNA         | SAMA                   | VILA VILA                     |
| 10 | BOCA DEL RIO                        | TACNA         | SAMA                   | BOCA DEL RIO                  |
| 11 | TALABAYA                            | TARATA        | ESTIQUE                | TALABAYA                      |
| 12 | ESTIQUE PAMPA                       | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA          | ESTIQUE PAMPA                 |
| 13 | CHUCATAMANI                         | TARATA        | HEROES ALBARRACIN      | CHUCATAMANI                   |
| 14 | SITAJARA                            | TARATA        | SITAJARA               | SITAJARA                      |
| 15 | SUSAPAYA                            | TARATA        | SUSAPAYA               | SUSAPAYA                      |
| 16 | YABROCO                             | TARATA        | SUSAPAYA               | YABROCO                       |
| 17 | TARUCACHI                           | TARATA        | TARUCACHI              | TARUCACHI                     |
| 18 | TICACO                              | TARATA        | TICACO                 | TICACO                        |
| 19 | BOROGUENA                           | JORGE BASADRE | ILABAYA                | BOROGUEÑA                     |
| 20 | ILABAYA                             | JORGE BASADRE | ILABAYA                | ILABAYA                       |
| 21 | PAMPA BAJA                          | JORGE BASADRE | ITE                    | PAMPA BAJA                    |
| 22 | CAMBAYA                             | CANDARAVE     | CAMILACA               | CAMBAYA                       |
| 23 | CAMILACA                            | CANDARAVE     | CAMILACA               | ALTO CAMILACA                 |
| 24 | P.S. QUILAHUANI                     | CANDARAVE     | QUILAHUANI             | QUILAHUANI                    |

**Elaborado por:** Comisión de Control

**Fuente:** Contrato de Financiamiento del Proyecto.

### **Respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de parte de la Entidad**

El 19 de enero de 2024, a fin de recabar información respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio n° 025-2015/GOB.REG.TACNA, se realizó una entrevista al Gerente General Regional, según consta en la respectiva Acta, y ante la pregunta n.º 2 *“Tiene conocimiento de los alcances del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna” (en que consiste, cuáles son las obligaciones de ambas partes, que Gerencias intervienen en su ejecución y supervisión)”*, respondió:

*“Si, por el cual el GRT debe pagar una contraprestación mensual, OROCOM manifiesta que el MTC debe transferir los recursos”.*

Asimismo, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Entidad se efectuaron diversas consultas, obteniendo la siguiente información:

**Cuadro n.º 3**  
**Resultado de la entrevista efectuada al Gerente General Regional**

| Preguntas efectuadas respecto al Convenio n° 025-2015/GOB.REG.TACNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Respuestas                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "5. Precise si tiene conocimiento, que funcionarios y/o servidores intervienen en la conformidad del servicio, si se les asignó funciones mediante documento formal, y quien supervisa tales labores, alcance una copia de la documentación que sustente su respuesta"                                                                                                                            | Supervisa la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, por ser parte de sus funciones, toda vez que DIRESA y DRET dependen de dicha gerencia. |
| "6. De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Tacna, precise si a la fecha se ha brindado el mantenimiento a los equipos otorgados por PRONATEL o de ser el caso se efectuó la reposición de los mismos para su óptimo funcionamiento                                                                                                                                     | No se puede precisar en este momento                                                                                                                    |
| "7. Sírvase precisar, si se ha verificado que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias de la Región Tacna (colegios, establecimientos de salud y/o comisarías), se realizaron haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el Proyecto".                                                                                                    | No puede precisar dicha información                                                                                                                     |
| "8. Precise si tiene conocimiento, si el Gobierno Regional de Tacna efectuó la evaluación anual de los beneficios obtenidos por el Proyecto, de ser el caso, precise el nombre del funcionario designado para efectuar tal labor, alcance una copia de las evaluaciones efectuadas".                                                                                                              | No puede precisar dicha información                                                                                                                     |
| "10. Precise si tiene conocimiento, si el referido convenio ha sido modificado o ampliado mediante adendas y/o convenios adicionales con el contratista Orocom S.A.C., considerando que su vigencia se extiende hasta la vigencia del Contrato de Financiamiento el cual concluye el 21 de julio de 2032, de ser el caso proporcione una copia de los documentos de modificación y/o ampliación." | Se había realizado una adenda a mediados del año 2023, información que se debería solicitar a Desarrollo Social.                                        |

**Elaborado por:** Comisión de Control.

**Fuente:** Acta de entrevista del 19 de enero de 2024.

De la información recabada, como resultado de la entrevista efectuada no se logró obtener mayores alcances que permitan corroborar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Entidad, a fin de contribuir a la sostenibilidad del Protecto.

Ahora bien, en atención a lo manifestado por el Gerente General Regional, respecto al funcionario responsable de dar conformidad a la prestación del servicio de internet, se efectuó una entrevista con el Gerente de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo resultado se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 4**  
**Resultado de la entrevista efectuada al Gerente de Desarrollo e Inclusión Social**

| Preguntas efectuadas respecto al Convenio n° 025-2015/GOB.REG.TACNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "2. ¿Tiene conocimiento de los alcances del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna? (en que consiste, cuáles son las obligaciones de ambas partes, que Gerencias intervienen en su ejecución y supervisión)". | Si tiene conocimiento que es un servicio de internet para Colegios y Establecimientos de Salud, <b>pero no tiene conocimiento del encargado de la supervisión</b> , sin embargo, los recibos de pago que llegan a esta oficina son remitidos a Administración. |
| "5. Precise si tiene conocimiento, que funcionarios y/o servidores intervienen en la conformidad del servicio, si se les asignó funciones mediante documento formal, y quien supervisa tales labores, alcance una copia de la documentación que sustente su respuesta"                                                                  | <b>La Gerencia de Administración.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| "6. De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Tacna, precise si a la fecha se ha brindado el mantenimiento a los equipos otorgados por PRONATEL o de ser el caso se efectuó la reposición de los mismos para su óptimo funcionamiento                                                                           | Desconoce.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "7. Sírvase precisar, si se ha verificado que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias de la Región Tacna (colegios, establecimientos de salud y/o                                                                                                                                               | No podría precisar.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Preguntas efectuadas respecto al Convenio n° 025-2015/GOB.REG.TACNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuestas                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| comisarías), se realizaron haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el Proyecto”.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| “8. Precise si tiene conocimiento, si el Gobierno Regional de Tacna efectuó la evaluación anual de los beneficios obtenidos por el Proyecto, de ser el caso, precise el nombre del funcionario designado para efectuar tal labor, alcance una copia de las evaluaciones efectuadas”.                                                                                                             | Desconoce, sólo concilió los pagos hacia la Gerencia de Administración. |
| “10. Precise si tiene conocimiento, si el referido convenio ha sido modificado o ampliado mediante adendas y/o convenios adicionales con el contratista Orocom S.A.C, considerando que su vigencia se extiende hasta la vigencia del Contrato de Financiamiento el cual concluye el 21 de julio de 2032, de ser el caso proporcione una copia de los documentos de modificación y/o ampliación”. | Desconoce.                                                              |

**Elaborado por:** Comisión de Control.

**Fuente:** Acta de entrevista del 19 de enero de 2024.

Sobre el particular, con oficio n.° 1439-2023-CG/GRTA del 22 de noviembre de 2023, reiterado con el oficio n.° 1519-2023-CG/GRTA del 13 de diciembre de 2023, se solicitó al Titular de la Entidad diversa información, entre ella: “2. Remita información respecto a la evaluación anual del periodo 2022, sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto, en atención al Punto 5.2.5 del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna, suscrito el 01 de octubre del 2015”, recibiendo respuesta con el oficio n.° 039-2024-GRA/GOB.REG.TACNA del 8 de enero de 2024, de la Gerencia Regional de Administración precisando:

*“2. Respecto a la evaluación anual del periodo 2022 sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto, (...) de las sesenta y ocho (68) instituciones educativas donde se viene brindando el servicio de internet e intranet de parte del contratista Orocom S.A.C., las instituciones de los distritos de Tarata y Candarave reportan: inestabilidad de internet, señal baja e incluso reportan no contar con energía eléctrica; y de los veinticuatro (24) establecimientos de salud, diez (10) ha reportado: inestabilidad, puestos no habilitados y falta de reubicación de antenas”.*

Asimismo, de las versiones obtenidas, en las entrevistas efectuadas al Gerente General Regional y el Gerente de Desarrollo e Inclusión Social, se observa incongruencias respecto a que funcionario es el responsable de la coordinación para la ejecución del Convenio n.° 025-2015/GOB.REG.TACNA, en cumplimiento de los compromisos asumidos, al advertirse desconocimiento sobre su contenido, a pesar que como se ha expuesto en los párrafos anteriores, desde el 22 de julio de 2022 se ha dado inicio al periodo de Operación del proyecto, el cual involucra la provisión del servicio de internet, a cargo de Orocom S.A.C. contratado por PRONATEL a las instituciones abonadas (Centros de Salud e Instituciones Educativas).

Sobre el particular, durante el año 2023, se identificó que algunas Instituciones Educativas y Puestos de Salud, no contaban con el servicio de internet que debía proveerse como parte del periodo de Operación del proyecto, en atención a ello, a través del oficio n.° 1439-2023-CG/GRTA del 22 de noviembre de 2023, reiterado con el oficio n.° 1519-2023-CG/GRTA del 13 de diciembre de 2023, se solicitó al Titular de la Entidad, información relacionada a dicho aspecto, recibiendo respuesta mediante oficio n.° 039-2024-GRA/GOB.REG.TACNA del 8 de enero de 2024, precisando lo siguiente:

**Cuadro n.º 5**  
**Detalle de la información requerida y recabada respecto a la provisión del servicio de internet**

| Requerimiento efectuado con oficio n.º 1519-2023-CG/GRTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Información remitida por el Gobierno Regional de Tacna, con oficio n.º 039-2024-GRA/GOB.REG.TACNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"1. Informe que acciones adoptó a la fecha el Gobierno Regional de Tacna, respecto a la falta de energía eléctrica de la Institución Educativa Inicial N° 326 ubicada en la localidad de Alto Camilaca del distrito de Camilaca, provincia de Candarave, considerando que forma parte de las instituciones beneficiadas con el proyecto".</p>                                                                                                                               | <p>"1. Respecto a la falta de energía eléctrica en la institución Educativa N° 326 ubicada en la localidad de Alto Camilaca, indicó que la especialista de infraestructura informó a través del Informe n.º 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA que realizó trámites administrativos para conectividad eléctrica; no obstante, no precisó el estado del trámite o detalles adicionales".</p>                                                                                               |
| <p>"4. Se informe el listado de las instituciones educativas y/o establecimientos de salud de la región que no cuentan con servicio alguno de energía eléctrica, y que se encuentran en el listado de Instituciones Abonadas Obligatorias del Proyecto, el cual se adjunta al presente y que acciones se adoptaron frente a dicha situación. (...)".</p>                                                                                                                       | <p>"3. Respecto a la evaluación anual del periodo 2023 sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto, indicó que con Oficio n.º 5236-2023-D-DRET/GOB.REG.TACNA del 17 de noviembre de 2023 y con Oficio n.º 2685-2023-OA-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA del 29 de noviembre de 2023, los directores regionales de educación y salud remitieron el estado situacional del servicio de internet e intranet; no obstante, no se adjuntó los referidos documentos". (*)</p>                             |
| <p>"6. Finalmente, se ha tomado conocimiento que, durante el periodo 2023 hubo un lapso de tiempo de aproximadamente seis (6) meses, en los cuales las instituciones abonadas obligatorias de la Región de Tacna, no contaron con el servicio de internet por falta de pago al contratista Orocom S.A.C, por lo que, se solicita se sirva informar cuales fueron las causas que originaron tal situación y que acciones se adoptaron al respecto, documente su respuesta".</p> | <p>"6. Respecto a la falta de pago del servicio durante el año 2023, reiteró lo indicado en el punto anterior, precisando que no se ha realizado ningún pago, considerando que se ha tomado conocimiento que algunas instituciones educativas y establecimientos de salud presentan fallas del servicio, por lo que emitió el Oficio n.º 038-2024-GRA/GOB.REG.TACNA a la Gerencia de Desarrollo Social para que realice la verificación in situ de la prestación del servicio correspondiente".</p> |

**Fuente:** Oficio n.º 1519-2023-CG/GRTA de 22 de noviembre de 2023, oficio n.º 039-2024-GRA/GOB.REG.TACNA de 8 de enero de 2024 y oficio n.º 2115-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA de 6 de diciembre de 2023.

**Elaboración:** Comisión de Control Concurrente.

Bajo los párrafos expuestos anteriormente, y la información detallada en el cuadro anterior, se advierte que, el desconocimiento de los funcionarios sobre los compromisos asumidos en el Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA suscrito entre la Entidad y PRONATEL, no ha permitido se identifiquen oportunamente las deficiencias que vienen limitando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto de "Instalación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", de tal modo que permita adoptar los correctivos necesarios, en favor de los beneficiarios de dicho Proyecto.

Asimismo, la Entidad no ha actualizado la designación del coordinador responsable de la ejecución del convenio.

### b) Criterio

La situación expuesta no ha considerado la siguiente normativa:

#### **Ordenanza Regional n.º 028-2013-CR/GOB.REG.TACNA del 15 de diciembre de 2013, Declaran de interés y necesidad regional impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en la Región Tacna**

**"Artículo Primero.** - DECLÁRASE DE INTERÉS Y NECESIDAD REGIONAL IMPULSAR EL DESARROLLO, UTILIZACIÓN Y MASIFICACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN LA REGIÓN TACNA, con la finalidad de promover el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, en el marco del Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú.

(...)

**Artículo Tercero.** - DISPONER que el Ejecutivo Regional del Gobierno Regional de Tacna promueva los convenios que sean necesarios con el Gobierno Central a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, con la finalidad de formular y ejecutar el Proyecto de Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del País - Región Tacna.

(...)"

**Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Ley n.º 29904 de 24 de abril de 2015.**

**"Artículo 1. Objeto de la Ley**

*El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizaciones hacia una sociedad de la información y el conocimiento".*

**"Artículo 2. Promoción de la Banda Ancha**

*El Estado promueve la Banda Ancha y si aprovechamiento por parte de toda persona, como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión, opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente".*

**Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna, suscrito el 1 de octubre de 2015**

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

*El presente Convenio tiene como objeto el desarrollo de actividades conjuntas entre el FITEL y el GR-TACNA, a efectos de contribuir a la sostenibilidad del PROYECTO para garantizar su continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para el beneficio de la población de las localidades beneficiarias del PROYECTO.*

**Plan de Promoción de la Inversión Privada de Proyectos a desarrollarse en las Regiones Moquegua, Tacna, Puno y Junín, aprobado por Acuerdo CD Proinversión n.º 8-2-2017-CPC de 23 de junio de 2017.**

**"3.2. Objetivo de los Proyectos Regionales**

*Los proyectos (...) Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna (...), tienen por objetivo incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de dichas regiones, a través de la ampliación de redes de transporte de banda ancha para alcanzar a las capitales de distrito, así como implementar redes de acceso para beneficiar a 845 localidades rurales y de preferente interés social de dichas regiones".*

**c) Consecuencia**

La falta de conocimiento por parte de los funcionarios de la Entidad, respecto a los alcances y compromisos asumidos en el convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA, podría ocasionar que el "Proyecto de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", no sea sostenible en el tiempo, además de poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos previstos en desmedro de las instituciones educativas y puestos de salud beneficiarias del proyecto, al no contar con la provisión del servicio de internet.

**2. EL CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, NO ESTABLECE CONDICIONES QUE GARANTICEN LA VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN, PONIENDO EN RIESGO EL ADECUADO CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS.**

**a) Condición**

Las Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, contenidas en el Anexo n.º 8-B del Texto Único de Bases de la Licitación Pública General del Proceso de Promoción de la Inversión Privada para la Ejecución de los Proyectos: *“Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”*, estableció en el numeral 3.1. que:

*“El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los CONTRATANTES de los servicios”.*

Mientras que, en el numeral 3.3 se establece: *“Los formatos referenciales para contratar el acceso a internet e intranet, están respectivamente en el Apéndice 5-A y 5-B del presente Anexo. Los formatos definitivos a utilizar durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberán ser aprobados previamente por el FITEL, antes de iniciar el PERÍODO DE OPERACIÓN. La propuesta de los formatos deberá ser presentada por el CONTRATADO antes del término de los diez (10) meses contados desde la FECHA DE CIERRE”.*

Entendiéndose como **Contratado**, a la persona jurídica con quien PRONATEL suscribe el Contrato de Financiamiento y se encargará de ejecutar el proyecto adjudicado; mientras que, **Contratante**, es la Institución Abonada Obligatoria y las personas adicionales que suscriban con el Contratado un contrato para la prestación de acceso a internet o acceso a intranet, de acuerdo a lo dispuesto en las definiciones del numeral 1.3 del Texto Único de Bases.

En tal sentido, habiendo iniciado el 22 de julio de 2022 el período de operación del Proyecto, en el marco del numeral 5.2.2 de la Cláusula Quinta del Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA de 1 de octubre de 2015, que dispone como parte de los compromisos asumidos por la Entidad a: *“Financiar el costo de los servicios que brinde el operador en las entidades públicas bajo su jurisdicción, las mismas que deben encontrarse ubicadas en las localidades beneficiarias del PROYECTO”*, el Gobernador Regional de Tacna, suscribió el **“Contrato de Servicio de Acceso a Internet para Instituciones Abonadas Obligatorias”**, con la empresa Orocom SAC. el 12 de mayo de 2023, cuya vigencia se encuentra prevista hasta el 31 de diciembre de 2023, el mismo que podría ser renovado de forma automática por el plazo de un año.

Al respecto, de la revisión al contenido del “Contrato de servicio de acceso a internet para instituciones abonadas obligatorias”, se verificó que establece los alcances del servicio de internet en las Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud beneficiarias del Proyecto, que se encuentran bajo el ámbito de la Entidad, estableciendo en la Cláusula Sexta: Retribución, lo siguiente:

*“(…)*  
**6.2 EL ABONADO pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información transmitida y recibida, considerando la velocidad de transmisión contratada que se indica en el Anexo III, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato. La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL ABONADO puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I.**

(...).

6.3 El OPERADOR remitirá a EL ABONADO el recibo correspondiente por el importe mensual del SERVICIO que a la FECHA DE CIERRE DEL CICLO DE FACTURACIÓN le corresponda pagar. El recibo por el importe mensual del SERVICIO deberá ser entregado a EL ABONADO como mínimo tres (3) días calendario antes de la FECHA DE VENCIMIENTO DEL RECIBO, en este caso, la carga de la prueba sobre la recepción por parte de EL ABONADO corresponderá a EL OPERADOR

(...)

Los pagos deberán realizarse dentro del plazo de vencimiento señalado en el recibo. No obstante, lo anterior, EL ABONADO deberá cancelar el importe del recibo mensual dentro de los ocho (8) días calendario posteriores a la fecha de vencimiento del recibo, sin el cobro de cargos adicionales ni intereses por parte de EL OPERADOR. (...)

6.8 EL OPERADOR podrá efectuar la suspensión del SERVICIO por falta de pago luego de transcurrido el plazo establecido en el último párrafo del numeral 6.3 del presente Contrato, correspondiente al segundo CICLO DE FACTURACIÓN impago consecutivo o alterno<sup>2</sup>. (Énfasis agregado)

Sin embargo, se identificó deficiencias en el referido contrato, las mismas que se detallan a continuación:

- El contrato no establece los términos de conformidad de la prestación, esto es el responsable o los responsables de verificar el cumplimiento de la prestación del servicio de internet y obligaciones del Operador, y de otorgar la conformidad de la prestación, así como el plazo para su emisión de manera previa a la cancelación por cada Ciclo de facturación.
- El contrato no precisa las penalidades en las cuales podría incurrir el Operador por retraso o incumplimiento en la prestación del servicio, en los puntos de acceso ubicados en las localidades beneficiarias del Proyecto.

La falta de estas condiciones en el contrato de prestación del servicio, no permite evaluar la correcta prestación del servicio de internet y el cumplimiento de las obligaciones del Operador, así como los tipos de penalidades en caso de incumplimiento del servicio de parte del Contratista, lo cual no aseguraría una óptima prestación del servicio en el marco del Proyecto de Instalación de Banda Ancha en la Región Tacna.

## b) Criterio

La situación expuesta no ha considerado la siguiente normativa:

**Texto Único Ordenado de las Bases de la Licitación Pública Especial “Proceso de Promoción de la Inversión privada para la Ejecución de los Proyectos: Instalación de Banda ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”, de diciembre 2017.**

“22.9 (...) Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el acceso a Intranet que proveerá EL CONTRATADO se regirán de manera supletoria por las normas regulatorias vigentes en el país, incluidas las normas de continuidad y calidad de los servicios, así como el régimen tributario aplicable a los contribuyentes de todo el

---

<sup>2</sup> Entiéndase por operador, a la empresa concesionaria de servicio de telecomunicaciones que ha suscrito el Contrato de Financiamiento del Proyecto con el FITEL, y al Abonado a la entidad de la Administración Pública que contrata con el Operador el servicio para los usuarios, en este caso el Gobierno Regional de Tacna, mientras que, el usuario es la institución abonada obligatoria a quien el operador debe instalar y proveer el servicio contratado.

*territorio nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o gobiernos locales del país (...)*”.

**Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018**

**CAPÍTULO IV  
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Artículo 161. Penalidades

*“161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.  
(...)”.*

**CAPÍTULO V  
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Artículo 168. Recepción y conformidad

*“168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. (...)”*

*168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias”.*

**c) Consecuencia**

Los hechos expuestos, ponen en riesgo la adecuada supervisión a las obligaciones contratadas, al no garantizar una verificación y/o evaluación a la correcta prestación del servicio de internet y condiciones pactadas, así como se limita a la entidad, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, al no considerarse en el contrato penalidades ante posibles incumplimientos.

**3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 430 VIRGEN DEL CARMEN Y N° 326 ALTO CAMILACA, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, NO CUENTAN CON SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, Y PODRÍA GENERAR EL PAGO DE SERVICIOS NO PRESTADOS**

**a) Condición**

Como resultado de las visitas de inspección efectuadas en el año 2023, como parte del Servicio de Control Concurrente que se realiza a PRONATEL respecto a la ejecución del Proyecto, se identificó que en la Institución Educativa n.º 326 Alto Camilaca, no se cuenta con la instalación y la provisión del servicio de energía eléctrica, aspecto que a la fecha viene limitando que la comunidad educativa se vea beneficiada con el servicio de internet, conforme se muestra a continuación:

**Cuadro n.º 6**  
**Deficiencias en servicio de internet en Instituciones Educativas de la Región**

| Nº | Institución Abonada Obligatoria | Distrito | Fecha de visita | Servicio de internet | Observaciones señaladas en el Acta de Visita de Inspección s/n del 13 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Institución Educativa N° 326    | Camilaca | 13/11/2023      | Sin servicio         | La directora refiere que, desde marzo 2022, la IEI no cuenta con energía eléctrica, por lo cual no ha podido utilizar los equipos del Proyecto de PRONATEL, ha realizado requerimientos de Instalación de Energía a la UGEL Candarave y a la Municipalidad de Camilaca, sin éxito a la fecha, por lo cual tiene guardados los equipos de PRONATEL y no han sido utilizados a la fecha. Asimismo, refiere que se encuentra encargada de la IEI desde marzo 2022 y no ha sido capacitada por PRONATEL a la fecha. |

**Elaborado por:** Comisión de Control

**Fuente:** Informe de hito de control n.º 28938-2023-CG/GRTA-SCC de 28 de noviembre de 2023 e Informe de hito de control n.º 1236-2024-CG/GRTA-SCC de 2 de febrero de 2024.

Situación que se evidencia en las imágenes siguientes:

**Imágenes n.ºs 2,3, 4 y 5**

**Falta de suministro eléctrico y equipos sin uso en la Institución Educativa N° 326 de Camilaca:**

**Imagen n.º 2**  
**Carencia de suministro eléctrico**



**Imagen n.º 3**  
**Vista interna del gabinete de pared con equipos de red instalados en la IEI**



**Imagen n.º 4**  
**Los equipos del proyecto se encuentran guardados en sus cajas**



**Imagen n.º 5**  
**Instalación de los puntos de red del proyecto**



**Elaborado por:** Comisión de Control.

**Fuente:** Informe de hito de control n.º 28938-2023-CG/GRTA-SCC de 28 de noviembre de 2023 e Informe de hito de control n.º 1236-2024-CG/GRTA-SCC de 02 de febrero de 2024.

En relación a ello, mediante el oficio n.º 1066-2023-D.UGEL-C/DRET/GOB.REG.TACNA<sup>3</sup> del 9 de noviembre de 2023, que contiene el informe n.º 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA de la Especialista en Infraestructura de la UGEL Candarave, se informa sobre el estado situacional del servicio de acceso a internet e intranet de las instituciones educativas beneficiarias del Proyecto en la provincia de Candarave, dando cuenta que en la Institución Educativa n.º 326 de la localidad de Alto Camilaca, no tienen energía eléctrica, situación que también ocurre en la Institución Educativa n.º 430 Virgen del Carmen de la localidad de Nueva Camilaca.

Bajo los párrafos expuestos, se advierte que la Entidad no advirtió oportunamente, que, en las referidas instituciones educativas de la región, no se contaba con las condiciones necesarias para el funcionamiento del servicio de internet en los equipos pertenecientes al Proyecto en beneficio de la comunidad educativa, si se tiene en cuenta que el período de Operación del proyecto inició el 22 de julio de 2022.

Por otro lado, resulta pertinente mencionar que en el marco del numeral 5.2.2 de la Cláusula Quinta del Contrato, que dispone como parte de los compromisos de la Entidad a: *“Financiar el costo de los servicios que brinde el operador en las entidades públicas bajo su jurisdicción, las mismas que deben encontrarse ubicadas en las localidades beneficiarias del PROYECTO”*, en tal sentido, dicha entidad es quien asume el pago de la provisión del servicio de internet, por parte del contratista OROCOM S.A.C.; por lo que, el desconocimiento de dicha situación, podría conllevar al pago de prestaciones no realizadas, teniendo en cuenta que las referidas instituciones educativas durante el año 2022 y 2023 no contaban con suministro de energía eléctrica.

## b) Criterio

La situación antes mencionada no se condice con la normativa siguiente:

<sup>3</sup> Documento incluido en el oficio n.º 2115-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA obtenido producto del Acta de Entrevista de 19 de enero de 2024 y Acta de entrega de información de 19 de enero de 2024 recabada en el Gobierno Regional de Tacna.

**Ley n.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre de 2002**

*CAPITULO II FUNCIONES ESPECIFICAS*

*Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.*

*a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.*

*b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional. (...)*

**Ordenanza Regional n.º 028-2013-CR/GOB.REG.TACNA del 15 de diciembre de 2013, Declaran de interés y necesidad regional impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en la Región Tacna**

*“Artículo Primero. - DECLÁRASE DE INTERÉS Y NECESIDAD REGIONAL IMPULSAR EL DESARROLLO, UTILIZACIÓN Y MASIFICACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN LA REGIÓN TACNA, con la finalidad de promover el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, en el marco del Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú.*

*(...)*

*Artículo Tercero. - DISPONER que el Ejecutivo Regional del Gobierno Regional de Tacna promueva los convenios que sean necesarios con el Gobierno Central a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, con la finalidad de formular y ejecutar el Proyecto de Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del País - Región Tacna.*

*(...)”*

**Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Ley n.º 29904 de 24 de abril de 2015.**

*“Artículo 1. Objeto de la Ley*

*El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento”.*

*“Artículo 2. Promoción de la Banda Ancha*

*El Estado promueve la Banda Ancha y si aprovechamiento por parte de toda persona, como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión, opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente”.*

**Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna suscrito el 1 de octubre de 2015**

**CLAUSULA CUARTA: OBJETO**

*El presente Convenio tiene como objeto el desarrollo de actividades conjuntas entre el FITEL y el GR-TACNA, a efectos de contribuir a la sostenibilidad del PROYECTO para garantizar su continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para el beneficio de la población de las localidades beneficiarias del PROYECTO.*

**CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES**

**“5.2 EL GR-TACNA se compromete a lo siguiente:**

*(...)*

**5.2.5 Realizar una evaluación anual de los beneficios obtenidos por el PROYECTO** a través del levantamiento de indicadores establecidos por el FITEL, información que servirá de insumo para la evaluación ex post del PROYECTO.

*(...).”*

**Plan de Promoción de la Inversión Privada de Proyectos a desarrollarse en las Regiones Moquegua, Tacna, Puno y Junín, aprobado por Acuerdo CD Proinversión n.º 8-2-2017-CPC de 23 de junio de 2017.**

**“3.2. Objetivo de los Proyectos Regionales**

*Los proyectos (...) Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna (...), tienen por objetivo incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de dichas regiones, a través de la ampliación de redes de transporte de banda ancha para alcanzar a las capitales de distrito, así como implementar redes de acceso para beneficiar a 845 localidades rurales y de preferente interés social de dichas regiones”.*

**c) Consecuencia**

La situación expuesta, viene afectando el cumplimiento de los objetivos del proyecto, al no permitir la reducción de brechas en el acceso a los servicios de internet, en las Instituciones Educativas n.º 430 Virgen del Carmen y n.º 326 Alto Camilaca, toda vez, que no cuentan con el suministro eléctrico desde el año 2022, sumado a ello, podría generar el pago de servicios no prestados de manera efectiva.

**III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la “Provisión del servicio de internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna” en el Gobierno Regional de Tacna, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

**IV. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la “Provisión del servicio de internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna”, se ha advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de la Entidad, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio a la “Provisión del servicio de internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna” en Gobierno Regional de Tacna, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el logro de los objetivos del mismo.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio.

Tacna, 26 de marzo de 2024

---

**Fernando Eduardo Cohaila Villagra**  
Integrante  
Comisión de Control

---

**Eyleen Scarleth Arias Hinojosa**  
Gerente Regional de Control I (e)  
Gerencia Regional de Control de  
Tacna

**APÉNDICE n.º 1****DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

- DESCONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, EN EL CONVENIO SUSCRITO CON PRONATEL SOBRE EL “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA”, PONE EN RIESGO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN DESMESTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD BENEFICIARIAS.**

| <b>Nº</b> | <b>Documento</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Convenio n.º 025-2015/GOB.REG.TACNA del 1 de octubre de 2015                                                                                                                                                                                     |
| 2         | Contrato de Financiamiento Licitación Pública Especial Proceso de Promoción de la inversión privada para la Ejecución de Proyectos: “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna – Mayo 2018 |
| 3         | Oficio n.º 039-2024-GRA/GOB.REG.TACNA del 8 de enero de 2024                                                                                                                                                                                     |
| 4         | Acta de Entrevista s/n del 19 de enero de 2024, al Gerente General Regional Sr. Jaime Carpio Camacho.                                                                                                                                            |
| 5         | Acta de Entrevista s/n del 19 de enero de 2024, al Gerente de Desarrollo e Inclusión Social Sr. Julio Aguilar Vilca.                                                                                                                             |

- EL CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, NO ESTABLECE CONDICIONES QUE GARANTICEN LA VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN, PONE EN RIESGO EL ADECUADO CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS.**

| <b>Nº</b> | <b>Documento</b>                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Contrato de servicio de acceso a internet para Instituciones Abonadas Obligatorias suscrito el 12 de mayo de 2023 |

- INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 430 VIRGEN DEL CARMEN Y N° 326 ALTO CAMILACA, BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, NO CUENTAN CON SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, Y PODRÍA GENERAR EL PAGO DE SERVICIOS NO PRESTADOS.**

| <b>Nº</b> | <b>Documento</b>                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Informe de hito de control n.º 28938-2023-CG/GRTA-SCC de 28 de noviembre de 2023 e Informe de hito de control n.º 1236-2024-CG/GRTA-SCC de 2 de febrero de 2024. |
| 2         | Oficio n.º 1066-2023-D.UGEL-C/DRET/GOB.REG.TACNA del 9 de noviembre de 2023                                                                                      |



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"




### CONVENIO N° 025-2015/GOB.REG.TACNA

#### CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte, el **FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES**, con RUC N° 20514935590, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203 Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Secretario Técnico (e), Ing. Luis Andrés Montes Bazalar, identificado con DNI N° 10476312, designado por Resolución Ministerial N° 551-2015-MTC/01.03, a quien en adelante se le denominará "FITEL"; y de la otra parte, el **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**, con RUC N° 20519752515, con domicilio legal en la Av. Gregorio Albarracín N° 526, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, debidamente representado por su Gobernador Regional, Dr. Omar Gustavo Jiménez Flores, identificado con DNI N° 00972941, a quien en adelante se le denominará "GR-TACNA", en los términos y condiciones establecidas en las siguientes cláusulas:



#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES



1.- La Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tiene como propósito impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de la infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento.

2.- A través de la mencionada Ley, se declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integra a todas las capitales de provincia del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia; facultándose al FITEL a elaborar y financiar proyectos de despliegue de redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital, denominadas Redes Regionales. Los gobiernos regionales podrán participar en el financiamiento de estos proyectos, cuando las localidades beneficiarias formen parte de sus respectivas jurisdicciones.

1.3.- El FITEL ha formulado el Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", (en adelante el PROYECTO), con Código SNIP 2267168 que permitirá incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos y centros poblados de Tacna, para ello se tiene previsto la ampliación de redes de transporte de banda ancha con alcance a nivel de capitales de distrito, e implementación de una red de acceso inalámbrica hacia las localidades rurales. El PROYECTO será



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



adjudicado a una empresa (en adelante el ADJUDICATARIO), a través del proceso de promoción de la inversión privada que lleve a cabo PROINVERSIÓN.

- 1.4.- Mediante Acuerdo de Sesión N° 07-2014, de fecha 23 de julio de 2014, el Directorio del FITEL autorizó al Secretario Técnico del FITEL, a suscribir el presente Convenio con el GR-TACNA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 2.1 Constitución Política del Perú.
- 2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 2.3 Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
- 2.4 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- 2.5 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 2.6 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 2.7 Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, la calidad de persona jurídica de derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones.
- 2.8 Decreto Supremo N° 010-2007-MTC, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28900.
- 2.9 Decreto Supremo N° 036-2008-MTC, que aprobó el Reglamento de Administración y Funciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

Las normas legales antes referidas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias.

#### CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES

- 3.1.- El FITEL es un fondo destinado a la provisión del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de preferente interés social, entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos.

El FITEL es un fondo intangible que cuenta con personería jurídica de derecho público y se encuentra adscrito al Sector Transportes y Comunicaciones, cuyos objetivos y funciones se encuentran definidas en la Ley N° 28900, el Reglamento de la Ley N° 28900 y el Reglamento de Administración y Funciones del FITEL.

El FITEL cuenta con una Secretaría Técnica adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones y es administrado por un Directorio presidido por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones e integrado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



Para cumplir sus objetivos, el FIDEL financia programas y proyectos que involucren la provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de preferente interés social, así como la infraestructura de telecomunicaciones y estudios relativos a éstos para garantizar el acceso a tales servicios.

3.2.- El GR-TACNA es un Órgano de Gobierno con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.

Tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes; de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Se rige por lo dispuesto en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

#### CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

El presente Convenio tiene como objeto el desarrollo de actividades conjuntas entre el FIDEL y el GR-TACNA, a efectos de contribuir a la sostenibilidad del PROYECTO para garantizar su continuidad en el tiempo y su aprovechamiento para el beneficio de la población de las localidades beneficiarias del PROYECTO.

#### CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

- 5.1 El FIDEL se compromete a lo siguiente:
- 5.1.1 Llevar a cabo la implementación del PROYECTO en el marco del Contrato de Financiamiento que suscriba con el ADJUDICATARIO que sea seleccionado a través del concurso que convoque la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).
  - 5.1.2 Verificar el cumplimiento del Contrato de Financiamiento que suscriba con el ADJUDICATARIO, donde se precisarán los parámetros del servicio que brindará el ADJUDICATARIO.
  - 5.1.3 Verificar que el GR-TACNA cumpla con la entrega del pago de los servicios que brinde el operador por la operación del PROYECTO.
  - 5.1.4 Elaborar un Plan de Trabajo con el detalle de los compromisos asumidos mediante el presente Convenio y presentarlo cuatro (04) meses después de la firma del Contrato de Financiamiento del PROYECTO, al operador que lo ejecutará.
  - 5.1.5 Otorgar a las instituciones del sector salud y educación que estén bajo la competencia del GR-TACNA, el equipamiento necesario (PC e Impresoras) para el cumplimiento de las funciones afines al objetivo del presente Convenio.



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



- 5.2 El GR-TACNA se compromete a lo siguiente:
- 5.2.1 Aceptar el equipamiento que le otorgue el FITEL, conforme a lo señalado en el numeral 5.1.5 del presente Convenio, y brindar el mantenimiento y futuras reposiciones de los mismos que resulten necesarias para su óptimo funcionamiento.
- 5.2.2 Financiar el costo de los servicios que brinde el operador en las entidades públicas bajo su jurisdicción, las mismas que deben encontrarse ubicadas en las localidades beneficiarias del PROYECTO.
- 5.2.3 Gestionar la elaboración de contenidos orientados a los sectores salud y educación beneficiarias del PROYECTO, que estén bajo la competencia del GR-TACNA.
- 5.2.4 Velar que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias que contempla el PROYECTO, se realicen haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el PROYECTO.
- 5.2.5 Realizar una evaluación anual de los beneficios obtenidos por el PROYECTO a través del levantamiento de indicadores establecidos por el FITEL, información que servirá de insumo para la evaluación ex post del PROYECTO.
- 5.2.6 Implementar proyectos complementarios de desarrollo social, gestión territorial y seguridad, soportados sobre la red de transporte terrestre de banda ancha implementada.
- 5.2.7 Participar en coordinación con el FITEL en la elaboración del Plan de Trabajo, el mismo que será aprobado por FITEL y será presentado al ADJUDICATARIO, cuatro (04) meses después de la suscripción del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

#### **CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO**

Cabe precisar que los compromisos asumidos por el GR-TACNA serán financiados por el mismo e iniciarán su ejecución una vez que el ADJUDICATARIO implemente la red de Banda Ancha implementada por el PROYECTO y brinde servicio.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA**

El presente Convenio rige desde su firma y su vigencia se extenderá durante la vigencia del Contrato de Financiamiento no reembolsable del PROYECTO que suscriban el ADJUDICATARIO y el FITEL.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES**

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, previo acuerdo de las partes, modificación que deberá estar previamente sustentada.





FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



### **CLÁUSULA NOVENA: RÉGIMEN LABORAL**

Las partes intervinientes acuerdan que el personal seleccionado para la ejecución del presente Convenio se relaciona con la parte que lo contrató. En ese sentido, cada una de las partes asumirá responsabilidad por este concepto y en ningún caso el GR-TACNA ni el FITEL serán considerados entre sus contratantes solidarios o sustitutos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN**

Conforme lo establece el artículo 77, numeral 77.3, de la Ley N° 27444; las partes suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus competencias. En consecuencia, el Convenio podrá declararse concluido previa notificación a la otra parte con una anticipación de cinco (05) días hábiles, contados desde el envío del documento de notificación de conclusión del convenio, luego de lo cual la libre separación surtirá sus efectos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONCLUSIÓN DEL CONVENIO**

El presente Convenio quedará concluido antes de su vencimiento en los siguientes casos:

- 11.1 A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, mediante carta notarial, donde se comunica la resolución del convenio. La resolución del convenio no liberará a las partes bajo ninguna circunstancia de los compromisos previamente asumidos durante la vigencia del mismo.
- 11.2 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por
- 11.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. Para lo cual deberá comunicarse dentro de los siete (07) días hábiles posteriores de ocurrido el hecho que imposibilita el cumplimiento del convenio.
- 11.4 Cuando el operador del servicio del PROYECTO comunica a FITEL la falta de pago de los servicios por parte del GR-TACNA incurriendo en incumplimiento de la obligación establecida en el numeral 5.1.3 de la Cláusula Quinta del presente Convenio.
- 11.5 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por las partes en el presente convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolverse automáticamente.
- 11.6 En el supuesto de que desaparezca el objeto por el cual fue suscrito el convenio.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En el caso que surgiera alguna controversia con motivo de la interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes la resolverán mediante el trato directo, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención.



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



De no lograr una solución, los puntos controvertidos se someterán a arbitraje de derecho, según lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: COORDINACIÓN**

Con la finalidad de mantener una adecuada coordinación, cada una de las partes acuerda designar un coordinador con capacidad para tomar decisiones operativas que resulten necesarias a fin de asegurar la ejecución del presente convenio. Los coordinadores designados pueden ser reemplazados conforme lo señale la parte correspondiente, para lo cual bastará la remisión de una comunicación por escrito a la otra parte.

Para efectos de la coordinación del presente convenio, las partes designan como coordinadores:

**Por el FITEL:**

Cargo : Jefe Responsable del Área de Supervisión de Proyectos  
Teléfono : 615-7800 anexo 2601  
Correo : mponce@mtc.gob.pe

**Por el GR-TACNA:**

Cargo : Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tacna  
Teléfono : 052 -583030 anexo 253  
Correo : kgarcia@regiontacna.gob.pe

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO**

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del convenio, producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios señalados en la parte introductoria se entenderá válidamente efectuada.

En señal de conformidad se suscribe el presente Convenio por triplicado a los (.D.I....) días del mes de (.octubre...) del 2015.



ING. LUIS ANDRÉS MONTES BAZALAR  
Secretario Técnico (e)  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DR. OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES  
Gobernador Regional  
Gobierno Regional de Tacna

000001

REPÚBLICA DEL PERÚ



FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES



AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

**CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL  
PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA  
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:**

**“Instalación de Banda Ancha para la Conectividad  
Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua”**

**“Instalación de Banda Ancha para la Conectividad  
Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”**

Mayo de 2018



**PROCOM**  
Biro Alberto Cossio Mesa  
Gerente General



**"INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y  
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA" E "INSTALACIÓN DE  
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL  
DE LA REGIÓN TACNA"**

Conste por el presente documento el Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna" (en adelante, el **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**) que celebran de una parte el **Fondo de Inversión en Telecomunicaciones** (en adelante el **FITEL**), con RUC N° 20514935590 y domicilio en Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y de departamento de Lima, representado por el señor **Jorge Edgar Mesia Rios**, identificado con D.N.I. N° 10064247, Secretario Técnico (e) del FITEL según Resolución Ministerial N° 006-2017-MTC/01.03, y de la otra, la empresa **OROCOM S.A.C.** (en adelante **EL CONTRATADO**), registrada en la ciudad de Lima, Perú, con R.U.C. N° 20603080590, con domicilio en Av. Manuel Olguin N° 375 – Int. 506, Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, representada por el señor **Jairo Alberto Cossio Mesa**, identificado con C.E. N° 000164804, quien obra según los poderes de fecha 02 de marzo de 2018, inscritos en la Partida Electrónica N° 14065551 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

El **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO** se celebra en los términos y condiciones que se especifican en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL**

- 1.1. El FITEL es un fondo destinado a la provisión de acceso universal, entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos, que tiene, dentro de sus objetivos, reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y en lugares considerados de preferente interés social.
- 1.2. Mediante la Ley N° 28900 se otorgó al FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público. El FITEL se encuentra adscrito al Sector Transportes y Comunicaciones. La mencionada norma fue reglamentada por el Decreto Supremo N° 010-2007-MTC.
- 1.3. Mediante Decreto Supremo N° 036-2008-MTC se aprobó el Reglamento de Administración y Funciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL.
- 1.4. Mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC publicado el 05 de agosto de 1998 (y sus normas modificatorias) se aprobaron los "Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú".
- 1.5. Mediante Decreto Supremo N° 049-2003-MTC publicado el 17 de agosto de 2003, se aprobaron los "Lineamientos de políticas para promover un mayor acceso a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social", cuyo objetivo es acelerar la incorporación, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las áreas rurales y de preferente interés social, a las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de

la Información y Comunicación, promoviendo su integración a la red pública de telecomunicaciones.

- 1.6. Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-MTC publicado el 16 de agosto de 2008, se aprobó el Marco Normativo General para la promoción del desarrollo de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de áreas rurales y lugares de preferente interés social.
- 1.7. Mediante Resolución Ministerial N° 224-2012-MTC/01 publicada el 12 de mayo de 2012, se aprobó el Plan Estratégico Institucional del Sector Transportes y Comunicaciones, en el cual se estableció como uno de los objetivos específicos "el promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras"; precisando como meta a lograr para el año 2016, que el Perú cuente con 100% de distritos atendidos con al menos un servicio de telecomunicaciones.
- 1.8. Mediante Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, se declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre a todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia.
- 1.9. Mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
- 1.10. Mediante Ley 30228, se modifica la Ley N° 29022 – Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones, denominándola como Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.
- 1.11. Con Oficio N° 247-2017-MTC/09 del 19 de abril de 2017, se encargó a PROINVERSIÓN la conducción de la LICITACIÓN para la selección del OPERADOR que tendrá a su cargo la implementación de los PROYECTOS "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".
- 1.12. Mediante Resoluciones del Consejo Directivo de OSIPTEL N°s 003-2015-CD/OSIPTEL y 004-2015-CD/OSIPTEL, publicadas con fecha 11 de enero de 2015, se establecieron las tarifas tope del servicio de transporte y acceso a Internet respectivamente, correspondientes a los proyectos regionales de la Red Dorsal de Fibra Óptica.
- 1.13. Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 5-1-2017-CPC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26.05.17, el Consejo Directivo acordó modificar la incorporación al proceso de promoción de la Inversión Privada de los proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Junín y Puno, en el extremo de incluir la instalación de las Redes de Transporte, conjuntamente con las Redes de Acceso de los referidos proyectos.

- 1.14. Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 5-2-2017-CPC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26.05.17, el Consejo Directivo acordó aprobar la incorporación al proceso de promoción de la inversión Privada de los proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Moquegua y Tacna.
- 1.15. Mediante Acuerdo CD PROINVERSIÓN N° 8-2-2017-CPC del 21.06.2017, el Consejo Directivo acordó:
- (i) Dejar sin efecto el Plan de Promoción de la Inversión Privada de la Redes de Acceso de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Junín y Puno.
  - (ii) Aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones de Junín, Puno, Moquegua y Tacna.
- 1.16. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 18-2017/DPP/TE.21 de fecha 14.09.17, el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN acordó aprobar las BASES de la Licitación Pública Especial del proceso de promoción de la inversión privada para la ejecución de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín", "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Puno", "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".
- 1.17. Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 60-2017DPP/TE.21 del 24 de noviembre de 2017, se aprobó la Versión Final del Contrato de Financiamiento de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín", "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Puno", "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".

## CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a Cláusula, Numeral, Literal, Apéndice y Anexo, deberá entenderse efectuada a las Cláusulas, Numerales, Literales, Apéndices y Anexos contenidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo indicación expresa en sentido distinto.

Para la aplicación del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y su adecuada interpretación, los términos en letras mayúsculas se entenderán según la definición que se precisa respecto de cada uno de ellos en el mismo, así como, en la relación de definiciones contempladas en el Numeral 1.3 de las BASES.

Los términos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico o al significado que le asignen las normas legales aplicables correspondientes o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. En el texto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera.

En el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se señala:

- 2.1. **ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE:** Es el documento elaborado por FITEL mediante el cual EL CONTRATADO transfiere al MTC la propiedad y dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE una vez suscrito el Contrato de Concesión entre el MTC y el concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE o cuando se produzca alguno de los supuestos establecidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Dicha acta será suscrita entre EL CONTRATADO y FITEL, quien la suscribirá en representación del MTC.
- 2.2. **ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO:** Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, con la suscripción de este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO. El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 del Anexo N° 8-B de las BASES y podrá ser modificada, siendo el FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo.
- 2.3. **ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE:** Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, mediante este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS correspondientes al total de la RED DE TRANSPORTE. El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 del Anexo N° 8-A de las BASES y podrá ser modificada, siendo el FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo.
- 2.4. **ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO:** Es el documento con carácter de declaración jurada que indica y acredita el cumplimiento de la instalación y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos por la RED DE ACCESO. Esta acta se encuentra conformada por los modelos contenidos en los Apéndices N° 2-A, N° 2-B y N° 2-C, así como el Apéndice N° 3 del Anexo N° 8-B de las BASES, los cuales podrán ser modificados, siendo el FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo. Dicha acta es suscrita por EL CONTRATADO, además de las personas señaladas en los referidos apéndices.
- 2.5. **AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO:** Es la incorporación de nuevas LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o capitales de distritos, en el ámbito de influencia del PROYECTO, lo cual implicará un subsidio adicional de hasta el 20% del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de la red que corresponda, previa evaluación y aprobación del FITEL. Dicha ampliación podrá ser solicitada por el FITEL dentro de la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE.



2.6. **BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE:** Son todos los bienes muebles e inmuebles que integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Estos bienes serán de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien suscribirá dicha acta en representación del MTC.

2.7. **CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:** Es el procedimiento por el cual las PARTES acuerdan la conclusión de sus derechos y obligaciones contractuales. Este procedimiento se iniciará dentro de los primeros quince (15) DÍAS del último semestre del PERIODO DE OPERACIÓN; en tal sentido, se entenderá como una etapa dentro de dicho periodo.

2.8. **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:** Es la relación jurídica patrimonial que celebran el FITEL y EL CONTRATADO, cuyo objeto es regular:

- a) La instalación de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
- b) La operación y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, brindando el acceso a Internet e intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;
- c) La ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES;
- d) El cumplimiento de la Oferta Técnica del CONTRATADO;
- e) El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO;
- f) El desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO por el FITEL.

2.9. **DÍAS:** Se deberá entender a los días hábiles, es decir los días que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima (incluyendo los días no laborables para la administración pública). También se entienden como feriados los feriados regionales establecidos por la autoridad competente de la Región Moquegua y de la Región Tacna.

2.10. **DÍAS CALENDARIO:** Son todos los días (días hábiles, no hábiles y feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

2.11. **EL CONTRATADO:** Es la persona jurídica domiciliada en el Perú, constituida por el ADJUDICATARIO, con quien el FITEL suscribe el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y quien se encargará de ejecutar el PROYECTO ADJUDICADO.

2.12. **ETAPA DE INSTALACIÓN:** Es el tiempo en el cual EL CONTRATADO despliega la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la RED DE ACCESO y RED DE TRANSPORTE cumpliendo las disposiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El plazo máximo para culminar esta etapa es el que señale la PROPUESTA TÉCNICA, siendo para la RED DE TRANSPORTE no mayor de quince (15) meses y para la RED DE ACCESO no mayor de quince (15) meses, ambos contados desde la FECHA DE CIERRE.

2.13. **FECHA DE CIERRE:** Es el día, lugar y hora en que se llevan a cabo los actos establecidos en el Numeral 11.3 de las BASES.



SECRETA  
FITEL



- 2.14. **FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.** Es el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE y del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que corresponde al PROYECTO ADJUDICADO, conforme a lo establecido en la PROPUESTA ECONÓMICA en concordancia con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Incluye todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por explotación comercial del servicio y el aporte al FITEL, así como el aporte por regulación al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan).
- 2.15. **FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO:** Es el valor no reembolsable registrado en la PROPUESTA ECONÓMICA, expresado en DÓLARES AMERICANOS y que el FITEL deberá entregar a EL CONTRATADO como parte de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesario para que EL CONTRATADO adquiera, instale, opere y mantenga la RED DE ACCESO y ejecute la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, brindando así todos los servicios comprometidos en la PROPUESTA TÉCNICA en concordancia con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por explotación comercial del servicio y el aporte al FITEL, así como el aporte por regulación al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan).
- 2.16. **FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE.** Es el valor no reembolsable registrado en la PROPUESTA ECONÓMICA, expresado en DÓLARES AMERICANOS y que el FITEL deberá entregar a EL CONTRATADO como parte de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesario para que EL CONTRATADO adquiera e instale la RED DE TRANSPORTE en concordancia con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por explotación comercial del servicio y el aporte al FITEL, así como el aporte por regulación al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan).
- 2.17. **GARANTÍA DE ADELANTO.** Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión ni división y de realización automática a favor del FITEL, que EL CONTRATADO debe entregar en la oportunidad que señale el FITEL, para garantizar el correcto uso del adelanto al que se refiere el Numeral 11.6.1 de las BASES, que se realizará a favor de EL CONTRATADO

en caso este así lo haya solicitado en el Formulario N° 1 del Anexo N° 5 de las BASES. Deberá ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las BASES.

- 2.18. **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:** Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión ni división y de realización automática a favor del FITEL que EL CONTRATADO debe entregar en la FECHA DE CIERRE para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Deberá ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las BASES.
- 2.19. **GARANTIA POR SANEAMIENTO DE PREDIOS:** Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática a favor de FITEL, que deberá presentar el CONTRATADO en caso de no lograr la inscripción de la totalidad de los títulos de propiedad ante la SUNARP, exigidos para los predios que forman parte de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y cumpla con los requisitos establecidos en el Apéndice N° 5 del Anexo N° 8-A de las BASES.
- 2.20. **INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:** Es la institución pública señalada en el Anexo N° 8-B de las BASES, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario, de acuerdo a las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y proveer los servicios del PROYECTO ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 2.21. **LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES:** Es el conjunto de disposiciones legales que afectan directa o indirectamente el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Incluyen la Constitución Política del Perú, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, así como cualquier otra que conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú, resulte aplicable, las que serán de observancia obligatoria para la presente LICITACIÓN. Asimismo, incluyen cualquier modificación que las referidas normas o disposiciones pudieran tener, así como las normas que se indican en el Numeral 1.4 de las BASES, incluyendo sus normas modificatorias, sustitutorias y cualquier otra que conforme al ordenamiento jurídico del Perú resulte aplicable.
- 2.22. **LOCALIDADES BENEFICIARIAS:** Son las localidades donde EL CONTRATADO, de acuerdo a los términos establecidos en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberá instalar, operar y mantener los servicios ofrecidos en el PROYECTO ADJUDICADO. Estas localidades se incluyen en el listado contenido en el Anexo N° 1 del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las localidades adicionales ofertadas por EL CONTRATADO, adquieren el carácter de LOCALIDADES BENEFICIARIAS desde el momento de la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 2.23. **MTC:** Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- 2.24. **PARTE:** Es según sea el caso el FITEL o EL CONTRATADO.
- 2.25. **PARTES:** Son de manera conjunta el FITEL y EL CONTRATADO.

- 2.26 **PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.** Es el periodo, cuya duración máxima es de diecisiete (17) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACIÓN y la ETAPA DE PRUEBA, así como las actividades de SUPERVISIÓN para dar conformidad a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.
- 2.27 **PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE.** Es el periodo, cuya duración máxima es de diecisiete (17) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACIÓN y la ETAPA DE PRUEBA, así como las actividades de SUPERVISIÓN para dar conformidad a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE TRANSPORTE; culminando con la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE.
- 2.28 **PERIODO DE OPERACIÓN:** Es el tiempo de duración de ciento veinte (120) meses contados a partir del día siguiente de la culminación del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. En el cual EL CONTRATADO operará y mantendrá la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la prestación de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En dicho tiempo se brindarán los servicios comercialmente.
- 2.29 **PERIODO PROVISIONAL:** Es el tiempo en que EL CONTRATADO operará y mantendrá, de ser el caso, la RED DE TRANSPORTE para el uso exclusivo del PROYECTO ADJUDICADO y para permitir la operación de la RED DE ACCESO. Tendrá una duración máxima de dieciocho (18) meses, que se inician a partir del día siguiente de la culminación del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE y culmina con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

En caso que el PERIODO PROVISIONAL finalice en una fecha anterior a la del plazo máximo antes definido, el monto total del subsidio deberá ajustarse proporcionalmente al menor plazo, según el procedimiento descrito en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. No se reconocerá ni otorgará mayor subsidio en caso el PERIODO PROVISIONAL finalice en una fecha posterior a la del plazo máximo definido.

- 2.30 **PROINVERSIÓN:** Es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, organismo a que se refiere la Ley N° 28860 y la Resolución Ministerial N° 185-2017-EF/10 o normas que las sustituyan.

- 2.31 **PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES:** Documento elaborado por EL CONTRATADO que contiene los procedimientos a ejecutar para verificar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS: servidores, aplicaciones, centros de mantenimiento, centros de atención al usuario, centro de gestión de red, data center, nodos, entre otros, que forman parte de la RED DE ACCESO. Este documento deberá contar con la aprobación del FITEL antes de su aplicación.

- 2.32. **PROYECTO ADJUDICADO:** Es la PROPUESTA del POSTOR APTO declarado ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO por el DIRECTOR EJECUTIVO DE PROINVERSIÓN.
- 2.33. **RED DE ACCESO:** Es la red de telecomunicaciones implementada de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS correspondientes, que permite al usuario final acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones y acceso a intranet del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 7.40 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 2.34. **RED DE TRANSPORTE:** Es la red de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, diseñada sobre la base del tendido de fibra óptica con esquema de redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, según lo previsto en el Numeral 7.4 del Artículo 7° de la Ley N° 29904.
- 2.35. **UIT:** Es la Unidad Impositiva Tributaria.

### CLÁUSULA TERCERA. DECLARACIONES DE EL CONTRATADO

- 3.1. EL CONTRATADO declara que es una persona jurídica constituida bajo las normas de la República del Perú, habiendo acreditado su existencia y su representación conforme a Ley y que está debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones emanadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO para el ejercicio de sus actividades económicas, técnicas, financieras y comerciales en la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO.
- 3.2. EL CONTRATADO declara conocer y acepta que es razón determinante del FITEL para la celebración del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que, en los términos estipulados en el mismo, en su PROPUESTA TÉCNICA y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATADO debe efectuar el diseño, adquisición e instalación de las redes, equipos y preste acceso a Internet e Intranet, ejecute la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, y los mantenga en términos operativos, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes, de modo que el Estado Peruano cuente con la fibra óptica desplegada, para el caso de la RED DE TRANSPORTE, y que las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS dispongan de la infraestructura y el equipamiento debidamente instalado y totalmente operativo para el caso de la RED DE ACCESO.
- 3.3. EL CONTRATADO cuenta con los títulos habilitantes que le permiten prestar los servicios a los que se encuentra obligado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- 3.4. EL CONTRATADO se compromete a instalar las redes del PROYECTO ADJUDICADO y brindar los servicios en las condiciones de calidad, establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- 3.5. EL CONTRATADO declara que su representante, quien suscribe el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se encuentra debidamente autorizado, que su suscripción cuenta con la autorización de su Directorio (o la más alta autoridad de la empresa) y que, con su firma, no requiere ninguna otra acción o autorización para asegurar su validez y para cumplir con las obligaciones contempladas en el mismo.



3.6. EL CONTRATADO declara que para la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no requiere autorización legal o reglamentaria de la autoridad de cualquier país extranjero en el que alguno de sus accionistas esté constituido o tenga el domicilio principal de sus negocios y que no es contraria a disposición legal o reglamentaria alguna en dicho país.

3.7. EL CONTRATADO expresa que para el cumplimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no existen:

- Leyes, decretos, reglamentos, normas, dictámenes, sentencias, laudos arbitrales, resoluciones, sanciones administrativas o restricciones provenientes de cualquier autoridad, disposiciones en los estatutos o reglamento de EL CONTRATADO, convenios, contratos, acuerdos u otros actos o hechos de cualquier naturaleza que sean vinculantes para EL CONTRATADO o que afecten a sus filiales o subsidiarias o a sus bienes o que prohíban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten, menoscaben o, en cualquier forma, impidan la celebración y cumplimiento de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;
- Ni acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos pendientes o inminentes ante órganos jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad gubernamental, que prohíban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten, menoscaben o, en cualquier forma impidan la celebración y cumplimiento de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

3.8. EL CONTRATADO reconoce y acepta que la naturaleza y régimen del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO determina que, aunque durante su vigencia se produzcan cambios en las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, incluyendo cambios en la regulación del sector de telecomunicaciones y en el régimen tributario que afecten su actividad y/o sus resultados económicos, tales circunstancias no le otorgarán derecho de reclamación ni solicitudes de modificación al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO bajo los supuestos de desequilibrio económico-financiero, excesiva onerosidad de la prestación u otras figuras jurídicas de naturaleza similar, sea ante el FITEL, sus funcionarios u otra entidad del Estado.

EL CONTRATADO declara que asume todos los riesgos derivados de dichos cambios, incluidos cambios tecnológicos y, en consecuencia, no podrá presentar ante el FITEL o alguna otra autoridad administrativa, tribunal arbitral, u órgano jurisdiccional reclamo alguno porque ha sido claramente informado de esta posibilidad y la acepta.

3.9. EL CONTRATADO reconoce que directa o indirectamente dispone de la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y demás obligaciones previstas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como, aquellas obligaciones derivadas de la PROPUESTA en virtud de la cual fue declarado como ADJUDICATARIO de los Proyectos: "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".

- 3.10. EL CONTRATADO declara que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Decreto Legislativo N° 1224, su Reglamento, el Artículo 1366° del Código Civil peruano, ni por las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, y que no se encuentra sancionado administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.
- 3.11. En caso que, luego de la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se demuestre la falsedad en las declaraciones formuladas en los numerales precedentes, éste se resolverá de manera automática, de pleno derecho, aplicando las disposiciones contempladas en su Cláusula Décimo Novena, procediendo el FITEL a ejecutar las garantías que se otorguen en el marco del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 3.12. EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC, con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Dicha acta será suscrita entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien la suscribirá en representación del MTC.
- 3.13. EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO a favor del FITEL en los supuestos de resolución establecidos en la cláusula Décimo Novena del presente CONTRATO.
- 3.14. Los costos generados hasta la fecha en que se haga efectiva la transferencia señalada en los numerales 3.12 y 3.13 precedentes serán asumidos por EL CONTRATADO. Los costos incurridos a partir del día siguiente de haberse hecho efectiva la transferencia serán asumidos por el nuevo titular contratado a cargo de la operación de la RED DE ACCESO y por el operador seleccionado para la operación de la RED DE TRANSPORTE.
- 3.15. Los gastos administrativos necesarios para la transferencia, señalada en los numerales 3.12 y 3.13 precedentes, serán asumidos por EL CONTRATADO.
- 3.16. EL CONTRATADO declara que ha realizado sus propios estudios, investigaciones, proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 3.17. EL CONTRATADO declara conocer las zonas en las que instalará las redes, por lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamación o acción ante el FITEL u otra autoridad competente derivada de las inadecuadas condiciones del lugar o de cualquier otra circunstancia conexas al objeto del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 3.18. EL CONTRATADO admite que ha elaborado su plan de negocios tomando en cuenta los estudios y supuestos que consideró adecuados, sobre los cuales preparó su PROPUESTA TÉCNICA y su PROPUESTA ECONÓMICA y requirió el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. Declara igualmente que el plan de negocios no ha sido conocido por el FITEL o por PROINVERSIÓN, los que no tendrán responsabilidad alguna por cualquier diferencia entre el mismo y los resultados reales de la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO. En ese sentido, EL CONTRATADO declara que asume el riesgo derivado de las

diferencias entre su plan de negocios y los resultados reales de la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO.

- 3.19. EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que el total del monto del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, es suficiente para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y de aquellas derivadas de la PROPUESTA por la cual resultó ser ADJUDICATARIO de los Proyectos: "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".
- 3.20. EL CONTRATADO, mediante la presente declaración y sólo para el caso de la RED DE ACCESO, se obliga a continuar con la operación y mantenimiento del PROYECTO ADJUDICADO en todos los casos de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en los términos señalados en las Cláusulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO; constituyendo la presente declaración una promesa unilateral a que se refiere el Artículo 1956° del Código Civil Peruano.
- 3.21. EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que el FITEL ha tomado conocimiento de la declaración señalada en el numeral precedente y que la suscripción del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no sólo constituye asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 1956° y el Artículo 1957° del Código Civil peruano, respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha sido válidamente formulada y resulta plenamente exigible.
- 3.22. EL CONTRATADO declara que a la FECHA DE CIERRE, su capital social es el establecido en las BASES y que, a dicha fecha, ha suscrito íntegramente el total de acciones o participaciones que conforman su capital social, habiendo pagado al menos el 25% del valor nominal de las acciones o participaciones, según corresponda, de acuerdo al Artículo 52° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.
- 3.23. EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que la operación de la RED DE TRANSPORTE durante el PERIODO PROVISIONAL es temporal y provisional; quedando restringido de utilizar la RED DE TRANSPORTE para prestar servicio público de telecomunicaciones de valor añadido.

#### CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL FITEL

- 4.1. La suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las obligaciones y derechos del FITEL en el mismo, se ajustan a las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES y los reglamentos que regulan su funcionamiento y, en general, al ordenamiento legal del Perú.
- 4.2. El FITEL declara que a la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO cuenta con el conocimiento y las autorizaciones de sus órganos de gobierno y que su REPRESENTANTE LEGAL dispone de las competencias y poderes suficientes para celebrarlo, de manera que genere obligaciones y derechos válidos, vinculantes y exigibles para ambas partes.

- 4.3. El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO está debidamente autorizado y que cuenta con los recursos económicos suficientes para efectuar los desembolsos pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 4.4. El FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumentos legales y operativos para efectuar las supervisiones necesarias y que, en tanto y en cuanto EL CONTRATADO cumpla con sus obligaciones, autorizará y efectuará los desembolsos previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 4.5. La SUPERVISIÓN correspondiente al PERIODO DE OPERACIÓN de la RED DE ACCESO, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Séptima del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Vencido el plazo establecido en la citada cláusula, el régimen legal para la SUPERVISIÓN será el establecido en el Contrato de Concesión de EL CONTRATADO, de acuerdo a las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES.
- 4.6. El FITEL declara conocer y aceptar que ha tomado conocimiento de la declaración de EL CONTRATADO señalada en el Numeral 3.20 de la Cláusula Tercera precedente y que la suscripción del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no sólo constituye asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se refieren el segundo párrafo del Artículo 1956° y el Artículo 1957° del Código Civil peruano, respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha sido válidamente formulada y resulta plenamente exigible.

#### CLÁUSULA QUINTA: OBJETO

- 5.1. El objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es regular la asignación del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO para la ejecución de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", con la obligación de que EL CONTRATADO lo utilice por su cuenta y riesgo para:
- La instalación de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
  - La operación y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, brindando el acceso a Internet e Intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;
  - La ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES;
  - El cumplimiento de la Oferta Técnica del CONTRATADO; y,
  - El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO.
- 5.2. Asimismo, queda establecido que los bienes, derechos y elementos que componen la RED DE ACCESO son de propiedad, dominio y/o titularidad de EL CONTRATADO, sin perjuicio de las restricciones establecidas en la Cláusula Décimo Novena y en las demás disposiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

## CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

- 6.1. El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO tendrá una vigencia que comprende el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE y el PERIODO DE OPERACIÓN, hasta la realización del último desembolso; salvo que se resuelva con anterioridad atendiendo a los supuestos previstos en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 6.2. El PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y EL PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE serán como máximo de diecisiete (17) meses cada una, contados desde la FECHA DE CIERRE. Sin embargo, podrá ser prorrogado previa aprobación del FITEL y formalizado mediante adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 6.3. El tiempo de duración del PERIODO DE OPERACIÓN es de ciento veinte (120) meses contados a partir del día siguiente de la culminación del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.
- 6.4. El plazo de vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podrá ser ampliado siempre que se justifique debidamente y en aras del cumplimiento del objeto señalado en la cláusula quinta del presente contrato, mediante adenda suscrita por el FITEL y EL CONTRATADO. Para tal efecto, EL CONTRATADO podrá solicitar la ampliación de plazo antes de los quince (15) DÍAS previos al vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 6.5. LAS PARTES cumplirán con ejecutar el procedimiento correspondiente a la etapa de CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 6.6. Al término de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, por vencimiento del plazo señalado en los Numerales 6.2 y 6.3 de la presente Cláusula, EL CONTRATADO deberá continuar con las obligaciones de todo operador de telecomunicaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesión, que son suscritos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y/o de todo titular de un registro o autorización para la prestación de servicios de valor añadido.

## CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO asume las siguientes obligaciones.

- 7.1. Utilizar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para el diseño, la construcción e instalación de la RED DE TRANSPORTE; así como, para el diseño, adquisición de equipos, transporte, instalación puesta en servicio, operación y mantenimiento de la RED DE ACCESO que permitirá el acceso a Internet y el acceso a Intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, y para la ejecución de las actividades de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, cumpliendo las condiciones previstas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el contenido del PROYECTO ADJUDICADO, todos los compromisos asumidos por EL CONTRATADO en su PROPUESTA TÉCNICA consignada en el Anexo N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el contenido de su Oferta Técnica (número de LOCALIDADES BENEFICIARIAS Adicionales, número de LOCALIDADES



BENEFICIARIAS con acceso a Internet libre de pago en plaza principal e incremento de la velocidad mínima de descarga a ofrecer a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS)

- 7.2 Cumplir los plazos y las metas contempladas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO y en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo N° 3 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo los supuestos de prórrogas establecidas de conformidad con el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.3 Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y sus apéndices.
- 7.4 Cumplir con los compromisos asumidos en su PROPUESTA TÉCNICA, Anexo N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.5 La reparación de los daños sufridos por el material y/o los equipos que servirán para la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO, contenidos en la PROPUESTA TÉCNICA, así como su reposición, de ser el caso, será de responsabilidad de EL CONTRATADO sin requerir ningún desembolso adicional por parte del FITEL. Esta obligación se mantendrá durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y, de ser el caso, sus prórrogas.
- 7.6 Responsabilizarse por la reparación de los daños que puedan ocasionarse en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS derivados de las actividades directas de EL CONTRATADO y/o de terceros contratados por él para la ejecución del PROYECTO ADJUDICADO, sea que se afecten vías públicas, carreteras, caminos, puentes, locales públicos, privados y otros, que se produzcan con ocasión del transporte, instalación, operación y mantenimiento de la RED DE ACCESO y con la instalación de la RED DE TRANSPORTE. En ese sentido, EL CONTRATADO deberá mantener indemne al FITEL y al MTC, de corresponder; y deberá responder por todo acto u omisión, doloso, culposo o sin culpa, del personal que ocasione daños en esta última, incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus contratistas.
- 7.7 Dictar los cursos de capacitación en el Perú y en el país de fabricación de los principales equipos de transmisión e infraestructura (fibra óptica) a utilizar en la RED DE ACCESO y en la RED DE TRANSPORTE, respectivamente. Los cursos incluirán tópicos teóricos y prácticos.
- 7.8 Brindar todas las facilidades para que el FITEL, o quien éste designe, cumpla con sus funciones y obligaciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.
- 7.9 Proveer toda la información referida al PROYECTO ADJUDICADO, requerida por el FITEL, o por quien éste designe, para el cumplimiento de sus funciones, para lo cual otorgará un plazo para que EL CONTRATADO cumpla con ello.
- 7.10 Presentar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE en el plazo estipulado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para ambas redes.

- 7.11. Cada vez que EL CONTRATADO efectue actividades de promoción y publicidad del PROYECTO ADJUDICADO, deberá hacer mención al Estado Peruano representado por el FITEL y el MTC, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.12. Gestionar, obtener ante las autoridades administrativas, municipales o de otra índole y mantener vigentes las licencias, permisos, registros y demás autorizaciones que sean necesarias para el despliegue de la infraestructura y para la prestación del servicio de Internet y acceso a Intranet ofrecidos en el PROYECTO ADJUDICADO. En ese sentido, queda expresamente establecido que la cooperación a cargo del FITEL señalada en el Numeral 8.3 de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es sólo de medios y no de resultados, por lo que EL CONTRATADO no podrá alegar el resultado infructuoso de dicha cooperación como causa que lo exima del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.13. Cumplir con todas las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES para la ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Asimismo, con toda la normativa ambiental, social y cultural en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este contrato.
- 7.14. Cumplir con sus obligaciones pactadas en el marco de su contrato de concesión suscrito con el MTC.
- 7.15. Cumplir con los pagos de sus aportes al derecho especial al FITEL previsto en el Artículo 12° del T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el D.S. N° 013-93-TCC y sus modificatorias.
- 7.16. Para el caso de la RED DE ACCESO, EL CONTRATADO se obliga a atender la demanda (entendida como mayor número de conexiones y/o mayores velocidades de transmisión requeridas) de las localidades de la Región Moquegua y de la Región Tacna, en las cuales la cobertura de esta red permita la prestación de los servicios previstos en el PROYECTO ADJUDICADO. Dicha obligación se realizará bajo las mismas condiciones establecidas en el PROYECTO ADJUDICADO, sin que ello implique un financiamiento adicional, debiendo observarse lo dispuesto en la Cláusula 7.38.
- 7.17. Entregar a satisfacción del FITEL información desagregada de los costos de inversión de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE debidamente acreditados, conforme a lo señalado en el Anexo N° 10 del presente contrato, hasta antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO y ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE. Esta información no tendrá implicancia en el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.
- 7.18. Remitir a FITEL semestralmente el flujo de caja operativo del PROYECTO ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La entrega de esta información no altera el monto del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. Adicionalmente, el FITEL podrá solicitar la acreditación de dicho flujo de caja operativo.
- 7.19. Permitir al FITEL verificar el destino y uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

- 7.20. Mantener, a la FECHA DE CIERRE, suscrito íntegramente el total de acciones o participaciones que conforman su capital social y pagado en al menos el 25% del valor nominal de las acciones o participaciones, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.
- 7.21. Cumplir con la responsabilidad de contratar y mantener vigente las pólizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE, asumiendo los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que haya CONTRATADO en las pólizas de seguros adquiridas en el cumplimiento de esta obligación. La vigencia de las indicadas pólizas iniciará una vez finalizada la ETAPA DE INSTALACIÓN. La empresa de seguros que se contrate deberá encontrarse bajo la SUPERVISIÓN y regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- 7.22. No se eximirá de la obligación de cumplir con la instalación de redes alegando defectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- 7.23. Respetar el derecho de patente, de diseño y/o derechos de autor protegidos en el país de fabricación de los elementos de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE.
- 7.24. EL CONTRATADO asume la responsabilidad por los actos, deficiencias, omisiones o, en general, cualquier incumplimiento en que incurran los fabricantes, subcontratistas u otros contratados por éste que tengan participación en la ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.25. Suscribir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los modelos de contratos establecidos en los Apéndices N° 5-A y 5-B del Anexo N° 8-B de las BASES.
- 7.26. Asumir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso durante el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la responsabilidad frente al FITEL de mantener la operatividad y funcionalidad de todos los bienes y elementos que componen la RED DE ACCESO de modo tal que se garantice la calidad y condiciones establecidas en su PROPUESTA TÉCNICA y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y del acceso a Intranet.
- 7.27. Durante la vigencia de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso durante el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO está obligado a realizar actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes y elementos que componen la RED DE ACCESO. Esta obligación incluye la de efectuar los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones, realizadas a los bienes y elementos que componen las redes; sin que dicha obligación implique el derecho a exigir al FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.
- 7.28. Será responsable ante el FITEL, y los terceros, según corresponda, por la correcta administración y uso de los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO, así como el riesgo inherente a los mismos.

- 7.29. A partir de la FECHA DE CIERRE y hasta que se efectúe la transferencia a favor del FITEL de la RED DE ACCESO en el caso que se produzca la resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO prevista en la Cláusula Décimo Novena, EL CONTRATADO será el único responsable y obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan en relación a los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO, de conformidad con las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, considerando entre dichas disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique. En el caso de la RED DE TRANSPORTE, esta obligación a cargo de EL CONTRATADO se mantiene hasta su transferencia al MTC, de conformidad con lo establecido en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.30. Garantizar que los bienes, derechos y elementos de la RED DE ACCESO y los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE están afectos únicamente a la prestación de los servicios contemplados en el PROYECTO ADJUDICADO. En consecuencia, no podrán ser transferidos, o en general sometidos a carga o gravamen de algún tipo.
- 7.31. Transferir, en caso de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la propiedad y/o titularidad a favor del FITEL de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO de acuerdo a las condiciones establecidas en la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 7.32. Operar de manera temporal y provisional la RED DE TRANSPORTE durante el PERIODO PROVISIONAL hasta la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE bajo las condiciones establecidas en el presente contrato.
- 7.33. Transferir a favor del MTC la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.
- 7.34. Asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento físico legal dispuesto por las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN.
- 7.35. Mantener vigente la póliza de seguros de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE y para el caso de las pólizas correspondientes a la RED DE ACCESO hasta el CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumiendo los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que haya CONTRATADO en las pólizas de seguros adquiridas en el cumplimiento de esta obligación.
- 7.36. Negociar y suscribir acuerdos de uso compartido de infraestructura con las empresas concesionarias de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 8-A y Anexo 8-B de las BASES así como obtener los permisos, los derechos de vía, de paso y de uso, necesarios para instalar los postes y la infraestructura necesaria para el despliegue de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE; así también, establecer los acuerdos para el uso de ductos existentes e instalar

nuevos ductos donde lo considere necesario e informar al FITEL de los acuerdos suscritos con dichas empresas.

7.37. Sin perjuicio de lo señalado en las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, EL CONTRATADO brindará al MTC, al FITEL y al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE todas las facilidades que éstos requieran con el objetivo de facilitar la licitación y puesta en operación de la RED DE TRANSPORTE. Estas facilidades incluyen, entre otros mecanismos, la cesión de posición contractual de los acuerdos de uso compartido de infraestructura señalados en la Cláusula 7.36, de modo que a satisfacción del FITEL, se pueda facilitar la operación y mantenimiento de la RED DE TRANSPORTE.

7.38. Cumplir con los compromisos asumidos en su Oferta Técnica, así como los factores de competencia señalados en las BASES. Si el CONTRATADO ofertó velocidades mayores como factor de competencia, esta se circunscribe a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que se encuentran dentro del listado del Anexo N° 8-B de las BASES, localizadas en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS Adicionales en caso también lo haya ofertado como factor de competencia, excluyendo a las otras Instituciones de la Administración Pública de estas localidades que pudiesen solicitar el servicio de acceso a internet.

7.39. En caso se produzca la resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, prevista en la Cláusula Décimo Novena, asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento físico legal dispuesto por las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES de los bienes, derechos y elementos que componen la RED DE TRANSPORTE hasta la transferencia de los mismos al FITEL.

7.40. Cursar el tráfico de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS (indicadas en el Anexo N° 8-B de las BASES) así como de cualquier otra entidad de la administración pública que lo solicite, desde la RED DE ACCESO a través de su correspondiente red de transporte regional, hacia la RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA, de acuerdo a la normativa que emitirá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la REDNACE, conforme a lo dispuesto en los Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29904.

7.41. Cumplir con los pagos a contratistas y responsabilizarse por el cumplimiento de éstos frente a sus subcontratistas involucrados en la implementación del PROYECTO.

7.42. Para el caso de los predios y/o bienes inmuebles de la RED DE ACCESO, EL CONTRATADO se obliga a incorporar en sus contratos de arrendamiento, cesión en uso, usufructo, superficie, entre otros derechos de origen contractual sobre predios, cláusulas por las que, en caso de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cede su posición contractual a favor del FITEL o de la persona jurídica que FITEL precise. Asimismo, en caso de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO cederá a favor del FITEL o de la persona jurídica que FITEL precise los derechos de servidumbre que haya adquirido.

7.43. Adquirir, mediante compra venta la totalidad de terrenos destinados a la construcción de los Nodos de la RED DE TRANSPORTE. Excepcionalmente:



podrá adquirir mediante donación solo hasta el treinta por ciento (30%) de la totalidad de dichos terrenos.

- 7.44 Adquirir, mediante compra venta los terrenos destinados al NOC y a los CENTROS DE MANTENIMIENTO de la RED DE TRANSPORTE. Dichos terrenos no podrán ser adquiridos por EL CONTRATADO bajo modalidad distinta a la de compra venta.
- 7.45 Cumplir las demás obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos dentro de éstos las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en las CIRCULARES y en las BASES.

#### CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL FITEL

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL asume las siguientes obligaciones:

- 8.1. Desembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO haya cumplido con las obligaciones y disposiciones exigidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, previo informe favorable de supervisión del FITEL. Los desembolsos se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 8.2. Ejercer directamente o a través de una tercera persona natural o jurídica, privada o pública, las acciones de SUPERVISIÓN, monitoreo y control de las instalaciones y pruebas de la infraestructura, equipos y servicios previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 8.3. El FITEL cooperará con EL CONTRATADO para una adecuada ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Para dicho fin, el FITEL, donde se justifique, hará sus mejores esfuerzos coordinando con las autoridades pertinentes, la entrega de licencias, permisos y otros que gestione EL CONTRATADO y que sean requeridos para la ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 8.4. Velar por el buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y por el cumplimiento de los términos del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 8.5. Pronunciarse por escrito sobre las materias previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en los plazos establecidos en el mismo, así como sobre otras solicitudes que, al encontrarse dentro del ámbito de sus competencias, efectúe EL CONTRATADO por escrito.
- 8.6. Presupuestar y asumir los costos del mantenimiento de la RED DE TRANSPORTE de acuerdo a lo términos establecidos en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 8.7. Cooperar, cuando EL CONTRATADO lo solicite por escrito, en la negociación de acuerdos de uso compartido de infraestructura con concesionarios, u otras entidades públicas o privadas competentes, de otros sectores que correspondan (tales como energía, hidrocarburos, infraestructura vial, entre otros) necesarios para instalar los postes y la infraestructura de acuerdo al DISEÑO DE LA RED DE TRANSPORTE señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para dicho fin, el FITEL, donde se justifique,

hara sus mejores esfuerzos sin que la cooperación del FITEL sustituya la obligación de EL CONTRATADO de gestionar y suscribir dichos acuerdos conforme a lo dispuesto en el Numeral 7.36 de la Cláusula Séptima del presente contrato.

- 8.8. Las demás obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en las CIRCULARES y en las BASES.

#### CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL CONTRATADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO tendrá los siguientes derechos:

- 9.1. Recibir, utilizar y disponer el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de acuerdo con el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE y las condiciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 9.2. Proponer al FITEL el reemplazo de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS o nodos de la RED DE ACCESO, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 11 del presente contrato.
- 9.3. Podrá proveer, bajo su costo, cuenta y riesgo, y no implicará financiamiento adicional por parte del FITEL, otros servicios públicos de telecomunicaciones adicionales a los pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, siempre que no degraden la calidad y continuidad de los previstos en el PROYECTO ADJUDICADO, comunicando las condiciones de prestación de estos servicios adicionales. En un plazo no mayor de treinta (30) DÍAS contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud, el FITEL previa evaluación, de corresponder, emitirá la autorización a EL CONTRATADO para poder brindar dichos servicios.

Bajo este supuesto EL CONTRATADO tiene libertad para usar la infraestructura y los servicios instalados a fin de prestarlos en localidades distintas a las pactadas, siempre y cuando la instalación, operación y mantenimiento de los mismos corra por cuenta, costo y riesgo de EL CONTRATADO, y no implique financiamiento adicional por parte del FITEL, sin degradar la calidad y continuidad de los servicios previstos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, dichas localidades no se considerarán para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

- 9.4. Seleccionar libremente las tecnologías y arquitecturas de red más eficientes, siempre que cumpla con los requerimientos de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y que el conjunto se constituya en una red coherente para prestar el servicio de Internet y el acceso a intranet.

- 9.5. EL CONTRATADO, durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE y el PERIODO DE OPERACIÓN, dispone de libertad para realizar actualizaciones

de las tecnologías utilizadas; en caso de requerirse cambio de la PROPUESTA TÉCNICA y siempre que este cambio iguale o mejore las condiciones de calidad y continuidad establecidas originalmente, EL CONTRATADO deberá contar con la autorización del FITEL para efectuar dicho cambio, para lo cual deberá cumplir con los requerimientos y procedimientos establecidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En caso de que el FITEL acepte la propuesta de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo expresado en el párrafo precedente, EL CONTRATADO tiene que implementar las acciones necesarias para que las modificaciones de infraestructura, equipos y otros instrumentos, no degraden la prestación de los servicios previstos en la PROPUESTA TÉCNICA. Dichas acciones implican la elaboración de planes de contingencia en los cuales se especifiquen los compromisos de EL CONTRATADO sobre los periodos de afectación y recuperación del servicio y demás medidas que aseguren la continuidad y calidad de los servicios según lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Estas modificaciones no facultan a EL CONTRATADO a exigir al FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

- 9.6. Dentro de los diez (10) primeros meses del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, EL CONTRATADO podrá remitir al FITEL su propuesta de formatos finales de los modelos de contratos contenidos en los Apéndices N° 5-A y 5-B del Anexo N° 8-B de las BASES, de acuerdo a lo establecido del citado anexo.

Para tal efecto, su solicitud deberá estar sustentada y acreditada a satisfacción del FITEL, quien realizará la evaluación correspondiente.

- 9.7. Brindar a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de manera gratuita y sin sujetarse al régimen de penalidades establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los servicios de Internet y acceso a Intranet contemplados en el presente PROYECTO ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, siempre que no implique el otorgamiento de financiamiento adicional por parte de FITEL.

- 9.8. Solicitar la reducción de las garantías otorgadas, conforme a lo dispuesto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### CLÁUSULA DÉCIMA. DERECHOS DEL FITEL

En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL tiene los siguientes derechos:

- 10.1. Exigir cambio de equipos o modificaciones en el diseño cuando difieran de lo aprobado previamente
- 10.2. Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATADO en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
- 10.3. Requerir la restitución total o parcial del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO, según lo previsto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando EL CONTRATADO haga un uso de los desembolsos de manera distinta a lo señalado en el objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO



- 10.4. Ejecutar las garantías otorgadas a favor del FITEL, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 10.5. Imponer y hacer efectivas las penalidades que se deriven del incumplimiento, faltas o retrasos de los compromisos de EL CONTRATADO previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 10.6. Efectuar las visitas a los locales, instalaciones, infraestructura, entre otras, que considere necesarias para verificar la ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 10.7. Aplicar las cláusulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO considerando la naturaleza especial del mismo.
- 10.8. Resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando se presente alguna de las causales previstas para ello, de considerarlo pertinente.
- 10.9. Modificar, dentro de los diez (10) primeros meses del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, los modelos de contratos contenidos en los Apéndices N° 5-A y 5-B del Anexo N° 8-B de las BASES, siempre que dichas modificaciones no impliquen para EL CONTRATADO obligaciones adicionales a las establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos o las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- 10.10. Aprobar los formatos finales de los contratos indicados en el Numeral anterior, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 9.6 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. SUBCONTRATOS

- 11.1. EL PROYECTO ADJUDICADO podrá ser ejecutado a través de subcontratistas u otras formas de tercerización, a condición de que el FITEL sea informado de los nombres de las personas naturales y/o jurídicas que realicen los trabajos. Para tal efecto, EL CONTRATADO a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO deberá presentar una declaración jurada, conforme al Formulario N° 3 del Anexo N° 12 de las BASES, por la que asume la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales del subcontratista o de otras personas naturales o jurídicas con quienes suscriba contratos de tercerización. La mencionada declaración jurada debe ser presentada aun cuando EL CONTRATADO no realice subcontrataciones.
- 11.2. En cualquier caso, EL CONTRATADO continúa siendo responsable ante el FITEL por la eficiente y oportuna ejecución de dichas obligaciones y no podrá alegar el incumplimiento del subcontratista para excusar su propio incumplimiento.
- 11.3. EL CONTRATADO no podrá subcontratar, ni a personas naturales ni a personas jurídicas, para la ejecución de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se asigna a EL CONTRATADO, OROCOM S.A.C., a título de financiamiento no reembolsable, el monto de Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 54,445,840.12) financiados con recursos del FITEL. El FINANCIAMIENTO ADJUDICADO constituye un monto único por todo concepto, que, sin perjuicio de la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, será utilizado exclusivamente para los fines establecidos en el objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- i. La suma de Treinta y Seis Millones Quinientos Doce Mil Doscientos Ochenta y Cinco y 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 36,512,285.18), para la instalación y operación de la RED DE ACCESO.
- ii. La suma de Diecisiete Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro y 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 17,933,554.94), por la implementación de la RED DE TRANSPORTE.

## CLAUSULA DÉCIMO TERCERA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO PARA LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE

## 13.1. PARA LA RED DE ACCESO

13.1.1. El FITEL podrá solicitar la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, para la RED DE ACCESO, bajo las condiciones señaladas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.1.2. El PROYECTO ADJUDICADO podrá ser ampliado durante la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO; y dicha ampliación no podrá ser mayor al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO DE LA RED DE ACCESO.

13.1.3. Las nuevas LOCALIDADES BENEFICIARIAS que se seleccionarán deberán pertenecer al área de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, que serán incluidas como Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.1.4. Para que el FITEL suscriba la adenda de AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, el CONTRATADO deberá aceptar todas y cada una de las condiciones que el FITEL apruebe previamente. El FITEL se reserva el derecho de modificar las condiciones generales, técnicas y económicas del nuevo Financiamiento No Reembolsable.

## 13.2. PARA LA RED DE TRANSPORTE

13.2.1. El FITEL podrá solicitar la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, para la RED DE TRANSPORTE, bajo las condiciones señaladas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.2.2. El PROYECTO ADJUDICADO podrá ser ampliado durante la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE TRANSPORTE; y dicha ampliación no podrá ser mayor al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO DE LA RED DE TRANSPORTE.



13.2.3 Las nuevas capitales de distrito que se seleccionarán deberán pertenecer al área de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, que serán incluidas como Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.2.4 Para que el FITEL suscriba la adenda de AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO el CONTRATADO deberá aceptar todas y cada una de las condiciones que el FITEL apruebe previamente. El FITEL se reserva el derecho de modificar las condiciones generales, técnicas y económicas del nuevo Financiamiento No Reembolsable.

### 13.3. CONDICIONES DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO COMUNES A AMBAS REDES

13.3.1. La AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO será formalizada mediante la suscripción de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la cual regulará aquellas condiciones específicas que no estén establecidas en el presente contrato.

13.3.2. EL CONTRATADO, previo a la suscripción de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que apruebe la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, entregará un Cronograma de Actividades de Ampliación, el mismo que formará parte de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.3.3. El plazo máximo para culminar la instalación en nuevas LOCALIDADES BENEFICIARIAS será de seis (6) meses, siempre que no supere el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE, contados desde la suscripción de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.3.4. En caso el FITEL solicite la AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO, deberá adjuntar a su solicitud el valor de las inversiones (CAPEX) y el valor de la operación y mantenimiento (OPEX) correspondiente.

### CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

El FITEL desembolsará la totalidad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, mediante desembolsos que serán pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente Cláusula.

#### 14.1. RED DE ACCESO

14.1.1. El esquema de desembolsos del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO se describe en la siguiente tabla:

| Hito Funcional y Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje del monto de FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO | Oportunidad de solicitar el pago                                                                                                                       | Acreditación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Implementación de Nodos.</b><br><br>Obras civiles de los Nodos culminados incluye acabados, puertas, concertina, cámaras, sensores, racks, gabinetes, piso técnico, escaleras, SPAT, torre.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.5%                                                       | Al cumplimiento del 25% de los Nodos. Se precisa que no incluye la implementación de cámaras y sensores en estos Nodos.                                | - Diseño de la RED DE ACCESO indicando la cantidad de Nodos, topología y equipamiento previamente aprobado por el FITEL.<br>- Listado, enviado por el CONTRATADO, de los Nodos construidos, así como las características técnicas de las torres y shelters, en caso de los postes indicar las memorias descriptivas y los cálculos que permitan verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5%                                                       | Al cumplimiento del 50% de los Nodos. Se precisa que no incluye la implementación de cámaras y sensores en estos Nodos.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5%                                                       | Al cumplimiento del 75% de los Nodos. Se precisa que no incluye la implementación de cámaras y sensores en estos Nodos.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5%                                                       | Al cumplimiento del 100% de los Nodos, que incluye la verificación de la implementación de las cámaras y sensores respectivos en el 100% de los Nodos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Localidades con cobertura de Internet e Intranet y sus INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS conectadas.</b><br><br>Brindar acceso a Internet e Intranet en todas las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de la LOCALIDAD BENEFICIARIA correspondiente, así como cumplir con los requerimientos de Cobertura Radioeléctrica en dicha localidad de implementarse una solución inalámbrica, caso contrario, con INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS con conexión. | 6.25%                                                      | Al cumplimiento del 25% del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS.                                                                                        | - Listado, enviado por el CONTRATADO, de las instituciones conectadas.<br>- Es necesario que cada localidad mantenga niveles de cobertura según lo referido en el Anexo N° 8-B de las BASES utilizando la RED DE ACCESO construida para tal efecto.<br>- Es necesario que cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA mantenga conectividad con su respectivo POP y Nodo Distrital según lo referido en el Anexo N° 8-B de las BASES utilizando la RED DE ACCESO construida para tal efecto, brindando el servicio de acceso Internet y cumpliendo con los requisitos de velocidad exigidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.25%                                                      | Al cumplimiento del 50% del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.25%                                                      | Al cumplimiento del 75% del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.25%                                                      | Al cumplimiento del 100% del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.</b><br><br>Pruebas finales y optimización de la RED DE ACCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7%                                                         | Por única vez.                                                                                                                                         | Cumplimiento de requisitos previos a la suscripción, de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Hito Funcional y Descripción                                                                                                                                                               | Porcentaje del monto de FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO | Oportunidad de solicitar el pago                           | Acreditación                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es necesario que cada una de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS mantenga conectividad con sus respectivo Nodo Distrital.                                                              |                                                            |                                                            |                                                                                                                  |
| <b>4. Impartición de las capacitaciones.</b><br><br>Impartición de los módulos de capacitación previstos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, según Apéndice 13-A y 13-B. | 5%                                                         | Por única vez.                                             | Remisión de las Actas de Ejecución de la CAPACITACIÓN debidamente llenadas y a conformidad del FITEL.            |
| <b>6. Veinte (20) pagos semestrales durante el PERIODO DE OPERACIÓN.</b><br><br>Pagos semestrales de igual monto.                                                                          | 33%<br>(1.65% cada pago semestral)                         | Al cumplimiento de cada semestre del Periodo de Operación. | Aprobación de la provisión de servicios de la RED DE ACCESO y conectividad de acuerdo a los requisitos técnicos. |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>                                                |                                                            |                                                                                                                  |

14.1.2. En caso de que el CONTRATADO haya solicitado adelanto de acuerdo con lo especificado en el Formulario N° 1 del Anexo N° 5 de las BASES, éste se otorgará dentro del primer trimestre siguiente a la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y previa entrega de la GARANTÍA DE ADELANTO, cumpliendo con los requisitos señalados en las BASES.

El adelanto otorgado será descontado del primer y segundo desembolsos que se efectúen conforme a lo indicado en la tabla del Numeral 14.1.1, a razón del 50% del adelanto en cada uno de dichos desembolsos.

Asimismo, podrá ser descontado del tercer, cuarto y sucesivos desembolsos, que se encuentren pendientes, todo saldo de adelanto no cubierto conforme al procedimiento de descuentos señalado precedentemente, estando autorizado FITEL a retener y aplicar a sus acreencias, cualquier suma o valor o activo de propiedad del CONTRATADO que tenga en su poder o reciba a su favor por cualquier concepto.

#### 14.2. RED DE TRANSPORTE

14.2.1. El esquema de desembolsos del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE se describe en la siguiente tabla:

| Hito Funcional y Descripción                                                                           | Porcentaje del monto de FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE | Oportunidad de solicitar el pago                                                                   | Acreditación                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Implementación de Nodos Ópticos y backbone de fibra óptica asociada entre los Nodos Ópticos.</b> | 11%                                                            | Al cumplimiento del 20% de los Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada a estos Nodos. | - Aprobación de la PROPUESTA TÉCNICA GENERAL y PROPUESTA TÉCNICA DEFINITIVA. |

| Hito Funcional y Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje del monto de FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE | Oportunidad de solicitar el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acreditación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Obras civiles culminadas en Nodos Ópticos, acabados, puertas, concertina, gabinetes (ODF, DDF, networking y de energía), tableros eléctricos, piso técnico, escalerillas, SPAT.</p> <p>- Backbone de fibra óptica hasta el poste ubicado en las afueras del Nodo</p>                                                      | 11%                                                            | Al cumplimiento del 40% de los Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada a estos Nodos.                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- Remisión de planos finales de construcción (civil, arquitectónico, eléctrico, saneamiento), cuadernos de obras, informes de mezcla de concreto, y certificados de roturas de probetas y roturas de ladrillos relacionadas a la obra civil de los Nodos Ópticos.</p> <p>- Remitr pruebas de OTDR con trazas indicando longitudes y pérdidas de enlaces, empalme y conectores, se debe cumplir con los valores requeridos.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11%                                                            | Al cumplimiento del 60% de los Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada a estos Nodos.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11%                                                            | Al cumplimiento del 80% de los Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada a estos Nodos.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11%                                                            | Al cumplimiento del 100% de los Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada a estos Nodos y conectados el 100% de Nodos, incluyendo la implementación de gabinetes (ODF, DDF, networking y de energía) para el 100% de los Nodos así como del Backbone de fibra óptica conectada entre los Nodos ópticos a entregar, hasta el ODF. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>2. Construcción e implementación del NOC y del CENTRO(S) DE MANTENIMIENTO.</b></p> <p>- Obras civiles terminadas, equipos, accesorios y máquinas adquiridas e instaladas, repuestos adquiridos (no incluye la(s) camioneta(s)).</p> <p>- Conexión del NOC con todos los Nodos de Agregación de la RED DE TRANSPORTE.</p> | 10%                                                            | Por única vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- Aprobación de la PROPUESTA TÉCNICA GENERAL y PROPUESTA TÉCNICA DEFINITIVA.</p> <p>- Remisión de ACTAS DE INSTALACIÓN del NOC y CENTRO(S) DE MANTENIMIENTO incluyendo planos finales de construcción (civil, arquitectónico, eléctrico, saneamiento), cuaderno de obra, informes de mezcla de concreto y certificados de roturas de probetas y roturas de ladrillos relacionadas a las obras civiles.</p>                     |
| <p><b>3. Operatividad de la RED DE TRANSPORTE.</b></p> <p>- Montaje, configuración y operación de los sistemas de networking, energía, climatización, seguridad física, planta interna de fibra óptica.</p> <p>- Integración y optimización de los sistemas de la RED DE TRANSPORTE.</p>                                       | 10%                                                            | Al cumplimiento del 50% de los Nodos Ópticos completamente implementados y operativos con conectividad hasta el NOC.                                                                                                                                                                                                                        | <p>- Remisión de las ACTAS DE INSTALACIÓN de los Nodos Ópticos y tendido del backbone de fibra óptica, incluyendo resultados de pruebas de acuerdo a lo requerido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE TRANSPORTE.</p> <p>- Implementación en el FITEL del sistema de monitoreo remoto de la RED DE TRANSPORTE.</p>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10%                                                            | Al cumplimiento del 100% de los Nodos Ópticos completamente implementados y operativos con                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hito Funcional y Descripción                                                                                                                                        | Porcentaje del monto de FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE | Oportunidad de solicitar el pago                                                                                                   | Acreditación                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                | conectividad hasta el NOC<br>Adicionalmente, FITEL verificará que el 100 % de Nodos cuenten con servicios básicos (agua y desagüe) | - ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE.                                                                                                                      |
| 4. Transferencia de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.<br><br>Transferencia de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE                                                  | 10%                                                            | Por única vez                                                                                                                      | - Garantías de los fabricantes de los equipos de energía, networking, fibra óptica, seguridad física y de constructora de obras civiles.<br>- ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE |
| 5. Tres (3) pagos semestrales durante el PERIODO PROVISIONAL.<br><br>Al cumplimiento de cada Semestre correspondiente al tiempo de duración del PERIODO PROVISIONAL | 5%<br>(un tercio del 5% por cada pago semestral)               | Pagos semestrales de igual monto,                                                                                                  | Aprobación del correcto funcionamiento y provisión de servicios de la red de transporte regional.                                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        | <b>100%</b>                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |

14.2.2. En caso que el CONTRATADO haya solicitado adelanto de acuerdo a lo especificado en el Formulario N° 1 del Anexo N° 5 de las BASES, éste se otorgará dentro del primer trimestre siguiente a la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y previa entrega de la GARANTÍA DE ADELANTO, cumpliendo con los requisitos señalados en las BASES.

El adelanto otorgado será descontado del primer y segundo desembolsos que se efectúen conforme a lo indicado en la tabla del Numeral 14.2.1, a razón del 50% del adelanto en cada uno de dichos desembolsos.

Asimismo, podrá ser descontado del tercer, cuarto y sucesivos desembolsos, que se encuentren pendientes, todo saldo de adelanto no cubierto conforme al procedimiento de descuentos señalado precedentemente, estando autorizado FITEL a retener y aplicar a sus acreencias, cualquier suma o valor o activo de propiedad del CONTRATADO que tenga en su poder o reciba a su favor por cualquier concepto.

14.2.3. En caso de que el PERIODO PROVISIONAL finalice en una fecha anterior a su duración máxima, el MONTO DE FINANCIAMIENTO ADJUDICADO deberá ajustarse con base en la siguiente fórmula:

$$\text{Total de ajuste al MONTO DE FINANCIAMIENTO ADJUDICADO}_i \\ = (PE_i - PM_i) \times COM_i$$

Donde:

- PE : Plazo efectivo del PERIODO PROVISIONAL en meses  
PM : Plazo máximo del PERIODO PROVISIONAL en meses

COM : Costo operativo mensual de la RED DE TRANSPORTE, el cual es de 0.4% del monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

El ajuste deberá implementarse en el desembolso inmediato siguiente correspondiente a la RED DE TRANSPORTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍAS

- 15.1. Como condición para la suscripción del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en la FECHA DE CIERRE, EL CONTRATADO entregará al DIRECTOR DE PROYECTO la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y, de ser el caso, la GARANTÍA DE ADELANTO, las cuales deberán ser emitidas por una EMPRESA BANCARIA LOCAL o EMPRESA DE SEGUROS LOCAL debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o por una ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL. En caso se trate de una garantía emitida por una ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, se requerirá que la misma sea confirmada por alguna EMPRESA BANCARIA LOCAL, según lo detallado en el Anexo N° 2 de las BASES.
- 15.2. La GARANTÍA DE ADELANTO será por un monto de Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro y 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,444,584.01), monto equivalente a la suma del 10% del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO y 10% del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE, que garantiza el correcto uso de este desembolso a favor de EL CONTRATADO, conforme a lo dispuesto en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 15.3. La GARANTÍA DE ADELANTO deberá mantenerse vigente desde su entrega al FITEL hasta que se haya descontado, a satisfacción del FITEL, el íntegro del adelanto de los desembolsos correspondientes. El FITEL podrá disponer la prórroga obligatoria de la referida garantía, debiendo EL CONTRATADO renovarla por los plazos que se dispongan para tal efecto.
- 15.4. En consecuencia, la GARANTÍA DE ADELANTO será devuelta a EL CONTRATADO, una vez que el FITEL verifique a su satisfacción los descuentos sobre los desembolsos referidos en el numeral precedente.
- 15.5. La GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será emitida por un monto de Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro y 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,444,584.01), valor equivalente al diez por ciento (10%) del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO que garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATADO. El esquema de reducción de esta garantía es el siguiente:
- 15.5.1. Luego de suscrita el ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será sustituida por otra, cuyo monto será equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO.



Barro Alberto  
GEOCOM



EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, a favor del MTC con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Asimismo se obliga al saneamiento de dichos bienes, hasta la fecha de suscripción del Contrato de Concesión entre el MTC y el concesionario



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA RED DE ACCESO Y LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE

Conforme a lo señalado las BASES de la LICITACIÓN, en caso de no lograr la inscripción ante la SUNARP de la totalidad de los títulos de propiedad de los terrenos de la RED DE TRANSPORTE en el plazo correspondiente, el CONTRATADO deberá presentar la GARANTÍA POR SANEAMIENTO DE PREDIOS que deberá ser emitida por alguna de las entidades indicadas en las BASES siguiendo el formato del Anexo N° 15 de las BASES, en la oportunidad, monto y bajo las condiciones determinadas en el Apéndice N° 5 del Anexo N° 8-A de las BASES.



La GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será devuelta en un plazo máximo de cinco (05) DÍAS de realizado el último desembolso



La GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento del FTEL, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución, cuya copia se incluye como Anexo N° 5 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.



En caso EL CONTRATADO tenga OBSERVACIONES pendientes por subsanar consignadas en el último INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO emitido en el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESO, la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será renovada siete (07) DÍAS CALENDARIO antes de su vencimiento por un periodo mínimo de (60) DÍAS CALENDARIO, y así sucesivamente hasta que hayan sido subsanadas todas las OBSERVACIONES.

La GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es emitida por cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor del FTEL. Dicha garantía deberá ser renovada anualmente de forma que se encuentre vigente hasta el vencimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sin perjuicio de lo señalado en el Numeral 3.20 de la Clausula Tercera y el Numeral 4.6 de la Clausula Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Luego de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO, la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO será sustituida por otra equivalente al seis por ciento (6%) del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO, la cual se mantendrá vigente, a satisfacción del FTEL, hasta el término de la vigencia del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y se haya efectuado el último desembolso, de acuerdo a lo señalado en la Clausula 15.9.

de la operación de la RED DE TRANSPORTE, sin perjuicio de los señalado en el Apéndice N° 5 del Anexo N° 8-A de las BASES.

- 16.2. EL CONTRATADO reconoce que luego de la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, asumirá también la obligación de formalizar y perfeccionar, mediante todos los actos o procedimientos, que sean necesarios para la transferencia de la propiedad y del dominio a que se refiere el numeral precedente a favor del MTC. Asimismo, en caso de ser necesaria la reubicación de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE instalados por causas atribuibles a la imposibilidad de formalización y/o perfeccionamiento de la transferencia de propiedad y dominio de los terrenos a favor del MTC, el CONTRATADO asumirá todos los costos y trámites que dicho traslado pudiera conllevar, manteniendo indemne al Estado de cualquier afectación al respecto.
- 16.3. EL CONTRATADO se obliga a realizar las actividades necesarias para preservar el estado de conservación y utilidad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN.
- 16.4. EL CONTRATADO será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN. En consecuencia, se obliga a contratar los seguros necesarios para cumplir con lo previsto en este numeral.
- 16.5. Durante el PERIODO DE OPERACIÓN FITEL realizará el último desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO conforme a lo señalado en la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 16.6. Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de lo dispuesto en los Numerales 7.34 y 7.39 de la Cláusula Séptima y de los demás disposiciones previstas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, hasta la entrega de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN, EL CONTRATADO conforme a lo previsto en las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, en su calidad de poseedor inmediato de dichos bienes, tiene la obligación de ejercer (por su cuenta, cargo y de manera inmediata) las siguientes modalidades de defensa posesoria tanto para el caso de intento de usurpación, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de los mismos por parte de terceros.
- Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra EL CONTRATADO y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeída, pero absteniéndose siempre del empleo de vías de hecho no justificadas por las circunstancias.
  - Defensa posesoria judicial, que EL CONTRATADO deberá ejercer, en caso recaiga sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, entre otros; deberá comunicar al FITEL y al MTC dichos hechos y hacer uso de los

mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del MTC sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

- 16.7. El incumplimiento de la obligación de ejercer las defensas posesorias dará lugar a la aplicación de penalidades establecidas en la Cláusula Décimo Octava del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 16.8. EL CONTRATADO deberá comunicar al FITEL y al MTC, en forma inmediata y por conducto notarial, de la ocurrencia de daños sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, así como la naturaleza y cuantía de los mismos, hasta la entrega de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN.
- 16.9. El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de responsabilidad a EL CONTRATADO, el cual, ante un supuesto como los descritos en los párrafos precedentes, deberá coordinar inmediatamente con el FITEL y el MTC la interposición de las acciones legales que EL CONTRATADO deberá entablar, a fin de mantener indemne el derecho del MTC sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.
- 16.10. Sin perjuicio de lo señalado en el Numeral 7.30 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO deberá mantener indemne al FITEL y especialmente al MTC respecto de y contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de la RED DE ACCESO y de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.
- 16.11. Asimismo, EL CONTRATADO deberá cumplir, respecto de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO, con pagar los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, de conformidad con las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES a que se refiere el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, considerando entre dichas disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique.
- 16.12. EL CONTRATADO garantizará la correcta transferencia de propiedad y dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC y, en los casos previstos en la Cláusula Décimo Novena y bajo las condiciones establecidas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la transferencia de propiedad y/o titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO a favor del FITEL; así como, la operatividad y funcionamiento de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Asimismo, con dicha transferencia, reconocerá el dominio que el MTC tiene respecto de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE; y, de acuerdo a las condiciones previstas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la propiedad y/o titularidad que tendrá el FITEL respecto de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO. El derecho de propiedad sobre los predios que se transfiera para ambas redes, incluye al suelo, subsuelo y sobresuelo de acuerdo a lo señalado por el Código Civil, cuando corresponda.



**CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VINCULADOS AL PROYECTO ADJUDICADO**

17.1. El FITEL es el responsable de la SUPERVISIÓN del uso adecuado del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

**DE LA RED DE ACCESO**

17.2. El FITEL es el responsable de la SUPERVISIÓN y control del PROYECTO ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y PERIODO DE OPERACIÓN.

17.3. La SUPERVISIÓN del PERIODO DE OPERACIÓN se realizará semestralmente e iniciará al día siguiente de culminado el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO hasta el CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

17.4. En el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO la SUPERVISIÓN comprenderá principalmente lo siguiente:

- SUPERVISIÓN de la cantidad de LOCALIDADES BENEFICIARIAS, INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO ADJUDICADO y de su correcta ubicación.
- SUPERVISIÓN de la cantidad y calidad de la infraestructura, equipos, materiales, herramientas de gestión, entre otros, que serán aplicados al PROYECTO ADJUDICADO
- SUPERVISIÓN y control de la instalación de la infraestructura, equipos, materiales, herramientas de gestión, entre otros, que serán utilizados por el PROYECTO ADJUDICADO para prestar el servicio de acceso a Internet y el acceso a Intranet, de ser el caso en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, u otros que contraten el servicio dentro del alcance de la RED DE ACCESO instalada por EL CONTRATADO para atender al PROYECTO ADJUDICADO.
- SUPERVISIÓN y control de la SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y CAPACITACIÓN.
- SUPERVISIÓN y control del funcionamiento del servicio de acceso a Internet y el acceso a Intranet, de ser el caso, que serán prestados con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de acuerdo con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus anexos y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la PROPUESTA TÉCNICA, las CIRCULARES y las BASES.
- SUPERVISIÓN de otros aspectos que el FITEL considere necesario para garantizar el uso adecuado de los servicios requeridos.

La SUPERVISIÓN se realizará en concordancia con el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES.

17.5. Durante el PERIODO DE OPERACIÓN, el FITEL supervisará principalmente lo siguiente:

- Los servicios que prestará EL CONTRATADO con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, conforme los requerimientos previstos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y, en defecto de



éstas, conforme a las disposiciones contempladas en el marco legal y regulatorio que resulte aplicable.

- La calidad de la prestación de otros servicios que sean ofertados utilizando la RED DE ACCESO del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo a las condiciones establecidas en la adenda respectiva.
- SUPERVISIÓN del número de LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet libre de pago en plaza principal.
- SUPERVISIÓN del porcentaje de incremento de la velocidad mínima de descarga a ofrecer a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS.
- SUPERVISIÓN de las Tarifas Tope de acceso a Internet para personas diferentes a Instituciones Públicas.
- Otras que el FITEL recomiende o encargue dentro del marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### DE LA RED DE TRANSPORTE

17.6. El FITEL es el responsable de la SUPERVISIÓN y control del PROYECTO ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE, lo cual incluye la SUPERVISIÓN y control de la instalación de la infraestructura, equipos, materiales, herramientas de gestión, entre otros, que serán utilizados para la RED DE TRANSPORTE.

17.7. El FITEL podrá requerir a EL CONTRATADO toda la información y/o documentación de cualquier naturaleza relacionada con la RED DE TRANSPORTE que estime necesario sin limitación alguna, estando EL CONTRATADO en la obligación de remitírsela en los plazos que FITEL disponga en sus requerimientos.

17.8. De ejecutarse el PERIODO PROVISIONAL, el FITEL supervisará la performance de la red periódicamente y podrá ejecutar protocolos de SUPERVISIÓN para ello.

#### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DEMORA, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

La aplicación de las penalidades contempladas en la presente Cláusula no exonera a EL CONTRATADO del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o de las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES. Asimismo, en ningún caso el pago de las penalidades por parte de EL CONTRATADO o el descuento de las mismas por parte del FITEL a los desembolsos del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO implican que EL CONTRATADO tendrá el derecho a eximirse del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### DE LA RED DE ACCESO

18.1. Penalidades por incumplimiento en el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO

18.1.1. Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO podrán ser descontadas del desembolso correspondiente a este período.

18.1.2. Incumplimiento de Actividades

- 18.1.2.1 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación completa de algún servicio dentro del plazo establecido, el FITEL impondrá una penalidad de cinco centésimas (0.05) de UIT por INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA señalada en el Anexo N° 1 del presente contrato, por día de atraso en el incumplimiento, contado desde el día siguiente de culminada la ETAPA DE INSTALACIÓN.
- 18.1.2.2 En caso EL CONTRATADO no cumpla o cumpla parcialmente con las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, que se indican en el Numeral 5.2 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL impondrá una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por LOCALIDAD BENEFICIARIA donde no se cumplió con esta obligación y dentro del plazo establecido. Se considerará que esta actividad fue realizada cuando se alcance el porcentaje mínimo de asistentes señalados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, salvo lo señalado en el Numeral 5 del Apéndice N° 14-A del Anexo N° B-B de las BASES relacionado a la acreditación del mínimo de asistentes.
- 18.1.2.3 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación y conexión del sistema de monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, de acuerdo a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL impondrá una penalidad de cinco (5) UIT.

- 18.1.2.4 En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO se deba a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, éste deberá remitir al FITEL la documentación que acredite ello, como máximo dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del incumplimiento. Además, a fin de poder evaluar el hecho, EL CONTRATADO deberá de comunicar la ocurrencia del hecho, así como proponer su estimado de días requeridos para el cumplimiento de dichas actividades, dentro de los primeros quince (15) DÍAS CALENDARIO de ocurrido el hecho

Sin dicha documentación, no será posible acreditar el caso fortuito y fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no se ampliará el plazo y se aplicarán las penalidades conforme a los numerales precedentes de la presente Cláusula del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, según corresponda.

Sin embargo, debido a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADO que impidan la instalación de los servicios en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, debidamente sustentadas por EL CONTRATADO, el FITEL podrá evaluar el reemplazo de dichas localidades, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 11 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en localidades que no corresponden al listado de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS señaladas en el Anexo N° 1 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, dichas instituciones no se computarán para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

- 18.1.2.5. En caso EL CONTRATADO no haya contratado o no haya mantenido vigentes las pólizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO conforme a lo señalado en el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO el FITEL impondrá una penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido con esta obligación.
- 18.1.2.6. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación del servidor para monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 7.7.2 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, o no se terminen todas las actividades para la puesta en servicio de éste, el FITEL impondrá una penalidad de cinco (05) UIT.
- 18.1.2.7. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación de la cantidad de Centros de Atención a Usuarios dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 6.3 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL impondrá una penalidad de cinco (05) UIT.
- 18.1.2.8. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la obligación de ejercer las defensas posesorias conforme a lo señalado el Numeral 16.6 de la Cláusula Décimo Sexta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL impondrá una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3. Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Información

18.1.3.1. Las penalidades aplicables al incumplimiento de la entrega de información se encuentran precisadas en el Literal A del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

18.1.3.2. Salvo indicación en contrario precisada en el Literal A del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las penalidades aplicables a estos incumplimientos se aplicarán por única vez.

18.2. Penalidades por incumplimiento durante el PERIODO DE OPERACIÓN

18.2.1. Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE OPERACIÓN podrán ser descontadas del desembolso más próximo que corresponda entregar a EL CONTRATADO luego de la ocurrencia del incumplimiento respectivo o según sea previsto en las siguientes disposiciones. En caso que el monto de las penalidades de un semestre supere el desembolso correspondiente a dicho periodo, EL CONTRATADO deberá cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación de cobro.

18.2.2. Penalidades por incumplimiento de la disponibilidad de servicios

18.2.2.1. En caso EL CONTRATADO no cumpla con el requerimiento de disponibilidad mínima de la red del 98% anual, señalado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO y medido hasta el PUNTO DE PRESENCIA (POP), el FITEL impondrá una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada hora adicional de interrupción de la red. La

disponibilidad será calculada cada año, contado desde el primer día del PERIODO DE OPERACIÓN.

- 18.2.2.2. En caso que la disponibilidad de los servicios se vea interrumpida en alguno de los POPs por caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, EL CONTRATADO notificará al FITEL dentro del plazo de treinta (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la culminación del mes de producido el hecho, sobre la existencia de dichos eventos, el cual debe ser comunicado al FITEL mediante una carta adjuntando, a través de dispositivos de almacenamiento electrónico (CD, DVD o USB), el detalle de las fechas y las horas que solicitan descontar, así como las causas que dieron su origen.

Asimismo, EL CONTRATADO entregará al FITEL las pruebas que acrediten los casos fortuitos, de fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADO, a más tardar dentro de los sesenta (60) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la solicitud de exclusión de indisponibilidad de servicios por el evento sucedido. Sin estas pruebas, no será posible acreditar el caso fortuito, fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia el FITEL contará las interrupciones para el cálculo de las disponibilidades en lo que corresponda.

### 18.2.3. Penalidades por incumplimiento de la CAPACITACIÓN

- 18.2.3.1. En caso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parcialmente con realizar la CAPACITACIÓN de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N° 13-A de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL impondrá una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada localidad donde no se cumplió con esta obligación, dentro del plazo establecido en su CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO conforme a lo señalado en el Numeral 5 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO. Se considerará que esta actividad fue realizada cuando se alcance el porcentaje mínimo de asistentes.

### 18.2.4. Penalidades por incumplimiento de remisión de información

- 18.2.4.1. Las penalidades aplicables al incumplimiento de la entrega de información se encuentran precisadas en el Literal C del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- 18.2.4.2. Salvo indicación en contrario precisada en el Literal C del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las penalidades aplicables a estos incumplimientos se aplicarán por única vez.

### 18.2.5. Penalidades por OBSERVACIONES

- 18.2.5.1. El FITEL efectuará supervisiones previas a la realización de los desembolsos señalados en la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las supervisiones se efectuarán de acuerdo a los protocolos que apruebe el FITEL.
- 18.2.5.2. El FITEL impondrá una penalidad de una (01) UIT por cada una de las OBSERVACIONES que se señalan a continuación desde el Numeral 18.2.5.3 hasta el Numeral 18.2.5.5, por LOCALIDAD BENEFICIARIA o estación/nodo que consigne el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED

DE ACCESO, con la indicación de que la aplicación de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del cumplimiento de estas obligaciones.

18.2.5.3. Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el Programa de Mantenimiento preventivo de acuerdo a la PROPUESTA TÉCNICA.

18.2.5.4. Cuando EL CONTRATADO limite o impida al personal designado por el FITEL realizar las visitas correspondientes durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en sus labores de SUPERVISIÓN, el FITEL podrá imponer la penalidad por cada una de las visitas impedidas o limitadas. El FITEL podrá descontar ese valor en el desembolso inmediato siguiente a la fecha de la negativa o limitación. Se considerará también que el CONTRATADO impide o limita las labores de supervisión, cuando no se brinde el acceso o no se mantenga un adecuado acceso al Nodo.

18.2.5.5. Cuando EL CONTRATADO no cumpla con la instalación del software de bloqueo especificado en el Numeral 3.6 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO.

18.2.5.6. Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el plazo de treinta (30) DÍAS CALENDARIO, establecido en el Numeral 4.1.26 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, para instalar el servicio requerido, se aplicará una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada DÍA CALENDARIO de retraso.

18.2.5.7. Por el incumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos en el Apéndice N° 11 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, se aplicará una penalidad de acuerdo a la siguiente tabla:

| N° | Indicador                                                                 | Parámetro de Calidad                    | Ámbito           | Penalidad            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1  | TIA - Tasa de incidencia de Averías para el servicio de acceso a Internet | Menor al 10%                            | Toda la red      | 10 UIT x mes         |
| 2  | Latencia                                                                  | Menor a 150 mség                        | Hasta el CPE     | 0.05 UIT x mes x CPE |
| 3  | Pérdida de paquetes                                                       | Menor a 2%                              | Hasta el Abonado | 0.05 UIT x mes x CPE |
| 4  | Velocidad Up/Down                                                         | Mayor al 40% de la velocidad contratada | Hasta el CPE     | 0.05 UIT x mes x CPE |

Cabe precisar que la verificación del cumplimiento de los indicadores 2, 3 y 4 del cuadro anterior será en base al valor promedio mensual obtenido para cada uno de éstos durante la hora de mayor carga. Los indicadores y parámetros señalados en el cuadro precedente resultan aplicables para los accesos de internet libre de pago en las plazas principales.

Se precisa además que la penalidad establecida respecto del indicador 4 de la Tabla precedente, se aplicará respecto de la velocidad Up/Down definida en el Anexo N° 8-B de las BASES o respecto de la velocidad que el CONTRATADO haya ofrecido como factor de competencia en su PROPUESTA ECONÓMICA.





18.5 Penalizaciones por incumplimiento en la entrega de información:

de un décimo (0.1) de UIT por cada DÍA CALENDARIO de retraso en el Apéndice N° 5 del Anexo N° 8-A de las BASES, se aplicará una penalidad LA RED DE TRANSPORTE dentro del plazo previsto, de acuerdo a lo señalado

18.4.4 En caso de incumplimiento de la obligación de saneamiento de los BIENES DE

Sin dicha documentación, no será posible acreditar el caso fortuito y fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no se ampliará el plazo y se aplicarán las penalidades conforme a los numerales precedentes de la presente Cláusula del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,

quince (15) DÍAS CALENDARIO de ocurrido el hecho.

requeridos para el cumplimiento de dichas actividades, dentro de los primeros comunicar la ocurrencia del hecho, así como proponer su estimado de DÍAS Además, a fin de poder evaluar el hecho, EL CONTRATADO deberá de dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del incumplimiento, este deberá remitir al FITEL la documentación que acredite ello, como máximo caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE se deba a un supuesto de

18.4.3 En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO (05) UIT

puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondrá una penalidad de cinco usuarios y claves, entre otros, o no se terminen todas las actividades para la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE TRANSPORTE, así como TRANSPORTE, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 11.2 de las monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE

18.4.2 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación del sistema de obligación

penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido con esta Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL impondrá una TRANSPORTE conforme a lo señalado en el Numeral 7.21 de la Cláusula las pólizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la RED DE

18.4.1 En caso EL CONTRATADO no haya contratado o no haya mantenido vigentes

Incumplimiento de Actividades:

partir de la notificación de cobro. deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DÍAS CALENDARIO, contadas a correspondiente a dicho periodo, EL CONTRATADO deberá cancelar dicha En caso que el monto de las penalidades supere el desembolso incumplimiento respectivo o según sea previsto en las siguientes disposiciones. corresponda entregar a EL CONTRATADO luego de la ocurrencia del TRANSPORTE serán descontadas del desembolso mas próximo que corresponda aplicar por incumplimientos para la RED DE

DE LA RED DE TRANSPORTE

18.2.5.8 Las penalidades, si las hubiere, serán sumadas por indicador, por cada uno de los meses del semestre supervisado



18.5.1 Las penalidades aplicables a incumplimiento de la entrega de información se encuentran precisadas en el Literal B del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

18.5.2. Salvo indicación en contrario precisada en el Literal B del Anexo N° 12 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las penalidades aplicables a estos incumplimientos se aplicarán por única vez.

**RESPECTO A LOS FACTORES DE COMPETENCIA**

18.6. En caso EL CONTRATADO haya presentado como parte de su Oferta Técnica, la instalación de infraestructura para prestar los servicios del PROYECTO ADJUDICADO, en una cantidad adicional de LOCALIDADES BENEFICIARIAS, el FITEL impondrá una penalidad de quince (15) UIT si EL CONTRATADO no cumple con la instalación completa de algún servicio del PROYECTO ADJUDICADO dentro del plazo establecido. Esta penalidad no aplicará si EL CONTRATADO no incluyó dicho factor en la PROPUESTA TÉCNICA.

18.7. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalación de los accesos a Internet libre de pago en plazas principales durante la ETAPA DE INSTALACIÓN, el FITEL impondrá una penalidad de cinco décimas (0.5) de UIT por cada acceso de internet libre de pago no instalado en el plazo establecido.

18.8. En caso EL CONTRATADO no cumpla con el incremento de la velocidad mínima de descarga ofrecida a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, FITEL impondrá la penalidad establecida en el Numeral 18.2.5.7 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

**DE LAS GARANTÍAS**

18.9. Penalidades por no mantener vigente las Garantías

Si EL CONTRATADO no mantiene vigente alguna de las Garantías del PROYECTO ADJUDICADO, el FITEL le aplicará una penalidad de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad} = \frac{(\text{Valor de la Garantía}) \times (\text{número de DÍAS CALENDARIO en los que no se encuentra vigente la Garantía})}{\text{UIT}}$$

**REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES**

18.10. Independencia de las penalidades de las sanciones administrativas

Las penalidades previstas en este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus anexos, tienen naturaleza distinta a las sanciones administrativas que OSIPTEL, el FITEL o cualquier otro organismo público impongan en el ejercicio de sus facultades.

18.11. Procedimiento del pago de las penalidades

18.11.1. Las penalidades podrán ser descontadas de los desembolsos señalados en la Cláusula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. El pago de



las penalidades no implica renuncia del derecho del FITEL a reclamar el resarcimiento por daños y perjuicios, de existir éstos, ni su derecho de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, de acuerdo con lo previsto en el Numeral 19.2 de la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

18.11.2 Cuando existan penalidades que no fueran cubiertas totalmente por un desembolso pendiente de pago, o cuando no exista desembolso del cual puedan ser descontadas dichas penalidades, o en caso que en los últimos cuatros meses del PERIODO DE OPERACIÓN exista algún monto de penalidades por cobrar por parte del FITEL, EL CONTRATADO deberá cancelar la diferencia directamente al FITEL en un plazo de quince (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación de cobro. En caso de incumplimiento con dicho pago, una vez agotado el procedimiento señalado en el presente numeral, se procederá a ejecutar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO para el cobro del monto adeudado.

18.11.3 EL CONTRATADO pagará las penalidades en NUEVOS SOLES de acuerdo al tipo de cambio vigente al momento de su pago por EL CONTRATADO o al momento en que FITEL aplique el descuento a los desembolsos del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

#### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las siguientes causales:

19.1 Por vencimiento del plazo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO terminará, vencido el plazo a que se refiere la Cláusula Sexta del mismo y realizado el último desembolso al CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

19.2 Resolución por el FITEL

19.2.1. El FITEL podrá resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno derecho por alguna de las siguientes causales:

- Quando EL CONTRATADO sea declarado en situación de concurso ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI o de quien haga sus veces.
- Por falta de renovación de las garantías indicadas en la Cláusula Décimo Quinta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- Por incumplimiento injustificado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO o del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE LA RED DE TRANSPORTE, siempre que dicho incumplimiento evaluado por el FITEL, conlleve a que no se cumplan con las actividades dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO o dentro del PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE a que se refiere las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- d) Por incumplimiento injustificado de las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** y, en general, de las obligaciones pactadas en el **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**.
- e) Por dejar de prestar el servicio de acceso a Internet o, de ser el caso, del acceso a Intranet, en alguna de las **LOCALIDADES BENEFICIARIAS** o alguna de las **INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS** de manera injustificada, por causas imputables a **EL CONTRATADO**.
- f) Cuando se presenten desviaciones en el uso del **FINANCIAMIENTO ADJUDICADO**, o se le dé destino distinto para el que fue otorgado; sin perjuicio de lo pactado en el Numeral 10.3 de la **Cláusula Décima** del **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**.
- g) Por incumplimiento injustificado de la **PROPUESTA TÉCNICA**, salvo modificaciones establecidas entre las **PARTES**.
- h) Cuando el **FITEL** tuviese conocimiento de que el **OPERADOR** ha transferido su **PARTICIPACIÓN MÍNIMA** en el **CONTRATADO** antes de los tres (03) años, contados desde la **FECHA DE CIERRE**.
- i) Por pérdida de la **Concesión del Servicio Público de Telecomunicaciones** o pérdida de la inscripción en el registro de servicios de valor añadido para brindar los **Servicios Públicos de Telecomunicaciones** establecidos en las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.
- j) Cuando el monto de las penalidades referidos al **PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO** y al **PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE** haya superado el monto vigente de la suma de la **GARANTÍA DE ADELANTO** y la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**.
- k) Por inexactitud o falsedad de las **DECLARACIONES JURADAS** presentadas por **EL CONTRATADO** en la **LICITACIÓN**, en su calidad de **POSTOR**.
- l) Por incumplimiento de las obligaciones de **CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**.
- m) Por razones de conveniencia, de importancia o de interés del Estado Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresión de causa.
- n) Por negarse a transferir la propiedad y dominio a favor del **MTC** de los **BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE**. Esta causal incluye la negativa de realizar los actos necesarios para formalizar o perfeccionar dichas transferencias.
- o) Negarse a brindar todas las facilidades al **MTC**, al **FITEL** o al concesionario de la operación de la **RED DE TRANSPORTE** que requieran con el objetivo de facilitar la licitación y puesta en operación de dicho componente del **PROYECTO ADJUDICADO**.
- p) Por incumplimiento de la obligación de saneamiento de los predios de la **RED DE TRANSPORTE**, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 7.34 de la **Cláusula Séptima** del presente contrato, respectivamente.
- q) **EL CONTRATADO** declara que ni él, ni sus accionistas, socios o **EMPRESAS VINCULADAS**, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada a la **ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**, el **PROYECTO** o la ejecución del presente **CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**.
- Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo

anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el PROYECTO, ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO, el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO quedará resuelto de pleno derecho y el CONTRATADO pagará al FITEL una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que resultase de la aplicación del mecanismo o procedimiento de liquidación del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO establecido en la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA, sin perjuicio de la ejecución de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO ni de las indemnizaciones que corresponda pagar EL CONTRATADO

Queda expresamente establecido también que, en caso de resolución del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por incumplimiento del presente literal, EL CONTRATADO no recibirá ningún tipo de pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV N° 019-2015-SMV/01 o las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES que la modifiquen o sustituyan.

- r) Cuando se acredite que EL CONTRATADO o sus accionistas o socios que participaron en calidad de POSTORES, POSTORES CALIFICADOS y POSTORES APTOS, contrataron directa o indirectamente durante la LICITACIÓN los servicios de asesoría de personas naturales o jurídicas del sector privado, que hayan prestado o se encuentren prestando servicio de consultoría o asesoría a PROINVERSIÓN, en la LICITACIÓN.
- s) Cuando EL CONTRATADO incumpla con los Factores de Competencia presentados en el SOBRE N° 3.

19.2.2 En los casos de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO señalados en el Numeral precedente, con excepción del previsto en el literal m), el FITEL se encontrará facultado a: (i) ejecutar la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO a que se refiere la Cláusula Décimo Cuarta o de ser el caso la GARANTÍA DE ADELANTO; y, (ii) exigir a EL CONTRATADO una compensación por los daños y perjuicios irrogados por su incumplimiento.

19.2.3 En caso que EL CONTRATADO no haya adquirido la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED TRANSPORTE; y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO o PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE correspondiente, en virtud de los literales señalados en el Numeral 19.2.1 precedente, con excepción de los literales e), m) y p), EL CONTRATADO devolverá al FITEL la integridad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO desembolsado hasta ese momento o, en su defecto, se ejecutarán las garantías a que diera lugar.

19.2.4 En caso que EL CONTRATADO haya adquirido la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE sin haber procedido

a su instalación y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO o PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE correspondiente, en virtud de los literales señalados en el Numeral 19.2.1 precedente, con excepción de los literales e) y m), las PARTES suscribirán las actas de adjudicación correspondiente (por la que se transfiere a favor del FITEL la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o a favor del MTC la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE) y EL CONTRATADO endosará a favor del FITEL las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y devolverá la parte no ejecutada del desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO o, en su defecto, se ejecutará las garantías a que diera lugar.

Excepcionalmente, y siempre que EL CONTRATADO haya acreditado fehacientemente haber utilizado la totalidad del desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO en la adquisición de la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, las PARTES suscribirán el acta de adjudicación correspondiente (por la que se transfiere a favor del FITEL la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o a favor del MTC la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE).

19.2.5. En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido la propiedad y/o titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éstas redes se hayan sido instalado y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud de los literales señalados en el Numeral 19.2.1 precedente, según corresponda, las PARTES suscribirán el acta de adjudicación correspondiente (por la que se transfiere a favor del FITEL la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o a favor del MTC la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE) y EL CONTRATADO endosará a favor del FITEL las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

19.2.6. En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido la propiedad y/o titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éstas redes se hayan instalado y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud del literal m) del Numeral 19.2.1, las PARTES suscribirán el acta de adjudicación correspondiente (por la que se transfiere a favor del FITEL la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o a favor del MTC la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE) y EL CONTRATADO endosará a favor del FITEL las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL CONTRATADO conservará el monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO recibido en la parte equivalente al valor del suministro.

Asimismo, en caso EL CONTRATADO haya adquirido la propiedad y/o titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éstas redes no se hayan instalado y/o el FITEL no haya entregado más de un

desembolso, y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud del literal m) del Numeral 19.2.1, las PARTES suscribirán el acta de adjudicación correspondiente (por la que se transfiere a favor del FITEL la propiedad y/o la titularidad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO o a favor del MTC la propiedad de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE), siendo obligación de EL CONTRATADO realizar a favor del FITEL el endoso de las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sin que el FITEL efectúe otros desembolsos del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. En este supuesto, el FITEL podrá optar por exigir la instalación de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE.

- 19.2.7. En todos los supuestos de resolución por el FITEL en que se suscriba el acta de adjudicación correspondiente y se produzca el endoso de las pólizas sobre los bienes, derechos y elementos que conforman de la RED DE ACCESO y los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, no se incluirán ni en la suscripción del acta ni en el endoso a favor del FITEL de la póliza, aquellos equipos y/o instalaciones preexistentes a la entrada en vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de EL CONTRATADO, que sean utilizados para proveer los servicios propuestos en el PROYECTO ADJUDICADO.

Los equipos y/o instalaciones realizados por EL CONTRATADO para prestar servicios que no son requeridos en el marco del PROYECTO ADJUDICADO, son de propiedad de EL CONTRATADO.

### 19.3 Resolución por EL CONTRATADO

- 19.3.1. EL CONTRATADO podrá resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno derecho, por las siguientes causales:

- Ante la demora del FITEL en el desembolso de una cuota por más de ciento veinte (120) DÍAS, siempre y cuando EL CONTRATADO haya cumplido con todas las obligaciones indicadas en la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y haya subsanado todas las OBSERVACIONES del INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE o del INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO; o,
- Negativa no justificada del FITEL a recibir la INSTALACION por un plazo mayor a ciento veinte (120) DÍAS; o,

- 19.3.2. En tales casos, EL CONTRATADO conservará la propiedad de los bienes, derechos y elementos que conforman la RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE y los desembolsos efectivamente ejecutados, previa conciliación de saldos que deberá contar con la conformidad del FITEL, asimismo, endosará a favor de FITEL las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO; y, el FITEL se encontrará obligado a devolver la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Asimismo, aun habiéndose dado cualquiera de los tres casos señalados en el Numeral precedente, EL CONTRATADO está obligado a continuar brindando el servicio de acuerdo al plazo y condiciones contempladas en su Contrato de Concesión.

## 19.4. Resolución por Mutuo Acuerdo

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podrá resolverse por mutuo acuerdo, en cuyo caso, la propiedad de los activos adquiridos con el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO será transferida al FITEL y los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE serán transferidos a favor del MTC, quedando los mismos en custodia del FITEL hasta que, por medio de un nueva LICITACIÓN, sean adjudicados. Asimismo, deberá producirse a favor del FITEL el endoso de las pólizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Cláusula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Bajo este supuesto, las PARTES realizarán la conciliación de saldos la cual deberá contar con la conformidad del FITEL, de ser el caso.

En dicho supuesto de resolución, el FITEL devolverá la garantía correspondiente, asimismo, las PARTES declaran que no se reclamarán el pago por daños y perjuicios.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

- 20.1. De forma previa a la resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la PARTE afectada por el incumplimiento cursará a la PARTE que ha incumplido una carta notarial comunicándole el incumplimiento y resolviéndolo de pleno derecho.
- 20.2. Tratándose de los supuestos previstos en la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL podrá requerir a EL CONTRATADO, que satisfaga la(s) prestación(es) objeto de incumplimiento en un plazo máximo de quince (15) DÍAS CALENDARIO, pudiendo establecerse plazos superiores atendiendo a circunstancias excepcionales según lo determine el FITEL bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno derecho conforme a lo dispuesto por el Artículo 1429° del Código Civil peruano.
- 20.3. Conforme a lo dispuesto en los Numerales 3.20 y 3.21 de la Cláusula Tercera así como el Numeral 4.6 de la Cláusula Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en todos los casos de resolución que se produzcan una vez iniciado el PERIODO DE OPERACIÓN y únicamente en caso que el FITEL lo solicite, EL CONTRATADO deberá continuar con la operación y el mantenimiento por el plazo que el FITEL requiera, el que no excederá de ocho (08) meses, contados a partir de la comunicación de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, a fin de garantizar la continuidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Durante dicho plazo, el FITEL continuará entregando el financiamiento correspondiente por el número proporcional de DÍAS CALENDARIO transcurridos.
- 20.4. Lo señalado en el numeral precedente también será de aplicación para el supuesto previsto en el literal a) del Numeral 19.2.1 de la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en cuyo caso además, se conformará una administración temporal del PROYECTO ADJUDICADO conformada por representantes del FITEL y que lo representará ante la Junta de Acreedores con el objetivo de asegurar que EL CONTRATADO continúe con la prestación de los servicios establecidos en el presente contrato.

Durante dicho plazo e: FITEL, y siempre que la Junta de Acreedores así lo acuerde, podrá continuar entregando el financiamiento correspondiente por el número proporcional de DÍAS CALENDARIO transcurridos a la administración o entidad liquidadora designada por la Junta de Acreedores de conformidad con la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal.

- 20.5. En todos los casos de resolución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se realizará una conciliación de saldos que deberá contar con la conformidad del FITEL hasta la fecha de resolución.

#### CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

- 21.1. Es la etapa de la ejecución del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que se iniciará dentro de los primeros quince (15) DÍAS del último semestre del PERIODO DE OPERACIÓN y que culminará con la conclusión del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por el cumplimiento de sus obligaciones.

- 21.2. Para el CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las PARTES realizarán las siguientes actividades:

- a) EL CONTRATADO subsanará las OBSERVACIONES formuladas por el FITEL, en un plazo máximo de sesenta (60) DÍAS CALENDARIO desde su notificación.
- b) Una vez subsanadas las OBSERVACIONES por EL CONTRATADO, previamente verificadas por el FITEL, las PARTES dentro de un plazo máximo quince (15) DÍAS CALENDARIO, conciliarán el cálculo y pago de las penalidades incurridas por EL CONTRATADO, así como la liquidación financiera de los desembolsos y pagos a los que se obligan las PARTES.
- c) Una vez conciliada la información a que se refiere el literal b) precedente, las PARTES, suscribirán el acuerdo a que se refiere el Numeral 21.4 de la presente cláusula.

- 21.3. En caso de incumplimiento de las obligaciones para el CIERRE DE CONTRATO, FITEL requerirá a EL CONTRATADO su cumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) DÍAS CALENDARIO, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno derecho, y en consecuencia perderá el derecho al último desembolso y se procederá a la ejecución de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

- 21.4. El CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se formalizará mediante la suscripción del respectivo acuerdo, en el cual las PARTES declaran que no existen obligaciones pendientes de cumplir y que se ha realizado la liquidación financiera satisfactoriamente.

- 21.5. A los diez (10) DÍAS CALENDARIO contados desde la suscripción del acuerdo del CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se realizará el último desembolso y, posteriormente, en un máximo de cinco (05) DÍAS se devolverán las garantías correspondientes.

## CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 22.1. Si surgieren controversias de cualquier índole entre EL CONTRATADO y el FITEL relacionadas o derivadas de este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, que no puedan ser resueltas de común acuerdo por ambas partes o no cuente con un mecanismo de solución previsto por el presente documento, serán dirimidas por un tribunal arbitral en un arbitraje de derecho.
- 22.2. El arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03) miembros.
- 22.3. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima, de la AMCHAM u otra que elija el FITEL o EL CONTRATADO, según sea que la demanda provenga de alguna de estas partes.
- 22.4. El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente forma:
- Cada una de las PARTES designará un árbitro y éstas de común acuerdo, designarán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral.
  - En caso una de las PARTES no designe a su árbitro dentro de un plazo de diez (10) DÍAS CALENDARIO contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a la otra por escrito su voluntad de acogerse a la presente cláusula, el árbitro que no haya sido designado, será nombrado por la institución que tenga a su cargo la administración del proceso arbitral.
  - En caso las PARTES no designasen al tercer árbitro dentro de un plazo de sesenta (60) DÍAS CALENDARIO contados desde el nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la institución que tenga a su cargo la administración del proceso arbitral.
- 22.5. El Tribunal Arbitral tendrá un plazo de noventa (90) DÍAS desde su instalación para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable. Asimismo, el Tribunal puede quedar encargado de determinar con precisión la controversia, así como otorgar una prórroga en caso fuera necesario para emitir el laudo.
- 22.6. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español.
- 22.7. El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laudo arbitral, determinará la forma en que las partes deberán asumir los gastos y costos correspondientes al arbitraje.
- 22.8. En caso de que alguna de las PARTES decidiera interponer recurso de anulación contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a favor de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza otorgada por un banco de primer orden con sede en Lima, equivalente a US\$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), la misma que será solidaria, irrevocable, incondicionada y de ejecución automática en caso que dicho recurso, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza deberá estar vigente durante el tiempo que dure el proceso promovido y será entregada en custodia a un notario de la ciudad de Lima.
- 22.9. El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se suscribe con arreglo a las normas legales de la República del Perú, razón por la cual cualquier controversia

derivada de su celebración, interpretación, ejecución, validez y eficacia se regirá por esas normas legales.

Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el acceso a Intranet que proveerá EL CONTRATADO se regirán de manera supletoria por las normas regulatorias vigentes en el país, incluidas las normas de continuidad y calidad de los servicios, así como el régimen tributario aplicable a los contribuyentes de todo el territorio nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o gobiernos locales del país en lo que no esté regulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

23.1 EL CONTRATADO podrá ceder el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, así como transferir o subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su cargo, previa opinión favorable del FITEL.

La aprobación del FITEL dependerá, entre otros, de aspectos relacionados con la situación financiera de la empresa beneficiada con la cesión de posición contractual, transferencia o subrogación total o parcial de los derechos u obligaciones derivados del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.2 EL CONTRATADO se obliga a entregar al FITEL la información que éste requiera, para efectos de la cesión y/o transferencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.3 En caso el FITEL apruebe la cesión, transferencia o subrogación indicadas, deberá suscribirse una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.4 El nuevo CONTRATADO, deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en las BASES y las materias que correspondan al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

24.1 Partes Integrantes del Contrato

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO incluye sus Anexos. En el supuesto de existir contradicción entre las Cláusulas y Anexos, priman las cláusulas. Asimismo, en caso de discrepancia entre los documentos que lo conforman, el orden de prelación será el siguiente:

- a) El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
- b) La PROPUESTA TÉCNICA.
- c) Las CIRCULARES.
- d) Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- e) Las BASES.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podrá ser elevado a escritura pública por decisión de cualquiera de las PARTES. En cualquier caso, EL CONTRATADO correrá con los gastos correspondientes.

#### 24.2 Renuncia de Derechos

La renuncia de cualquiera de las PARTES a uno o más de los derechos que le correspondan conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificación a la otra PARTE. Si en cualquier momento una de las PARTES renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra PARTE como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, y en ejercicio de la facultad que le asiste EL CONTRATADO renuncia irrevocable e incondicionalmente a cualquier reclamación diplomática con relación al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

#### 24.3 Modificación del Contrato

Las PARTES acuerdan su total disposición para introducir modificaciones al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y a sus partes integrantes, de común acuerdo, cuando estimen conveniente. Cualquier modificación o enmienda, total o parcial, del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus partes integrantes, sólo tendrá validez si consta por escrito en la Adenda correspondiente y ésta es suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL o un representante debidamente autorizado de cada una de las PARTES.

#### 24.4 Nulidad del Contrato

Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de las cláusulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO adoleciera de vicio de nulidad, dicha situación no determinará la nulidad del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sino únicamente de la cláusula que se considere nula, caso en el cual el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO mantendrá su plena vigencia y exigibilidad. Sin embargo, si la cláusula declarada nula afectara la unidad del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las partes podrán solicitar que se declare la nulidad del mismo.

De forma similar, si dentro de una misma cláusula del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, alguno de los Numerales de dicha cláusula adoleciera del vicio de nulidad, dicha situación no determinará la nulidad de toda la cláusula si es que dicho Numeral pudiera ser suprimido sin afectar la unidad de la cláusula correspondiente.

#### 24.5 Propiedad Intelectual

EL CONTRATADO y el FITEL ejercen en igualdad de condiciones la propiedad intelectual de los Informes, Reportes y, en general, todo documento que EL CONTRATADO elabore en cumplimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, pudiendo cualquiera de las PARTES ejercer su derecho en beneficio propio o de terceros.

EL CONTRATADO podrá solicitar al FITEL, la declaratoria de la confidencialidad de la información, de conformidad a lo establecido en la normativa que resulta aplicable.

## CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: NOTIFICACIONES

- 25.1. Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo que expresamente se establezca otro mecanismo o formalidad, se harán por escrito, y se enviarán de y a las direcciones, números de facsímil y correos electrónicos que se indican en el Numeral 25.3 de la presente Cláusula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral se establece.
- 25.2. Cualquiera de las PARTES cuando lo considera conveniente podrá modificar las direcciones, números de facsímil y correos electrónicos, previa comunicación por escrito a la otra PARTE, cursada en la forma indicada en el Numeral 25.4 de la presente Cláusula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral se establece.
- 25.3. Todas las notificaciones bajo el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se entregarán con cargo de recepción, o con cualquier otro mecanismo que acredite la fecha de entrega de la notificación, y se considerarán efectivas en la fecha indicada en el respectivo cargo.

A los fines previstos en esta cláusula, las partes señalan como sus direcciones y números de facsímil los siguientes:

## Del FITEL:


Atención : Secretaría Técnica del FITEL  
 Dirección : Jr. Zorritos 1203, Lima 1.  
 Facsímil N° : 815-7815  
 Correo electrónico : FITEL@MTC.gob.pe


## DE EL CONTRATADO:

Atención : Jairo Alberto Cossio Mesa  
 Dirección : Av. Manuel Olguin N° 375 - Int. 506, Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.  
 Facsímil N° : 618-9200  
 Correo electrónico : jacossio@edemsa.com.pe

- 25.4. Cualquier cambio de los datos del FITEL o de EL CONTRATADO deberá realizarse mediante comunicación por escrito remitida a la otra PARTE por vía notarial surtiendo efectos desde el día siguiente de la fecha consignada en el cargo de recepción respectivo.

Firman las partes, en tres ejemplares, en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de mayo de 2018.

  
 .....  
 Ing. Jorge E. Mesía Ríos  
 Secretario Técnico (c)  
 Fondo de Inversión de Telecomunicaciones  
 FITEL

  
 EL CONTRATADO

## ANEXOS DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

- ANEXO N° 1 : LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
- ANEXO N° 2 : PROPUESTA TÉCNICA
- ANEXO N° 3 : CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO Y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE EL CONTRATADO
- ANEXO N° 4 : PROPUESTA ECONÓMICA
- ANEXO N° 5 : GARANTÍA DE ADELANTO y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
- ANEXO N° 6 : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- ANEXO N° 7 : BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN
- ANEXO N° 8 : CIRCULARES
- ANEXO N° 9 : PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA DISPONIBILIDAD
- ANEXO N° 10 : FORMATO DE COSTOS DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO Y LA RED DE TRANSPORTE
- ANEXO N° 11 : LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, LOCALIDADES BENEFICIARIAS Y NODOS DE LA RED DE ACCESO
- ANEXO N° 12 : PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA LAS REDES DE ACCESO Y TRANSPORTE





**ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**

**REGION MOQUEGUA**

**1. Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS OBLIGATORIAS**

| Nro | Codigo 2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO      | LOCALIDAD     | ENTIDADES ESTATALES |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|-------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |             |              |                       |               |               | LOCALES ESCOLARES   | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 1   | 1801010003  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | ESTUQUIÑA     | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9228   | -17.1615   | 1503              |
| 2   | 1801010005  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | LOS ANGELES   | 0                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.9071   | -17.1705   | 1573              |
| 3   | 1801010039  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | LA BODEGUILLA | 0                   | 1                         | 0                       | GOOGLE EARTH       | -70.98404  | -17.254109 | 1188              |
| 4   | 1801020001  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | CARUMAS       | 1                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.8948   | -16.8092   | 3046              |
| 5   | 1801020002  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | TITRE         | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.3629   | -16.5305   | 4951              |
| 6   | 1801020017  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | ATASPAYA      | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7055   | -16.7879   | 3006              |
| 7   | 1801020022  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | SOLAJO        | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.5892   | -16.8093   | 3163              |
| 8   | 1801020029  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | SALAPA        | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.6717   | -16.8221   | 3292              |
| 9   | 1801020031  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | CAMBRIJE      | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.6781   | -16.8247   | 3129              |
| 10  | 1801020032  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | SCMDA         | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.6835   | -16.8295   | 3176              |
| 11  | 1801020064  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | ARQUITAYA     | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.3003   | -16.6055   | 4428              |
| 12  | 1801030001  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | CUCHUMBAYA    | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.686    | -16.751    | 3139              |
| 13  | 1801030006  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | SACUAYA       | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.718885 | -16.759575 | 2973              |
| 14  | 1801030010  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | YDJO          | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7224   | -16.7667   | 2554              |
| 15  | 1801030016  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | SOQUEZANE     | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.6676   | -16.7872   | 3815              |
| 16  | 1801040003  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAMEGUA       | EL MOLINO     | 0                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.5387   | -17.1315   | 3946              |
| 17  | 1801050001  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | CALACDA       | 1                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.6833   | -16.7393   | 3460              |
| 18  | 1801050029  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7062   | -16.7402   | 3136              |
| 19  | 1801060077  | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | TORATA        | YACINGO       | 0                   | 1                         | 0                       | GOOGLE EARTH       | -70.866007 | -17.091957 | 2078              |
| 20  | 1802010005  | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE         | CHAGAHUAYO    | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9624   | -16.6486   | 2536              |
| 21  | 1802010012  | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE         | QUINSTACAS    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9649   | -16.6623   | 2240              |
| 22  | 1802010014  | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE         | COGRI         | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9817   | -16.6686   | 2180              |

OROCOM  
Orocco  
Gerente General





ORCCOM  
 Jaime Alberto Cobos Masa  
 Gerente General

| Nro | Codigo2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO        | LOCALIDAD                          | ENTIDADES ESTATALES |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |            |              |                       |                 |                                    | LOCALES ESCOLARES   | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 23  | 1802010025 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE           | SAN JUAN DE DIOS                   | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9925   | -16.6587   | 1814              |
| 24  | 1802010028 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE           | SAN FRANCISCO                      | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9885   | -16.7007   | 1901              |
| 25  | 1802070001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHUJATA         | CHUJATA                            | 1                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.7303   | -16.3884   | 3635              |
| 26  | 1802020003 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHUJATA         | PATA PAMPA                         | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7292   | -16.3782   | 3616              |
| 27  | 1802030001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE        | COALAQUE                           | 2                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -71.0209   | -16.6489   | 2307              |
| 28  | 1802030005 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE        | AMATA                              | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -71.083563 | -16.614512 | 3132              |
| 29  | 1802030009 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE        | HUARANGAYO                         | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.0606   | -16.6334   | 2705              |
| 30  | 1802040001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA          | ICHUÑA                             | 1                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.5357   | -16.1406   | 3792              |
| 31  | 1802040043 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA          | SANTA CRUZ DE OYO OYO (SANTA CRUZ) | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.5775   | -16.1553   | 1780              |
| 32  | 1802050001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA      | LA CAPILLA                         | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -71.1793   | -16.7569   | 1842              |
| 33  | 1802050005 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA      | COALAQUE                           | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.1675   | -16.6785   | 2487              |
| 34  | 1802050011 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA      | HEMBRIÑA                           | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.1728   | -16.7129   | 2202              |
| 35  | 1802060001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LLOQUE          | LLOQUE                             | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7884   | -16.324    | 3317              |
| 36  | 1802070001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE       | MATALAQUE                          | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8285   | -16.4811   | 2575              |
| 37  | 1802080001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | PUQUINA                            | 2                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -71.1843   | -16.6255   | 3082              |
| 38  | 1802080012 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | TALAMOLLE                          | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.2595   | -16.5834   | 3454              |
| 39  | 1802080015 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | CHUPUNUAYO                         | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.1895   | -16.6062   | 3288              |
| 40  | 1802080026 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | SANTA ROSA DE POCARA               | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -71.2152   | -16.6092   | 3528              |
| 41  | 1802090017 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | CHACABUYO                          | 2                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.2037   | -16.6123   | 3333              |
| 42  | 1802080026 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | SURIN                              | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.2003   | -16.6345   | 3118              |
| 43  | 1802080055 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | CHILATA                            | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -71.2346   | -16.6292   | 3274              |
| 44  | 1802090001 | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | QUINISTAQUILLAS                    | 2                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.8804   | -16.7493   | 1780              |



000056



| Nro | Cod.INEI2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO      | LOCALIDAD                  | ENTIDADES ESTATALES |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |              |              |                       |               |                            | LOCALES ESCOLARES   | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 45  | 1802100001   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | LIBINAS                    | 2                   | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.8559   | -16.3867   | 3307              |
| 46  | 1802100009   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | QUEERUA                    | 1                   | 0                         | 0                       | INF-GPS            | -70.7685   | -16.146    | 4314              |
| 47  | 1802100010   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | PACHAMAYO                  | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.6862   | -16.1707   | 3879              |
| 48  | 1802100011   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | TASSA                      | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8988   | -16.1816   | 3634              |
| 49  | 1802100022   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | SAN CRISTOBAL DE TORATA    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.7435   | -16.3508   | 3214              |
| 50  | 1802100027   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | TONOHAYA                   | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.9567   | -16.3974   | 3132              |
| 51  | 1802100029   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | SACOHAYA                   | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8747   | -16.4011   | 3706              |
| 52  | 1802100032   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | YAHUACA (SAN MIGUEL NUEVO) | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8337   | -16.4161   | 2883              |
| 53  | 1802100034   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | ANASCAPA                   | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8569   | -16.4282   | 3407              |
| 54  | 1802100066   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | URINAS        | ESCACHA                    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.8316   | -16.3923   | 3329              |
| 55  | 1802110001   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | TUNGA         | YUNGA                      | 1                   | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.679    | -16.1851   | 3630              |
| 56  | 1803020001   | MOQUEGUA     | ILO                   | EL ALGARROBAL | EL ALGARROBAL              | 1                   | 1                         | 1                       | GOOGLE EARTH       | -71.288321 | -17.622574 | 133               |
| 57  | 1801030002   | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | QUEBAYA                    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.678600 | -16.749600 | 3227              |
| 58  | 1801040005   | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SANEGUA       | BUENA VISTA                | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.860900 | -17.153500 | 1788              |
| 59  | 1801060045   | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | TORATA        | QUELE                      | 1                   | 0                         | 0                       | GOOGLE EARTH       | -70.855205 | -17.042758 | 2501              |
| 60  | 1802030002   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COMAQUE       | PALCAMAYO                  | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.046500 | -16.594800 | 3244              |
| 61  | 1802030008   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COMAQUE       | EL ESTANQUE                | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.039200 | -16.641000 | 2423              |
| 62  | 1802030014   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COMAQUE       | SAN JOSE DE RONDENO        | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.037900 | -16.648700 | 2340              |
| 63  | 1802050014   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA    | CHALLAHUAYO                | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.181100 | -16.738200 | 1964              |
| 64  | 1802080011   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA       | ORLAQUE                    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.246300 | -16.590300 | 3354              |
| 65  | 1802080022   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA       | SEGUNDA                    | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.200900 | -16.527700 | 3186              |
| 66  | 1802080033   | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA       | POCOHUAYO                  | 1                   | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -71.177400 | -16.559400 | 2716              |





## 2. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

### 2.1. Establecimientos de Salud Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |                       |               |                                    | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |                                    |           |                                                |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|     | CodIME2015            | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO      | LOCALIDAD                          | COD. UNICO MINSA                   | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO          | CATEGORIA | DIRECCION                                      |
| 1   | 180101005             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | LOS ANGELES                        | 00002827                           | P.S. LOS ANGELES                   | I-2       | CALLE SAN MARTIN S/N                           |
| 2   | 180101009             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | LA BODEGUILLA                      | 00002829                           | P.S. LA BODEGUILLA                 | I-2       | PANAMERICANA SUR KM. 8                         |
| 3   | 180102001             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | CARUMAS                            | 00002830                           | CENTRO DE SALUD CARUMAS - MOQUEGUA | I-3       | PROLONG. SAN BERNABE S/N                       |
| 4   | 180102002             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | TITIRE                             | 00002831                           | C.S. PUENTE BRILLO                 | I-3       | TITIRE S/N                                     |
| 5   | 180102003             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS       | CAMBRUNE                           | 00002838                           | C.S. CAMBRUNE                      | I-3       | CALLE 28 DE JULIO S/N                          |
| 6   | 180103001             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | CUCHUMBAYA                         | 00002810                           | C.S. CUCHUMBAYA                    | I-3       | CALLE MOQUEGUA S/N                             |
| 7   | 180104005             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | SACUAYA                            | 00002811                           | P.S. SACUAYA                       | I-2       | SACUAYA S/N                                    |
| 8   | 180103015             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA    | SOQUEZANE                          | 00002812                           | P.S. SOQUEZANE                     | I-2       | SOQUEZANE S/N                                  |
| 9   | 180104003             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAMEGUA       | EL MOLINO                          | 00002833                           | P.S. TUMILACA                      | I-1       | ANEXO EL MOLINO S/N                            |
| 10  | 180105001             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | CALACCA                            | 00002813                           | C.S. CALACCA                       | I-3       | AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N             |
| 11  | 180105002             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL                      | 00002815                           | P.S. SAN CRISTOBAL                 | I-2       | AV. ANDRES AVEDANO CACERES S/N                 |
| 12  | 180106002             | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | TORATA        | YACANGO                            | 00002816                           | P.S. YACANGO                       | I-1       | YACANGO S/N                                    |
| 13  | 180201005             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE         | CHALLAHUAYO                        | 00002842                           | P.S. CHALLAHUAYO                   | I-2       | ANEXO CHALLAHUAYO S/N                          |
| 14  | 180201001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA       | CHOJATA                            | 00002847                           | C.S. CHOJATA                       | I-3       | CALLE JUAN VELAZCO ALVARADO S/N                |
| 15  | 180203001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE      | COALAQUE                           | 00002837                           | C.S. COALAQUE                      | I-3       | AVENIDA AREQUIPA S/N                           |
| 16  | 180203005             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE      | AMATA                              | 00002838                           | P.S. AMATA                         | I-2       | COMUNIDAD CAMPESINA AMATA, CALLE PRINCIPAL S/N |
| 17  | 180204001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA        | ICHUÑA                             | 00002848                           | C.S. ICHUÑA                        | I-3       | CALLE TUMA S/N                                 |
| 18  | 180204004             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA        | SANTA CRUZ DE OYO OYO (SANTA CRUZ) | 00002849                           | P.S. OYO OYO                       | I-1       | CARABAYA S/N                                   |
| 19  | 180205001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA    | LA CAPILLA                         | 00002839                           | P.S. LA CAPILLA                    | I-2       | CURUYO S/N                                     |
| 20  | 180206001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LLOQUE        | LLOQUE                             | 00002853                           | C.S. LLOQUE                        | I-3       | CALLE COMERCIO S/N                             |
| 21  | 180207001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE     | MATALAQUE                          | 00002854                           | C.S. MATALAQUE                     | I-3       | CALLE MARIANO C. FLORES S/N                    |
| 22  | 180208001             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUCURNA       | PUCURNA                            | 00002843                           | C.S. PUCURNA                       | I-3       | CALLE BOS DE MAYO S/N                          |

ROBSON  
Gusto Alberto Cassio Mesa  
Gerente General





| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |                       |                 |                      | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |                           |           |                            |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO        | LOCALIDAD            | COD_UNICO MINSA                    | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION                  |
| 23  | 180200019             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | SANTA ROSA DE PUCARA | 00002845                           | F.S. SANTA ROSA           | F-1       | AVENIDA RAMON CASTILLA S/N |
| 24  | 180200055             | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | CHILATA              | 00002844                           | P.S. CHILATA              | F-1       | CALLE SAN ISIDRO S/N       |
| 25  | 1802090001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | QUINISTAQUILLAS      | 00002846                           | P.S. QUINISTAQUILLAS      | F-1       | CALLE LOS CLAVEES S/N      |
| 26  | 1802100001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | UBINAS               | 00002857                           | C.S. UBINAS               | F-3       | CALLE ANTAPATA S/N         |
| 27  | 1802100034            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | ANASCAPA             | 00002860                           | P.S. ANASCAPA             | F-1       | CALLE MARIANO MELGAR S/N   |
| 28  | 1802110001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA           | YUNGA                | 00002862                           | C.S. YUNGA                | F-3       | CALLE AVELINO CACERES S/N  |
| 29  | 1803020001            | MOQUEGUA     | ILO                   | EL ALGARROBAL   | EL ALGARROBAL        | 00002928                           | P.S. EL ALGARROBAL        | F-1       | AVENIDA PRINCIPAL S/N      |

## 2.2. Dependencias Policiales Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |                       |                 |                 | DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL |                              |                                      |                                                               |                                 |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO        | LOCALIDAD       | CODIGO                           | NOMBRE                       | DIRECCION                            | REFERENCIA                                                    | DIRTEPOL                        |
| 1   | 1802020001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA         | CHOJATA         | 0857                             | CPNP CHOJATA                 | Calle TACNA # 5N                     | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE CHOJATA                        | XVI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA   |
| 2   | 1802040001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA          | ICHUÑA          | 0858                             | CPNP ICHUÑA                  | CALLE LIMA 142. U. LTE. 38           | FRENTE AL JUZGADO DE PAZ DE ICHUÑA                            | XVII DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA  |
| 3   | 1802060001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | PUQUINA         | 0859                             | CPNP PUQUINA                 | Calle RAMON CASTILLA # 5N            | A ESPALDA DE LA IGLESIA                                       | XIII DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA  |
| 4   | 1802090001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | QUINISTAQUILLAS | 0860                             | CPNP QUINISTAQUILLAS         | Calle CRUZ VERDE # 106               | FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL QUINISTAQUILLAS           | XIV DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA   |
| 5   | 1802100001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | UBINAS          | 0861                             | CPNP UBINAS                  | Calle PLAZA DE ARMAS # 5N            | FRENTE PLAZA DE UBINAS                                        | XV DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA    |
| 6   | 1803020001            | MOQUEGUA     | ILO                   | EL ALGARROBAL   | EL ALGARROBAL   | 0865                             | CPNP EL ALGARROBAL           | Avenida PRINCIPAL EL ALGARROBAL # 5N | AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD                                | XVIII DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 7   | 1801020001            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | CARUMAS         | 0850                             | CPNP CARUMAS                 | Calle INDEPENDENCIA # 5N             | EN LA PLAZA DE ARMAS                                          | XI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA    |
| 8   | 1801010005            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA        | LOS ANGELES     | 0852                             | CPNP LOS ANGELES             | Calle 2 DE MAYO # 302                | AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PORLADO LOS ANGELES | XII DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA   |
| 9   | 1801050001            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL   | CALACCA         | 0853                             | CPNP SAN CRISTOBAL - CALACCA | Calle LIMA # 5N                      | AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD                                | XIX DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA   |

DR. Alberto Casado Mesa  
Gerente General

ORCOM





### 2.3. Locales Escolares Obligatorios

| NRO | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |                       |            |                                    | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                                          |                               |                                                                                 |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | CODIGO 2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO   | LOCALIDAD                          | CODIGO LOCAL            | NOMBRE                                   | DIRECCION                     | MÓDULOS                                                                         |
| 1   | 1802020001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA    | CHOJATA                            | 198142                  | TURAC AMARO II                           | CALLE SAN MARTIN S/N          | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                            |
| 2   | 1802020003            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA    | PATA PAMPA                         | 198180                  | TECNICO AGROPECUARIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL | CARPINTERA SAN MIGUEL COROSE  | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                            |
| 3   | 1802030005            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE   | AMATA                              | 298136                  | 43088 SEÑOR DE LOS MILAGROS              | AMATA                         | PRIMARIA                                                                        |
| 4   | 1802030002            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE   | COALAPE                            | 398241                  | 43075 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO    | AVENIDA AREQUIPA S/N          | PRIMARIA                                                                        |
| 5   | 1802030001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE   | COALAQUE                           | 398321                  | SAN PEDRO                                | CALLE MOQUEGUA S/N            | SECUNDARIA                                                                      |
| 6   | 1802030009            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE   | HUARANGAYO                         | 198279                  | 43060 SAN VICENTE DE PAUL                | HUARANGAYO                    | PRIMARIA                                                                        |
| 7   | 1802040001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA     | ICHUÑA                             | 388430                  | 200 / ICHUÑA / MARISCAL RAMON CASTILLA   | CALLE MOQUEGUA S/N            | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) |
| 8   | 1802040043            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA     | SANTA CRUZ DE OYO OYO (SANTA CRUZ) | 388438                  | ANTONIO RAYMONDI                         | SANTA CRUZ DE OYO OYO         | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                            |
| 9   | 1802050005            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | COALAQUE                           | 398731                  | 43079                                    | COALAQUE                      | PRIMARIA                                                                        |
| 10  | 1802050011            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | HEMBRUÑA                           | 398707                  | 43062                                    | HEMBRUÑA                      | PRIMARIA                                                                        |
| 11  | 1802050001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | LA CAPILLA                         | 398688                  | 270 / LA CAPILLA                         | CALLE DEL OLVIDO S/N          | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 12  | 1802060001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | LLOQUE     | LLOQUE                             | 398788                  | ELIAS AGUIRRE ROMERO                     | LLOQUE                        | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                            |
| 13  | 1802070001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE  | MATALAQUE                          | 298940                  | RICARDO PALMA                            | CALLE FRANCISCO B. CAMPOS S/N | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                            |
| 14  | 1802020005            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE      | CHALLAHUAYO                        | 398062                  | 43074                                    | CHALLAHUAYO                   | PRIMARIA                                                                        |
| 15  | 1802010014            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE      | COGRI                              | 398037                  | 43073                                    | COGRI                         | PRIMARIA                                                                        |
| 16  | 1802010012            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE      | QUINSTACAS                         | 398043                  | 43071                                    | CALLE FRANCISCO ZACONETA S/N  | PRIMARIA                                                                        |
| 17  | 1802010028            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE      | SAN FRANCISCO                      | 398024                  | 43057                                    | SAN FRANCISCO                 | PRIMARIA                                                                        |
| 18  | 1802010026            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE      | SAN JUAN DE DIOS                   | 398076                  | 43145                                    | SAN JUAN DE DIOS              | PRIMARIA                                                                        |
| 19  | 1802010037            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | CHACAHUAYO                         | 399033                  | JUAN PABLO II                            | CALLE 28 DE JULIO S/N         | PRIMARIA                                                                        |
| 20  | 1802050017            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | CHACAHUAYO                         | 399113                  | JUAN PABLO II                            | CALLE DEPORTE S/N             | SECUNDARIA                                                                      |
| 21  | 1802080055            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | CHILATA                            | 399047                  | CHILATA                                  | CHILATA                       | PRIMARIA                                                                        |
| 22  | 1802080055            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | CHILATA                            | 399127                  | CHILATA                                  | CHILATA                       | SECUNDARIA                                                                      |
| 23  | 1802080015            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | CHURUHUAYO                         | 398986                  | 43063                                    | CHURUHUAYO                    | PRIMARIA                                                                        |
| 24  | 1802080001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | PUQUINA                            | 398972                  | 43081 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ             | CALLE 21 DE JUNIO 101         | PRIMARIA                                                                        |
| 25  | 1802080001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | PUQUINA                            | 399108                  | MARIANO LIND URQUIETA                    | CALLE JUNIN S/N               | SECUNDARIA                                                                      |
| 26  | 1802080016            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | SANTA ROSA DE PUCARA               | 399066                  | 43084                                    | AVENIDA RAMON CASTILLA 501    | PRIMARIA                                                                        |
| 27  | 1802080016            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA    | SUBIN                              | 399071                  | 43085                                    | SUBIN                         | PRIMARIA                                                                        |






**DARCOM**  
 Daniel Alberto Castro Masa  
 Gerente General

| NRO | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |                       |                 | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR    |              |                                    |                                    |                                                                        |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | CODIGO 2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA             | DISTRITO        | LOCALIDAD                  | CODIGO LOCAL | NOMBRE                             | DIRECCION                          | MÓDULOS                                                                |
| 28  | 1802080012            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA         | TALAMOLLE                  | 399065       | VIRGEN DEL CARMEN                  | TALAMOLLE                          | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 29  | 1802090001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAGUILLAS | QUINISTAGUILLAS            | 399131       | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE       | CALLE LAS FLORES S/N               | PRIMARIA                                                               |
| 30  | 1802090001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAGUILLAS | QUINISTAGUILLAS            | 313255       | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE       | CALLE LOS OLIVOS S/N               | SECUNDARIA                                                             |
| 31  | 1802100034            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | ANASCAPA                   | 399293       | 43123                              | AVENIDA MARIANO MELGAR S/N         | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 32  | 1802100066            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | ESCACIA                    | 399354       | 43134                              | ESCACIA                            | PRIMARIA                                                               |
| 33  | 1802100010            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | PACHAMAYO                  | 399388       | 43131                              | PACHAMAYO                          | INICIAL, PRIMARIA                                                      |
| 34  | 1802100009            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | QUERALA                    | 399269       | QUERALA                            | QUERALA                            | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA                                          |
| 35  | 1802100029            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | SACOHAYA                   | 399472       | JOSE ANTONIO ENCINAS               | CALLE TACNA S/N                    | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 36  | 1802100022            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | SAN CRISTOBAL DE TORATA    | 399130       | 43137                              | TORATA                             | PRIMARIA                                                               |
| 37  | 1802100032            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | TANUACA (SAN MIGUEL NUEVO) | 399111       | 336 / 43124                        | CALLE RICARDO PALMA S/N            | INICIAL, PRIMARIA                                                      |
| 38  | 1802100013            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | TASSA                      | 399486       | TASSA                              | TASSA                              | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 39  | 1802100027            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | TONOHAYA                   | 399325       | 43125                              | TONOHAYA                           | PRIMARIA                                                               |
| 40  | 1802100001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | UBINAS                     | 399245       | 43120                              | CALLE CONCEPCION S/N               | PRIMARIA                                                               |
| 41  | 1802100001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS          | UBINAS                     | 399448       | JOSE CARLOS MARIATEGUI             | CALLE CONCEPCION 101               | SECUNDARIA                                                             |
| 42  | 1802110001            | MOQUEGUA     | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA           | RUNGA                      | 399542       | ANDRES AVELINO CACERES             | AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES S/N | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 43  | 1803020001            | MOQUEGUA     | ILO                   | EL ALGARROBAL   | EL ALGARROBAL              | 400041       | 43130                              | AVENIDA PRINCIPAL KM 15            | PRIMARIA                                                               |
| 44  | 1803020064            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | ARUNTAYA                   | 397661       | AGROPECUARIO ARTESANAL DE ARUNTAYA | ARUNTAYA                           | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 45  | 1803020012            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | ATASPAYA                   | 397265       | 43044                              | ATASPAYA                           | PRIMARIA                                                               |
| 46  | 1803020031            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | CAMBRUNE                   | 397326       | CAMBRUNE                           | CAMBRUNE                           | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 47  | 1803030001            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | CARUMAS                    | 397227       | CARUMAS / HORACIO ZEBALLOS GAMEZ   | CALLE PROGRESO S/N                 | PRIMARIA, SECUNDARIA, CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA (CETPRO) |
| 48  | 1803020029            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | SAYLAPA                    | 397246       | 43042                              | SAYLAPA                            | PRIMARIA                                                               |
| 49  | 1803020032            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | SOLAJO                     | 397270       | 43050                              | CARRETERA SOLAJO S/N               | INICIAL, PRIMARIA                                                      |
| 50  | 1803020052            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | SOMDA                      | 397251       | 43043                              | SOMDA                              | PRIMARIA                                                               |
| 51  | 1803020002            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CARUMAS         | TITRE                      | 758766       | TITRE                              | CARRETERA TITRE - CHUNA - YOLAPALE | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA                                          |
| 52  | 1803030001            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA      | CUCHUMBAYA                 | 397388       | 43051                              | EL PEDREGAL                        | PRIMARIA                                                               |
| 53  | 1803030006            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA      | SACUAYA                    | 397355       | FRANCISCO BOLDIGNESI               | CALLE TACNA S/N                    | PRIMARIA, SECUNDARIA                                                   |
| 54  | 1803030014            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA      | SOQUEZANI                  | 397411       | 43037                              | CALLE MOQUEGUA S/N                 | PRIMARIA                                                               |
| 55  | 1803030016            | MOQUEGUA     | MARISCAL NIETO        | CUCHUMBAYA      | YOJO                       | 397449       | 43040 JOSE CARLOS MARIATEGUI       | YOJO                               | PRIMARIA                                                               |





| NRO | DATOS DE LA LOCALIDAD |               |                       |               |                       | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                             |                                |                      |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|     | CODINEE 2015          | DEPARTAMEN TO | PROVINCIA             | DISTRITO      | LOCALIDAD             | CODIGO LOCAL            | NOMBRE                      | DIRECCIÓN                      | MÓDULOS              |
| 56  | 180101003             | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | MOQUEGUA      | ESTUQUEIRA            | 106954                  | 43002 CESAR VIZCARRA VARGAS | CARRETERA ESTUQUEIRA           | PRIMARIA             |
| 57  | 180105001             | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | CALACCA               | 355331                  | CESAR VALLEJO               | CALLE NUEVA S/N                | PRIMARIA             |
| 58  | 180105001             | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | CALACCA               | 357642                  | CESAR VALLEJO               | CALLE AREQUIPA S/N             | SECUNDARIA           |
| 59  | 1801050079            | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL         | 791656                  | CESAR VIZCARRA VARGAS       | CALLE FRANCISCO BOLDIGNESI S/N | PRIMARIA, SECUNDARIA |
| 60  | 180303002             | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | EUCHUMBAYA    | QUEBAYA               | 307406                  | 43036                       | CARRETERA QUEBAYA              | Primaria             |
| 61  | 1801040005            | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | SAMEGUA       | BUENA VISTA           | 307524                  | 43137                       | CARRETERA BINACIONAL KM. 9     | Primaria             |
| 62  | 1801060045            | MOQUEGUA      | MARISCAL NIETO        | TORATA        | QUEJE                 | 307779                  | 43004                       | QUEJE                          | Primaria             |
| 63  | 180203002             | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE      | PALCAMAYO             | 390255                  | 43053                       | PALCAMAYO                      | Primaria             |
| 64  | 1802030008            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE      | EL ESTANQUE           | 108298                  | 43070                       | EL ESTANQUE                    | Primaria             |
| 65  | 1802030014            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE      | SAN JOSE DE RONJADERO | 398264                  | 43061                       | RONJADERO                      | Inicial, Primaria    |
| 66  | 1802050014            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA    | CHALLAHUAYO           | 532150                  | 43063                       | CHALLAHUAYO                    | Primaria             |
| 67  | 1802080013            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUGUINA       | ORLAQUE               | 308957                  | 43140                       | ORLAQUE                        | Primaria             |
| 68  | 1802080022            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUGUINA       | SEGUNDA               | 309009                  | 43067                       | SEGUNDA                        | Primaria             |
| 69  | 1802080038            | MOQUEGUA      | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUGUINA       | POCDHUAYO             | 389028                  | 43069                       | POCDHUAYO                      | Primaria             |

PROCOM  
 Gerente General





REGION TACNA

1. Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS OBLIGATORIAS

| Nro | Cod/INEC0015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | NUMERO DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|--------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |              |              |           |                     |                               | LOCALES ESCOLARES                             | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 1   | 2301010008   | TACNA        | TACNA     | TACNA               | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO)  | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.220800 | -18.081100 | 338               |
| 2   | 2301030010   | TACNA        | TACNA     | CALANA              | SANTA RITA                    | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.200400 | -17.980500 | 754               |
| 3   | 2301030011   | TACNA        | TACNA     | CALANA              | PIEDRA BLANCA                 | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.187200 | -17.965400 | 818               |
| 4   | 2301030013   | TACNA        | TACNA     | CALANA              | CERRO BLANCO                  | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.189300 | -17.981800 | 768               |
| 5   | 2301050001   | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                   | 2                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.495000 | -17.795000 | 515               |
| 6   | 2301050016   | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | NUÉVO TOMASURI                | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.535400 | -17.843000 | 460               |
| 7   | 2301050019   | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | PROTER SAMA                   | 1                                             | 0                         | 0                       | ESTUDIO DE CAMPO   | -70.533790 | -17.831830 | 451               |
| 8   | 2301060001   | TACNA        | TACNA     | PACHA               | PACHA                         | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.154700 | -17.896800 | 1,098             |
| 9   | 2301060010   | TACNA        | TACNA     | PACHA               | CAJENTES                      | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.123900 | -17.863600 | 1,283             |
| 10  | 2301060011   | TACNA        | TACNA     | PACHA               | MICULLA                       | 2                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.132600 | -17.877300 | 1,239             |
| 11  | 2301070001   | TACNA        | TACNA     | PALCA               | PALCA                         | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -69.959000 | -17.776900 | 2,939             |
| 12  | 2301070002   | TACNA        | TACNA     | PALCA               | EL INGENIO                    | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -69.928416 | -17.768436 | 3,300             |
| 13  | 2301090002   | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BUENA VISTA                   | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.540300 | -17.844300 | 431               |
| 14  | 2301090015   | TACNA        | TACNA     | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRALO)     | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.880900 | -17.994900 | 33                |
| 15  | 2301090020   | TACNA        | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                     | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.724900 | -18.115700 | 22                |
| 16  | 2301090023   | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO                  | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.675100 | -18.158600 | 16                |
| 17  | 2301110001   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.498600 | -18.285900 | 25                |
| 18  | 2301110002   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUÉVO COPARE)      | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.430500 | -18.124000 | 134               |
| 19  | 2301110003   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4                | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.465900 | -18.148300 | 100               |
| 20  | 2301110004   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.457500 | -18.166300 | 96                |
| 21  | 2301110005   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.427300 | -18.183700 | 109               |
| 22  | 2301110006   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 2                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.465800 | -18.178600 | 85                |
| 23  | 2301110008   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | PUÉBLO LIBRE                  | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.504300 | -18.175400 | 61                |
| 24  | 2301110010   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 2                | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.326300 | -18.189700 | 45                |
| 25  | 2301110018   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.511300 | -18.208100 | 40                |
| 26  | 2301110093   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LAS LAGUNAS                   | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.409200 | -18.286600 | 54                |
| 27  | 2301110095   | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                    | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.393900 | -18.335800 | 17                |
| 28  | 2302010052   | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | MULLINI                       | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.109300 | -17.298500 | 1,154             |





| Nro | Codigo 2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO           | LOCALIDAD             | NUMERO DE INSTITUCIONES ABOONADAS OBLIGATORIAS |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|-------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |             |              |               |                    |                       | LOCALES ESCOLARES                              | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 29  | 2302010054  | TACNA        | CANDARAVE     | CANDARAVE          | JIRATA                | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.207100 | -17.356500 | 2,955             |
| 30  | 2302030001  | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA           | ALTO CAMILACA         | 2                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.387800 | -17.243000 | 3,849             |
| 31  | 2302030018  | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA           | CONAGUAYA             | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.425300 | -17.278900 | 3,444             |
| 32  | 2302030021  | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA           | CAMBAYA               | 2                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.431800 | -17.322600 | 2,589             |
| 33  | 2302030026  | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA           | NUOVA CAMILACA        | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.384300 | -17.281500 | 3,608             |
| 34  | 2303010021  | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA            | ALTO CAMIARA          | 1                                              | 0                         | 2                       | MED-GPS            | -70.900500 | -17.648900 | 576               |
| 35  | 2303010024  | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA            | PUNTE CAMIARA         | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.841600 | -17.662300 | 420               |
| 36  | 2303010028  | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA            | PAMPA SITANA          | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.855600 | -17.578600 | 823               |
| 37  | 2303020001  | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA            | ILABAYA               | 2                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.512800 | -17.420700 | 1,383             |
| 38  | 2303020007  | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA            | BOROGUERA             | 2                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.459600 | -17.314800 | 2,811             |
| 39  | 2303020029  | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA            | MIRAVE                | 2                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.548000 | -17.479400 | 1,091             |
| 40  | 2303030002  | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE                | VILLA MILITAR EL EDEN | 2                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.843100 | -17.703800 | 438               |
| 41  | 2303030016  | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE                | PAMPA BAJA            | 2                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.972900 | -17.885300 | 45                |
| 42  | 2303030018  | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE                | LAS VILLAS            | 2                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.977400 | -17.859900 | 188               |
| 43  | 2304010079  | TACNA        | TARATA        | TARATA             | LIMUTE                | 1                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.038000 | -17.450800 | 3,036             |
| 44  | 2304020001  | TACNA        | TARATA        | HERODES ALBARRACIN | CHUCATAMANI           | 1                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.122600 | -17.480300 | 2,337             |
| 45  | 2304030001  | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE            | ESTIQUE               | 4                                              | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.010500 | -17.541900 | 3,153             |
| 46  | 2304030005  | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE            | TALARAYA              | 1                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -69.987300 | -17.551500 | 1,430             |
| 47  | 2304040001  | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA      | ESTIQUE PAMPA         | 1                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.033700 | -17.558000 | 3,073             |
| 48  | 2304050001  | TACNA        | TARATA        | SITAJARA           | SITAJARA              | 1                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.137900 | -17.379400 | 3,162             |
| 49  | 2304060001  | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA           | SUSAPAYA              | 1                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.132700 | -17.353200 | 3,407             |
| 50  | 2304060045  | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA           | YABICO                | 1                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.137600 | -17.346300 | 3,304             |
| 51  | 2304070001  | TACNA        | TARATA        | TARUCACHI          | TARUCACHI             | 1                                              | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.028900 | -17.526200 | 3,075             |
| 52  | 2304080001  | TACNA        | TARATA        | TICACO             | TICACO                | 1                                              | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.047200 | -17.444500 | 3,305             |





## 2. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

### 2.1. Establecimientos de Salud Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |                     |                               | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |                           |           |                                       |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
|     | CodiNER2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | COD. UNICO MINSA                   | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION                             |
| 1   | 2301050001            | TACNA        | TACNA         | INCLAN              | SAMA GRANDE                   | 00002914                           | INCLAN                    | I-2       | CALLE ALTO BAYO S/N                   |
| 2   | 2301060001            | TACNA        | TACNA         | PACHA               | PACHA                         | 00002915                           | PACHA                     | I-2       | CALLE ANAS BRAGUZZ S/N                |
| 3   | 2301070001            | TACNA        | TACNA         | PALCA               | PALCA                         | 00002897                           | PALCA                     | I-2       | CALLE PALCA S/N CARRETERA TACNA-COLPA |
| 4   | 2301090120            | TACNA        | TACNA         | SAMA                | VILA VILA                     | 00002903                           | VILA VILA                 | I-2       | OTROS CAJETA VILA VILA                |
| 5   | 2301090023            | TACNA        | TACNA         | SAMA                | BOCA DEL RIO                  | 00002902                           | BOCA DEL RIO              | I-2       | AVENIDA GRAU S/N BOCA DEL RIO         |
| 6   | 2301110001            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 00002908                           | LOS PALOS                 | I-2       | OTROS CPM LOS PALOS S/N               |
| 7   | 2301110004            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 00002904                           | 28 DE AGOSTO              | I-3       | OTROS VIA CONSTANERA TACNA-LO KM20    |
| 8   | 2301110005            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 00002905                           | 5 Y 6 LA YARADA           | I-3       | OTROS ASENTAMIENTO 5 Y 6 LA YARADA    |
| 9   | 2301110018            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 00002906                           | LOS OLIVOS                | I-1       | COOPERATIVA AGRARIA LOS OLIVOS S/N    |
| 10  | 2301110055            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                    | 00002907                           | SANTA ROSA                | I-1       | OTROS BALNEARIO SANTA ROSA            |
| 11  | 2302030001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                 | 00002873                           | CAMILACA                  | I-2       | AVENIDA TACNA S/N                     |
| 12  | 2302030021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMBAYA             | CAMBAYA                       | 00002912                           | CAMBAYA                   | I-1       | AVENIDA JESUS MARIA S/N               |
| 13  | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | ILABAYA                       | 00002909                           | ILABAYA                   | I-2       | CALLE GRAL IGESIAS S/N                |
| 14  | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | BORUGUEÑA                     | 00002910                           | BORUGUEÑA                 | I-1       | AVENIDA TACNA S/N                     |
| 15  | 2303020029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | MIRAVE                        | 00002911                           | MIRAVE                    | I-1       | CALLE ARICA S/N                       |
| 16  | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | PAMPA BAJA                    | 00002903                           | PAMPA BAJA                | I-2       | CALLE PRINCIPAL PAMPA BAJA            |
| 17  | 2304020001            | TACNA        | TARATA        | HERNANDESBARRACIN   | CHUCATAMANI                   | 00002925                           | CHUCATAMANI               | I-2       | CALLE 39 DE SEPTIEMBRE S/N            |
| 18  | 2304030005            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE             | TALABAYA                      | 00002927                           | TALABAYA                  | I-3       | CALLE CALVARIO S/N                    |
| 19  | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA       | ESTIQUE PAMPA                 | 00002928                           | ESTIQUE PAMPA             | I-2       | CALLE TACNA S/N                       |
| 20  | 2304050001            | TACNA        | TARATA        | SITAJARA            | SITAJARA                      | 00002929                           | SITAJARA                  | I-4       | AVENIDA GRAU S/N                      |
| 21  | 2304060001            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA            | SUSAPAYA                      | 00002930                           | SUSAPAYA                  | I-2       | CALLE TACNA S/N                       |
| 22  | 2304060045            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA            | YABROCO                       | 00002931                           | YABROCO                   | I-1       | CALLE TACNA S/N CPM YABROCO           |
| 23  | 2304070001            | TACNA        | TARATA        | TARUCACHI           | TARUCACHI                     | 00002933                           | TARUCACHI                 | I-2       | CALLE GRAU S/N                        |
| 24  | 2304080001            | TACNA        | TARATA        | TICACO              | TICACO                        | 00002934                           | TICACO                    | I-2       | CALLE A B LEGUIA S/N                  |





## 2.2. Dependencias Policiales Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |               |               | DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL |                                       |                                    |                                                                 |                               |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | CodINEI 2015          | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO      | LOCALIDAD     | CODIGO                           | NOMBRE                                | DIRECCIÓN                          | REFERENCIA                                                      | DIRETPOI                      |
| 1   | 2301050001            | TACNA        | TACNA         | INCLAN        | SAMA GRANDE   | 0875                             | CPNP SAMA INCLAN                      | Avenida LAS VILCAS # SN            | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL                                     | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 2   | 2301060001            | TACNA        | TACNA         | PACHA         | PACHA         | 0876                             | CPNP PACHA                            | Avenida DOMINGO ARIAS ARAGUEZ # SN | FRENTE A LA LE. JUAN MARIA RELAS                                | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 3   | 2301090021            | TACNA        | TACNA         | SAMA          | BOCA DEL RIO  | 0870                             | CPNP BOCA DEL RIO                     | SECTOR BOCA DEL RIO                | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL COSTADO DE LA POSTA MEDICA          | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 4   | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA       | ALTO CAMIARA  | 0882                             | CPNP ESPECIAL CAMIARA                 | Carretera PANAMERICANA SUR # SN    | AL COSTADO DE LA COMISARIA PNP PROTECCION DE CARRETERAS CAMIARA | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 5   | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA       | ALTO CAMIARA  | 1175                             | CPNP PROT. DE CARRETERAS CAMIARA      | Carretera PANAMERICANA SUR # SN    | CRUCE CON CARRETERA A TOQUEPALA                                 | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 6   | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA       | ILABAYA       | 0889                             | CPNP RURAL ILABAYA                    | Carretera SALIDA CHAYAY # SN       | AL COSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL                               | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 7   | 2303030026            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE           | PAMPA BAJA    | 1374                             | CPNP PROT. DE CARRETERAS BOCA DEL RIO | Carretera COSTANERA SUR # SN       | AL COSTADO DEL MUSEO DE ITE                                     | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 8   | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA | ESTIQUE PAMPA | 0893                             | CPNP ESTIQUE PAMPA                    | Carretera TACNA TARATA # SN        | COSTADO DE CONTROL SENASA                                       | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 9   | 2304050001            | TACNA        | TARATA        | SITAJARA      | SITAJARA      | 0893                             | CPNP RURAL SITAJARA                   | Calle MIGUEL GRAU # SN             | A UN COSTADO DEL PUESTO DE SALUD                                | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 10  | 2304060001            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA      | SUSAPAYA      | 0874                             | CPNP RURAL SUSAPAYA                   | Calle BOLOGNESI # SN               | A MEDA CUADRA ARRIBA DE LA PLAZA PRINCIPAL                      | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |
| 11  | 2304080001            | TACNA        | TARATA        | TICACO        | TICACO        | 0895                             | CPNP TICACO                           | Carretera TARATA CAMARAVE # SN     | A UNA CUADRA DE LA LE. TICACO                                   | XXI DIRETPOI TACNA - MOQUEGUA |

## 2.3. Locales Escolares Obligatorios

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |           |          |                              | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                                      |                                 |                      |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|     | CodINEI 2015          | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD                    | CODIGO LOCAL            | NOMBRE                               | DIRECCIÓN                       | MÓDULOS              |
| 1   | 2301010008            | TACNA        | TACNA     | TACNA    | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO) | 80987                   | 364                                  | CARRERA COSTANERA LATERAL 4 S/N | INICIAL              |
| 2   | 2301050030            | TACNA        | TACNA     | CALANA   | SANTA RITA                   | 487732                  | 377                                  | SANTA RITA                      | INICIAL              |
| 3   | 2301050011            | TACNA        | TACNA     | CALANA   | PIEDRA BLANCA                | 487727                  | 326                                  | CARRERA PIEDRA BLANCA Y M 9     | INICIAL              |
| 4   | 2301090013            | TACNA        | TACNA     | CALANA   | CERRO BLANCO                 | 487713                  | 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | CERRO BLANCO                    | INICIAL              |
| 5   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | INCLAN   | SAMA GRANDE                  | 487888                  | 354 VIRGEN MARIA                     | AVENIDA RAYO ALTO S/N           | INICIAL              |
| 6   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | INCLAN   | SAMA GRANDE                  | 487911                  | 42017 JOSE JOAQUIN INCLAN            | AVENIDA PRINCIPAL S/N           | PRIMARIA, SECUNDARIA |
| 7   | 2301050056            | TACNA        | TACNA     | INCLAN   | NUOVO TOMASINI               | 487874                  | 329                                  | CARRERA PANAMERICANA NORTE      | INICIAL              |





| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |            |                     |                               | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                                      |                                          |                               |
|-----|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA  | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | CÓDIGO LOCAL            | NOMBRE                               | DIRECCIÓN                                | MÓDULOS                       |
| 8   | 2301090019            | TACNA        | TACNA      | INCLAN              | PROYEC SAMA                   | 843214                  | 443 SANTA TERESITA                   | CARRETERA PANAMERICANA NORTE             | INICIAL, PRIMARIA             |
| 9   | 2301060001            | TACNA        | TACNA      | PACHA               | PACHA                         | 487990                  | 534 VIRGINITA DE LOURDES             | AVENIDA JUSTO ARIAS ARAGUEZ S/N          | INICIAL                       |
| 10  | 2301060010            | TACNA        | TACNA      | PACHA               | CALIENTES                     | 488005                  | 47060 ORNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | AVENIDA PRINCIPAL                        | PRIMARIA                      |
| 11  | 2301080011            | TACNA        | TACNA      | PACHA               | MICULLA                       | 487922                  | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE        | CARRETERA MICULLA                        | PRIMARIA                      |
| 12  | 2301060011            | TACNA        | TACNA      | PACHA               | MICULLA                       | 489072                  | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN           | MICULLA                                  | BASICA ALTERNATIVA AVANZADO   |
| 13  | 2301070001            | TACNA        | TACNA      | PALCA               | PALCA                         | 488157                  | 42063 JOSE MARIA ARGUETAS ALTAMBRADO | TACNA LA FAZ                             | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 14  | 2301070062            | TACNA        | TACNA      | PALCA               | EL INGENIO                    | 889827                  | 43507                                | ALTO INGENIO                             | PRIMARIA                      |
| 15  | 2301090002            | TACNA        | TACNA      | SAMA                | BUENA VISTA                   | 488448                  | 300                                  | CARRETERA SAMA - LAS YARIAS              | INICIAL                       |
| 16  | 2301090015            | TACNA        | TACNA      | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)      | 108579                  | 41259                                | CARRETERA COSTANERA - PUERTO GRAU        | INICIAL, PRIMARIA             |
| 17  | 2301090020            | TACNA        | TACNA      | SAMA                | VILA VILA                     | 488425                  | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA              | CALETA DE VILA VILA                      | INICIAL                       |
| 18  | 2301090020            | TACNA        | TACNA      | SAMA                | VILA VILA                     | 488473                  | 42207 SAN PEDRO                      | AVENIDA WENCESLAO ACHINGA S/N            | PRIMARIA                      |
| 19  | 2301090023            | TACNA        | TACNA      | SAMA                | BOCA DEL RIO                  | 489468                  | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | AVENIDA LUIS BANCHERO BOSSI S/N          | INICIAL, PRIMARIA             |
| 20  | 2301110001            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 486087                  | 354                                  | LOS PALOS                                | INICIAL                       |
| 21  | 2301110001            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 486662                  | 42044 ALFONSO UGARTE                 | LOS PALOS                                | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 22  | 2301110001            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUEVO COPARE)      | 808813                  | 42281 NUEVO COPARE                   | CARRETERA COSTANERA                      | PRIMARIA                      |
| 23  | 2301110001            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4                | 486528                  | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR       | ASENTAMIENTO 4                           | INICIAL, PRIMARIA             |
| 24  | 2301110004            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 486006                  | 233                                  | 28 DE AGOSTO                             | INICIAL                       |
| 25  | 2301110004            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 2 (28 DE AGOSTO) | 486881                  | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | ASENTAMIENTO NRO 2                       | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 26  | 2301110005            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 486073                  | 340 DIVINO NIÑO JESUS                | 5 Y 6 LA YARADA                          | INICIAL                       |
| 27  | 2301110005            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 486513                  | 42214 ALFONSO EXZAGUIRRE TARA        | 5 Y 6                                    | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 28  | 2301110006            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 486105                  | 356                                  | 60                                       | INICIAL                       |
| 29  | 2301110006            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 486484                  | 42065 ROMULO BOLLARTE PONCE DE LEON  | LA YARADA                                | PRIMARIA                      |
| 30  | 2301110008            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | PUEBLO LIBRE                  | 808672                  | 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR | CARRETERA COSTANERA - PUEBLO LIBRE KM 25 | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA |
| 31  | 2301110010            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 2                | 486493                  | 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | LA ESPERANZA                             | PRIMARIA                      |
| 32  | 2301110018            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 486025                  | 304                                  | LOS OLIVOS                               | INICIAL                       |
| 33  | 2301110018            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 486450                  | 42017 NELSER G. LOACSA ARCE          | CARRETERA COOPERATIVA LOS OLIVOS S/N     | PRIMARIA                      |
| 34  | 2301110033            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | LAS LAGUNAS                   | 486233                  | 407                                  | 26 DE OCTUBRE                            | INICIAL                       |
| 35  | 2301110055            | TACNA        | TACNA      | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                    | 808827                  | 42263 VIRGINIA LAZARO VILLARUEL      | HECHO DE FRONTERA CON CHILE              | INICIAL, PRIMARIA             |
| 36  | 2301010052            | TACNA        | GRONDARAVE | CANDARAVE           | MULLINI                       | 488642                  | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN      | MULLINI                                  | PRIMARIA                      |
| 37  | 2302010054            | TACNA        | CANDARAVE  | CANDARAVE           | PIRATA                        | 488996                  | 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUAR           | CALLE TACNA S/N                          | PRIMARIA                      |



| Nro. | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |                   |                       | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                                                        |                                            |                               |
|------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|      | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO          | LOCALIDAD             | CÓDIGO LOCAL            | NOMBRE                                                 | DIRECCIÓN                                  | MÓDULOS                       |
| 38   | 2302830001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | ALTO CAMILACA         | 488378                  | 326                                                    | ALTO CAMILACA                              | INICIAL                       |
| 39   | 2302830001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | ALTO CAMILACA         | 210788                  | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI                           | CALLE PRINCIPAL S/N                        | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 40   | 2302830018            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | CORAGUAYA             | 488316                  | 42031 DANIEL ALDOES CARRION                            | CORAGUAYA                                  | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 41   | 2302830021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | CAMBAYA               | 489375                  | 345                                                    | CALLE MIRAFLORES S/N                       | INICIAL                       |
| 42   | 2302830021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | CAMBAYA               | 489284                  | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                              | ILABAYA                                    | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 43   | 2302830026            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA          | NUEVA CAMILACA        | 812806                  | 430 VIRGEN DEL CARMEN                                  | YARAMA                                     | INICIAL                       |
| 44   | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | ALTO CAMIARA          | 777576                  | 42233                                                  | CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N           | PRIMARIA                      |
| 45   | 2303010024            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PUENTE CAMIARA        | 489062                  | 403 PUENTE CAMIARA                                     | CARRETERA PUENTE CAMIARA                   | INICIAL                       |
| 46   | 2303010028            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PAMPA SITANA          | 810703                  | 432 SITANA                                             | CARRETERA ALTO CAMIARA - TDOQUEPALA KM 8.5 | INICIAL                       |
| 47   | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA               | 489142                  | 311                                                    | CALLE NUEVA S/N                            | INICIAL                       |
| 48   | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA               | 489298                  | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                 | CALLE ARICA S/N                            | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 49   | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUEÑA             | 489161                  | 347                                                    | BOROGUEÑA                                  | INICIAL                       |
| 50   | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUEÑA             | 489279                  | TUPAC AMARU II                                         | AVENIDA TUPAC AMARU S/N                    | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 51   | 2303030029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | MIRAVE                | 489256                  | 325 JESUS MI SALVADOR                                  | CALLE ARICA MZ O- LOTE 05                  | INICIAL                       |
| 52   | 2303030029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | MIRAVE                | 489260                  | 42028 MARISCAL GUILERMO MILLER                         | AVENIDA MILLER S/N                         | PRIMARIA, SECUNDARIA          |
| 53   | 2303030032            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN | 489397                  | 521 CORONEL RAMON ZAVILA IJALIZ                        | CALLE LOS CLAVES S/N                       | INICIAL                       |
| 54   | 2303030032            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN | 489463                  | MARISCAL CACERES IRA BRIGADA BLINDADA DEL FUERTE ARICA | CARRETERA PANAMERICA SUR S/N               | TECNICO PRODUCTIVA            |
| 55   | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA            | 489415                  | 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                | CARRETERA VIA COSTANERA PAMPA BAJA         | INICIAL                       |
| 56   | 2303030018            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA            | 489439                  | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE                         | CARRETERA CRUCE COSTANERA - ITE            | PRIMARIA                      |
| 57   | 2303030018            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS            | 801005                  | 42054 CTÁ JOSE CARLOS MARIATEGUI                       | AVENIDA LAS VILCAS PARTE ALTA S/N          | SECUNDARIA                    |
| 58   | 2303030018            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS            | 810222                  | 428 LAS VILCAS - ITE                                   | CARRETERA COSTANERA - ITE                  | INICIAL                       |
| 59   | 2304010079            | TACNA        | TARATA        | TARATA            | UMUITE                | 489651                  | RAMON COPAJA                                           | CARRETERA TARATA -TACNA KM 02              | SUPERIOR TECNOLÓGICA          |
| 60   | 2304020001            | TACNA        | TARATA        | HEROES ALBARRACIN | CHOCATAMANI           | 489689                  | 42086 HEROES ALBARRACIN                                | CALLE 1 DE SEPTIEMBRE 338                  | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA |
| 61   | 2304030001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | ESTIQUE               | N.D.                    | ESTRELLITAS (PRONDEI)                                  | ESTIQUE PUEBLO (LOCAL DE USO MULTIPLES)    | INICIAL (PRONDEI)             |
| 62   | 2304030005            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | TARABAYA              | 489731                  | 42125 JOSE MANUEL UBALDE                               | IRON CALVARIO S/N                          | PRIMARIA                      |
| 63   | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA     | ESTIQUE PAMPA         | 810590                  | 339 ESTIQUE PAMPA                                      | CALLE ESTIQUE PAMPA S/N                    | INICIAL                       |
| 64   | 2304050001            | TACNA        | TARATA        | SITAJARA          | SITAJARA              | 489778                  | 319                                                    | CALLE SAN MARTIN S/N                       | INICIAL                       |
| 65   | 2304060001            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | SUSAPAYA              | 810547                  | 42096 MATEO PUMACARUA                                  | CALLE TACNA S/N                            | SECUNDARIA                    |
| 66   | 2304060045            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | YABROCO               | 489806                  | 332 YABROCO                                            | CALLE TACNA S/N                            | INICIAL                       |



| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |           |           |           | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                               |                          |         |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
|     | CodINEI2005           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO  | LOCALIDAD | CÓDIGO LOCAL            | NOMBRE                        | DIRECCIÓN                | MÓDULOS |
| 67  | 2304070001            | TACNA        | TARATA    | TARUCACHI | TARUCACHI | 489849                  | 310 TARUCACHI                 | CALLE 1 DE SETIEMBRE S/N | INICIAL |
| 68  | 2304080001            | TACNA        | TARATA    | TICACO    | TICACO    | 489868                  | 116 VICTORIA GARCIA BONIFATTI | CALLE LEGUIA 51          | INICIAL |

  
 JUNTO ASESORADO OSIVO TACNA  
 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y  
 DESARROLLO SOCIAL



**ANEXO Nº 2 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
PROPUESTA TÉCNICA**



002487

**ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO Y  
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE  
EL CONTRATADO**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**ORCOM**  
Jaime Alberto Cosío Mesa  
Gerente General

002489

**ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
PROPUESTA ECONÓMICA**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**GROCOM**  
Jairo Alderico Cossio Mesa  
Gerente General



**ANEXO N° 5 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
GARANTÍA DE ADELANTO Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**UROCUM**  
Jaime Alberto Cossio Mesa  
Gerente General



**ANEXO N° 6 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**ORCOM**  
Alonso Dosid Mesa  
Gerente General



000070  
002693

**ANEXO N° 7 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**OROCOM**  
Jairo Alberto Cossio Mesa  
Gerente General



000176  
002764

**ANEXO N° 8 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
CIRCULARES**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**OROCOM**  
César Cossó Mesa  
Gerente General



**ANEXO Nº 9 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA DISPONIBILIDAD**

Para la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones del PROYECTO ADJUDICADO y en los casos en los cuales la interrupción del servicio se deba a falta de fluido eléctrico, se podrá tomar en consideración lo siguiente:

**Localidades con energía eléctrica convencional:**

En este caso EL CONTRATADO deberá procurar contar con un medidor independiente con la finalidad que la operatividad de los equipos no dependa de la acción de terceros.

En dicho supuesto, de existir un corte del fluido eléctrico, luego de terminado el tiempo de autonomía del sistema de respaldo eléctrico indicado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la interrupción no será contabilizada hasta la reposición de la energía eléctrica convencional.

Para acreditar un corte energía eléctrica bastará con presentar un reporte de alarma del sistema de gestión y monitoreo de la red implementada. En caso de que el sistema de gestión y monitoreo no permita distinguir tipos de alarmas, EL CONTRATADO deberá presentar constancias de acreditación firmadas por el concesionario de energía eléctrica o alguna autoridad, personal del centro educativo, de salud o policial, siempre que sean de la localidad, indicando la hora y fecha de inicio y fin del corte.

En los casos en los cuales los cortes de energía sean constantes y en intervalos de tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema de respaldo eléctrico, disminuyendo el tiempo de autonomía del sistema, el tiempo de la interrupción no será considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen se debe a corte de energía eléctrica.

En aquellos casos en los cuales la energía eléctrica es proporcionada por un poblador, municipio, o cualquier tercero distinto al concesionario de energía, EL CONTRATADO asume la responsabilidad del corte de energía por causas distintas a las señaladas precedentemente.

**Localidades sin energía eléctrica convencional:**

EL CONTRATADO de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS propondrá en su PROPUESTA TÉCNICA el diseño del sistema de energía que permita garantizar la disponibilidad de los servicios de acuerdo a lo requerido por las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En casos de existir un corte del servicio dentro del tiempo de autonomía del sistema eléctrico, la interrupción será contabilizada dentro del periodo de disponibilidad de los servicios.

Para acreditar un corte en el sistema de energía implementado por EL CONTRATADO, no atribuible a este último, se deberá presentar constancias de acreditación firmadas por la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA o alguna autoridad de la localidad, personal del centro educativo, de salud o policial indicando la hora y fecha de inicio y fin del corte.

En algunos casos en los cuales los cortes de energía sean constantes y en intervalos de tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema eléctrico, disminuyendo el tiempo de autonomía del sistema, el tiempo de la interrupción no será considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen se debe a una carga inadecuada de las baterías.

En los casos en los cuales la interrupción del servicio se deba a factores climatológicos, se tomarán en cuenta los siguientes puntos:

Si el corte de energía se debe a la incidencia solar en los equipos de transmisión, la interrupción no será contabilizada siempre que se acredite la ocurrencia de este evento con la presentación de un informe o documento de un organismo especializado público o privado (previamente aprobado por el FITEL), indicando la anomalía de la radiación solar y los efectos que esto produce.

Si el corte se debe a la ausencia de luz solar que no permite la carga de las baterías a través de paneles solares, la interrupción no será contabilizada siempre que se presente un documento de un organismo especializado o la declaración jurada de alguna autoridad de la localidad o distrito, dando fe de la ausencia de luz solar.

#### Horario de disponibilidad del Servicio.

Dentro del horario en los cuales la PROPUESTA TÉCNICA no la haya considerado disponible los equipos no se contabilizarán ninguna interrupción.

Para determinar el tiempo de interrupción total, se sumarán todos los cortes de servicio superiores a un tercio de la disponibilidad calculada para cada día.



000079  
002999

**ANEXO N° 10 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
FORMATO DE COSTOS DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO Y LA RED DE  
TRANSPORTE**



Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la ejecución de los Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Moquegua y Tacna

**OROCOM**  
Orcom S.A.  
Jairo Alvarado  
Gerente General



**ANEXO N° 11 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO DE INSTITUCIONES ABONADAS  
OBLIGATORIAS, LOCALIDADES BENEFICIARIAS Y NODOS DE LA RED DE  
ACCESO**

1. Los cambios de LOCALIDAD BENEFICIARIA, INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA y PUNTO DE PRESENCIA (POP), incluyendo el Nodo correspondiente, podrán realizarse en los siguientes casos durante el PERIODO DE INVERSIÓN:

- 1.1. Cuando exista divergencias en la jurisdicción o nombre o ubigeo o coordenadas geográficas u otras referidas a la LOCALIDAD BENEFICIARIA o INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA según corresponda.
- 1.2. La LOCALIDAD BENEFICIARIA carece de población e Instituciones Públicas de modo que se afecte la sostenibilidad del servicio en dicha LOCALIDAD BENEFICIARIA durante el PERIODO DE OPERACIÓN.
- 1.3. La INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA cuenta con el servicio de acceso a Internet y el representante de la Institución Pública que asumirá el pago del servicio, o a quien se haya delegado las facultades correspondientes, manifieste al CONTRATADO que no desea contratar el servicio.
- 1.4. Por alguna razón de orden técnico o por impedimento de la población o autoridades locales, entre otras, no se pueda instalar el POP que proveerá el servicio a la LOCALIDAD BENEFICIARIA.

En este caso, de realizarse el cambio de LOCALIDAD BENEFICIARIA, se modificarán todas las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS ubicadas en dicha localidad. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que toda referencia a cambio de ubicación del POP incluye el cambio de ubicación del Nodo correspondiente.

- 1.5. La LOCALIDAD BENEFICIARIA cuente con MSAN, DSLAM, armario, URA u otro tipo de punto de presencia con acceso distinto al satelital que permita la contratación del acceso a Internet.

En este caso, el FITEL se reserva el derecho de evaluar si la prestación del servicio ofrecido es similar o superior a los servicios que se prestarían a través de la RED DE ACCESO, en cuyo caso, procederá el cambio de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS asociadas a ésta; siendo el FITEL quien determine la LOCALIDAD BENEFICIARIA e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de reemplazo.

- 1.6. Por alguna razón que se enmarque en la normativa aplicable a caso fortuito o de fuerza mayor no se pueda instalar un POP, se procederá al cambio de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS asociadas a ésta.

- 1.7. En todos los casos precedentes, el CONTRATADO deberá presentar la documentación que acredite los cambios propuestos. El FITEL evaluará y determinará si dichos cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO el resultado de su evaluación.

2. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de reemplazo podrán ser propuestos por el CONTRATADO y se dará preferencia de acuerdo a las siguientes consideraciones:
  - 2.1. Los reemplazos de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS se darán preferentemente dentro de la misma LOCALIDAD BENEFICIARIA.
  - 2.2. Las instituciones educativas (entendida para estos efectos como locales escolares de gestión pública) sólo podrán ser reemplazadas por otra institución educativa. En este caso, EL CONTRATADO podrá solicitar al FITEL el reemplazo por otra institución educativa ubicada en otra LOCALIDAD BENEFICIARIA. Excepcionalmente, el FITEL podrá aprobar el reemplazo de una institución educativa por un establecimiento de salud, dependencia policial u otra Institución Pública ubicada en la misma LOCALIDAD BENEFICIARIA, cuando se compruebe que técnicamente no sea factible atender otro centro educativo ubicado en otra LOCALIDAD BENEFICIARIA.
  - 2.3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS distintas a las instituciones educativas podrán ser reemplazadas por dependencias policiales, establecimientos de salud, municipalidades u otra Institución Pública, en la misma o diferente localidad.
  - 2.4. En todos los casos del presente numeral, el FITEL evaluará y determinará si dichos cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO su decisión.
3. De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 precedente, para el caso que sea necesario reemplazar una LOCALIDAD BENEFICIARIA, el CONTRATADO o el FITEL podrá sugerir los nuevos reemplazos, siendo el FITEL quien aprobará la procedencia o no de dicho cambio, teniendo en consideración lo establecido en el estudio de pre inversión del PROYECTO. Similar procedimiento se realizará cuando se requiera realizar el cambio de ubicación de un POP.
4. Los cambios de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS durante todo el PERIODO DE OPERACIÓN deberán realizarse de manera gratuita hasta por un máximo de cinco por ciento (5%) del total de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, cuando el representante de la institución que asumirá el pago de los servicios o a quien se haya delegado las facultades correspondientes lo requiera, siempre que este cambio se realice dentro de la cobertura del servicio, la cual será como mínimo una LOCALIDAD BENEFICIARIA.
5. Los cambios de LOCALIDADES BENEFICIARIAS (y consecuentemente de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS) durante todo el PERIODO DE OPERACIÓN deberán realizarse de manera gratuita hasta por un máximo de dos por ciento (2%) del total de LOCALIDADES BENEFICIARIAS cuando el FITEL lo requiera.
6. En ningún caso EL CONTRATADO podrá exigir al FITEL financiamiento adicional por el reemplazo de alguna INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA o de alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA o POP.

**ANEXO N° 12 DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO  
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA  
LAS REDES DE ACCESO Y TRANSPORTE**

**A. Penalidades por incumplimiento de entrega de información durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO**

| Tema                                                        | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plazo máximo de presentación |       | Referencia para contabilizar plazos          | Penalidades (Expresadas en UIT)                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costeo desagregado                                          | Presentar el costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONÓMICA para la implementación de la RED DE ACCESO (Véase Apéndice N° 23 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO).                                                                                                                                      | 10                           | DÍAS  | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 02                                                                                       |
| Designación de equipo de trabajo                            | EL CONTRATADO deberá designar los equipos de trabajo para el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.                                                                                                                                                                                                                             | 10                           | DÍAS  | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 02<br>(Cada vez que hubiera un cambio en el equipo de trabajo y no se hubiese informado) |
| CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO    | Presentar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, en formato impreso y en formato electrónico (elaborado en software de gestión de proyectos coordinado con FITEL), reemplaza al Cronograma Preliminar de implementación de la RED DE ACCESO, presentado en la LICITACIÓN como parte de la PROPUESTA TÉCNICA. | 30                           | DÍAS  | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 05                                                                                       |
| Capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL | Presentar el contenido detallado (nombre del curso y horas a dictarse por cada ítem o materia del mismo)                                                                                                                                                                                                                           | 4                            | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 03                                                                                       |
| Formatos de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO         | Presentar los formatos de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO que utilizará para la instalación de Nodos, NOC, Centros de Mantenimiento y en las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS.                                                                                                                                          | 5                            | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 05                                                                                       |
| Propuesta Técnica Actualizada                               | Memoria descriptiva de torres y dimensionamiento de las soluciones de energía, networking, climatización, link Budget, seguridad física para los Nodos y NOC.                                                                                                                                                                      | 6                            | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE | 10                                                                                       |

| Tema                              | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plazo máximo de presentación |       | Referencia para contabilizar plazos                                                                                                                                                                      | Penalidades (Expresadas en UIT) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                   | Listado definitivo de marca y modelos del equipamiento a utilizar en la RED DE ACCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |       |                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| ESTUDIOS DE CAMPO                 | Presentar una copia de los ESTUDIOS DE CAMPO en formato impreso y electrónico. El CONTRATADO deberá remitir en formato físico, así como la base de datos digital de la información recopilada para cada lugar en la que se recopiló información (total de campos del acta), las fotografías y las rutas de acceso en formato .kmz. El contenido mínimo de información a recopilar durante los ESTUDIOS DE CAMPO se señala en el Apéndice N° 10. El CONTRATADO debe informar mensualmente los avances que obtenga de las visitas que realice en el marco de la elaboración del ESTUDIO DE CAMPO, hasta completarla. | 3 a 8                        | meses | Períodicamente Entregas mensuales. Primera entrega hasta finalizar el tercer mes y fecha para presentar la parte final, al culminar el octavo mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE. | 10 (Cada vez)                   |
|                                   | Presentar la propuesta detallada del programa de actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                            | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                             | 05                              |
| CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES       | Presentar la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, referida a las actividades de CAPACITACIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                           | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                             | 05                              |
| Formatos para contratar servicios | Presentar la Propuesta de los formatos finales para contratar los servicios de acceso a Internet e Intranet (véanse los Apéndices N° 5-A y 5-B de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                           | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                             | 05                              |
| Programa de Mantenimiento         | Presentar la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento.<br><br>Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la oportunidad en que el CONTRATADO las realizará, además de los procesos y procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                           | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE                                                                                                                                                             | 05                              |

| Tema                                                      | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plazo máximo de presentación |       | Referencia para contabilizar plazos                                 | Penalidades (Expresadas en UIT) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                           | que el segura para efectuar los tipos de mantenimiento. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las actividades serán realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de Mantenimiento debe incluir la forma de acreditar la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo). Recursos y logística (personal, repuestos y equipos)                                                                                                                           |                              |       |                                                                     |                                 |
| Centros de Mantenimiento y Centros de Atención a Usuarios | Presentar el documento que detalle la implementación de los centros de mantenimiento, el cual debe contener como mínimo:<br>El listado definitivo de los centros de mantenimiento, precisando su ubicación exacta, localidad, distrito, provincia y coordenadas geográficas WGS84 (en grados con cinco decimales). Así como también los tiempos de acceso, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice N° 16: "Formato término de la distancia" de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO. | 12                           | meses | Desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE                        | 05                              |
| ESTUDIOS DE INGENIERÍA                                    | Presentar los ESTUDIOS DE INGENIERÍA que condujeron al diseño final de la RED DE ACCESO; deben ser entregados en documento físico y archivos electrónicos (en versión de software coordinada con FITEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                            | Mes   | Desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO | 10                              |
| ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO                  | Correspondiente a los Nodos, NOC y Centros de Mantenimiento, hasta la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN. Incluye: Fotografías y el inventario, en documento físico (impreso), escaneado en pdf y archivo electrónico (digital) con la información tabulada extraída de todos los campos de las actas.                                                                                                                                                                                        | 0                            | meses | Fecha de culminación de la ETAPA DA INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO | 05                              |
|                                                           | Correspondiente a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, incluye: Fotografías y el inventario, en documento físico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | Mes   | Desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO | 05                              |

| Tema                                                | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plazo máximo de presentación |       | Referencia para contabilizar plazos                                                                                | Penalidades (Expresadas en UIT) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |                                                                                                                    |                                 |
|                                                     | (impreso), escaneado en pdf y archivo electrónico (digital) con la información tabulada extraída de todos los campos de las actas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |                                                                                                                    |                                 |
| PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES | Presentar su propuesta de PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                            | meses | Desde la FECHA DE CIERRE                                                                                           | 05                              |
| Garantía de Calidad                                 | Presentar una Garantía de Calidad suscrita por él o por el fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento instalados, hasta por lo menos haber culminado el primer año del PERÍODO DE OPERACIÓN.                                                                                                                                                                                                                           | 0                            | meses | Hasta la fecha de suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. | 10                              |
| Contact Center                                      | El CONTRATADO deberá implementar durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, un Contact Center, con un número telefónico gratuito y al menos seis (06) líneas de atención, destinadas a recibir reclamos, brindar asistencia, orientación y operaciones comerciales, que tendrá por lo menos un operador telefónico que hable además del idioma español, una segunda lengua, la más hablada en la Región. Asimismo, el CONTRATADO incluirá una cuenta de correo electrónico con respuesta automática de código de avería. | 0                            | meses | Hasta finalizar el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO                                                        | 10                              |
| Entrega del Terminal de Acceso al NMS               | El CONTRATADO deberá entregar al FITEL un terminal de acceso a dicho sistema de monitoreo, que tendrá las siguientes características como mínimo<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Core i7 de séptima generación, 3.4 GHz de frecuencia base.</li> <li>• Memoria RAM DDR 32 GB</li> <li>• Disco Duro 2 TB</li> <li>• Monitor 21" LCD</li> <li>• Tres (03) puertos USB v3.0</li> <li>• Un (01) puerto HDMI</li> <li>• Periféricos (mouse, teclado)</li> <li>• Sistema operativo</li> </ul>                     | 20                           | DÍAS  | Desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO                                                | 05                              |



003006

| Tema                                                      | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                 | Plazo máximo de presentación |      | Referencia para contabilizar plazos                                 | Penalidades (Expresadas en UIT) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                           | Windows última versión con licencia perpetua<br>• MS Office última versión con licencia perpetua.<br>• Antivirus con licencia por 2 años                                                              |                              |      |                                                                     |                                 |
| Instalar y entregar los acceso al Servidor espejo del NMS | El CONTRATADO deberá poner a disposición exclusiva del FITEL un servidor, que estará instalado dentro de las instalaciones del CONTRATADO. Incluye una dirección pública y enlace para administración | 20                           | DÍAS | Desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACIÓN de la RED DE ACCESO | 05                              |

**B. Penalidades por incumplimiento de entrega de información durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE**

| Tema                                                         | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plazo máximo de presentación contado a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato |       | Penalidades (expresadas en UIT) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Equipo de trabajo                                            | Presentar equipo de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                                             | DÍAS  | 02                              |
| Cronograma definitivo de actividades de la red de transporte | Presentar un informe detallado, impreso y en digital; debe de estar adjunto el archivo en formato *.mpp, conteniendo como mínimo lo siguiente:<br><br>i. La Fecha de inicio y finalización de las actividades correspondientes a la instalación de la RED DE TRANSPORTE, así como recursos demandados.<br>ii. Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones, así como los contemplados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE. | 1                                                                                              | MES   | 05                              |
| Costeo desagregado                                           | Presentar el costeo desagregado que dio lugar a la propuesta económica, incluyendo el margen de ganancia, los impuestos y gastos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                             | DÍAS  | 05                              |
| ESTUDIOS DE CAMPO                                            | Reporte en formato KMZ o KML indicando trazado proyectado del recorrido de cable de fibra óptica y ubicación de postes y torres incluyendo fotografías, así como en formato CAD o SHP el trazado, número de postes o torres y simbología de los elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                              | MESES | 10                              |
|                                                              | Metodología de búsqueda de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                              | MESES | 02                              |



| Tema                                              | Obligación incumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plazo máximo de presentación contado a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato |       | Penalidades (expresadas en UIT) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                   | terrenos y reporte mensual del estado de avance de búsqueda de terrenos por localidad. Este reporte será actualizado periódicamente cada mes.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |       | (Cada vez)                      |
| Estudios y cálculos para cable de fibra óptica    | Memoria de estudios y cálculos de campos eléctricos (Potencial Eléctrico Espacial y Gradiente de Potencial Eléctrico),<br>Memoria de estudio y cálculo de cargas mecánicas conteniendo las tablas de flechas y tensiones<br>Especificaciones técnicas del cable de fibra óptica propuesta en base a los estudios de campos eléctricos y cargas mecánicas. | 2                                                                                              | MESES | 05                              |
| Site Acquisition                                  | Metodología del site acquisition y reporte del estado de adquisición y registros de terrenos. Este reporte será actualizado periódicamente cada mes.                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              | MESES | 02<br>(Cada vez)                |
| Remisión al FITEL de órdenes de compra (parte 1)  | Fibra óptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Postes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Cajas de empalmes y ferretería (retención, suspensión, crucetas, amortiguadores)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Gabinetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Patch panel y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                              | MESES | 05                              |
| Dimensionamiento                                  | Requisitos y cálculos de dimensionamiento de los elementos como networking, climatización, grupo electrógeno, banco de baterías, tabieros, cables eléctricos, cámaras, sensores, tanto en cantidad como en capacidad según corresponda.                                                                                                                   | 4                                                                                              | MESES | 05                              |
| PROPUESTA TÉCNICA GENERAL                         | Contenido mínimo de acuerdo a lo indicado en el apéndice N° 3 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                              | MESES | 20                              |
| PROPUESTA TÉCNICA DEFINITIVA                      | Contenido mínimo de acuerdo a lo indicado en el apéndice N° 3 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                              | MESES | 20                              |
| Planos y estudios para construcción de obra civil | Planos (civil, arquitectónico, eléctrico, saneamiento) y estudio de suelo y de resistividad por cada NODO específico, NOC y CENTRO DE MANTENIMIENTO.<br>Este reporte será actualizado periódicamente cada mes.                                                                                                                                            | 8                                                                                              | MESES | 10                              |
| Remisión al FITEL de órdenes de compra (parte 2)  | Climatización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Grupo Electrógeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Baterías y controlador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Sensores y controlador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Cámaras y NVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                              | MESES | 05                              |
|                                                   | Servidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                             | MESES | 05                              |
|                                                   | Switches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                             | MESES | 05                              |
| Routers                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MESES                                                                                          | 05    |                                 |

| Tema                                         | Obligación incumplida                                                                                                                    | Plazo máximo de presentación contado a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato |         | Penalidades (expresadas en UIT) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                |         |                                 |
| Resultados de pruebas en fibra               | Pruebas en carretes                                                                                                                      | 5                                                                                              | MESES   | 05                              |
|                                              | Pruebas del tendido                                                                                                                      | 12                                                                                             | MESES   | 05                              |
|                                              | Pruebas de post conexión                                                                                                                 | 14                                                                                             | MESES   | 05                              |
| Reportes                                     | - Reportes semanales de avance de acuerdo a formato<br>- Actualizaciones al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE | Periódico                                                                                      | semanal | 02 (Cada vez)                   |
| Remisión de registro de actas de instalación | Actas de instalación por cada infraestructura, incluyendo reporte fotográfico, inventarios de componentes y planos y diagramas           | 15                                                                                             | MESES   | 10                              |
| EXPEDIENTE TÉCNICO                           | Contenido mínimo de acuerdo a lo indicado en el apéndice N° 3 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE TRANSPORTE                   | 16                                                                                             | MESES   | 20                              |
| Solicitud de información                     | Presentar información solicitada a criterio del FITEL y dentro del plazo que se estipule.                                                | 5 a 15                                                                                         | DÍAS    | 02                              |

**C. Penalidades por incumplimiento de entrega de información durante el PERÍODO DE OPERACIÓN**

| Tema                                                                   | Obligación                                                                                                                                                                                                                           | Plazo máximo de presentación |      | Referencia para contabilizar plazos                                                                                              | Penalidades (Expresadas en UIT)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Entrega de Reportes                                                    | Presentación Mensual de reportes indicados en el numeral 7.7.11 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO                                                                                                                 | 15                           | DÍAS | Durante el PERÍODO DE OPERACIÓN, a partir del primer mes de iniciado este y hasta la finalización del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO | 05 (Cada mes)                                                                         |
| Equipos de trabajo                                                     | El CONTRATADO deberá conformar equipos de trabajo para el PERÍODO DE OPERACIÓN                                                                                                                                                       | 10                           | DÍAS | Desde el inicio del PERÍODO DE OPERACIÓN                                                                                         | 02 (cada vez que hubiera un cambio en el equipo de trabajo y no se hubiese informado) |
| Actas de ejecución de la Capacitación para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA | Presentar las Actas de Ejecución de la CAPACITACIÓN - LOCALIDAD BENEFICIARIA (Apéndice N° 13-A de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO), de manera progresiva hasta culminar el 100%, así como los exámenes requeridos. | 30                           | DÍAS | Desde finalizado el primer año del PERÍODO DE OPERACIÓN                                                                          | 05                                                                                    |



| Tema                                                                  | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                            | Plazo máximo de presentación |      | Referencia para contabilizar plazos                                              | Penalidades (Expresadas en UIT) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Actas de ejecución de la Capacitación para cada capitales de distrito | Presentar las Actas de Ejecución de la CAPACITACIÓN - Capitales de distrito representativas de cada provincia (Apéndice N° 13-B de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO), de manera progresiva hasta culminar el 100%, así como los exámenes requeridos. | 30                           | DÍAS | Desde finalizado el segundo año del PERIODO DE OPERACIÓN                         | 06                              |
| Informe Parcial y Final de CAPACITACIÓN                               | Para fines de aceptación de la CAPACITACIÓN por parte del FTEL, el CONTRATADO deberá remitir un Informe Parcial de la CAPACITACIÓN semestral al final de la misma, así como un Informe Final al término del año de CAPACITACIÓN.                                      | 30                           | DÍAS | Después de la fecha de entrega de la última Acta de Ejecución de la CAPACITACIÓN | 05                              |



ORCOM  
ALBERTO CORCO  
2018

08 ENE 2024

Tacna,

OFICIO N° 039 -2024-GRA/GOB.REG.TACNA

SEÑOR:

ARTURO ALEJANDRO ZEA MANRIQUE

Gerente Regional de Control I


Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República

Calle Los Álamos N° 1976 – 1978 - Tacna

Ciudad.-

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN REQUERIDA RESPECTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL, PARA DOTAR DE SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO A INTRANET EN 52 LOCALIDADES BENEFICIARIAS, ATENDIENDO EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
"INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO DE LA REGIÓN TACNA" CUI 2258787

REFERENCIA : a) Informe N° 417-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA  
b) Oficio N° 2115-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA  
c) Oficio N° 001519-2023-CG/GRTA  
d) Oficio N° 001439-2023-CG/GRTA



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia c) y d), pongo en su conocimiento la información remitida por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social respecto al servicio que brinda la empresa OROCOM S.A.C. para el Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna" a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones Pronatel, para dotar de servicio de internet y acceso a intranet en 52 localidades beneficiarias, atendiendo el requerimiento efectuado, se informa lo siguiente:

**Respecto al punto 1:** Informar las acciones adoptadas por el Gobierno Regional de Tacna respecto a la falta de energía eléctrica de la Institución Educativa N° 326 ubicada en la localidad de Alto Camilaca, distrito de Camilaca, provincia de Candarave

Mediante Informe N° 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA, la Especialista de Infraestructura de la Dirección Regional de Educación –DRET, informa que realizó trámites administrativos para conectividad de energía eléctrica.

**Respecto al punto 2:** Informar respecto a la evaluación anual del período 2022 sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto, en atención al punto 5.2.5 del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna, suscrito el 01 de octubre de 2015

La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social mediante Oficio N° 2115-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA ha informado que de las 68 instituciones educativas donde se viene brindando el servicio de internet e intranet por la empresa OROCOM SAC, las instituciones educativas de Tarata y Candarave reportan fallas en el servicio como: inestabilidad del internet, señal baja e incluso reportan no contar con servicio de energía eléctrica; y de los 24 Centros de Salud, 10 de ellos han reportado observaciones como: inestabilidad, puestos de salud no habilitados y falta de reubicación de antenas.

**Respecto al punto 3:** Informar estado situacional del período 2023 sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto

Se informa que con Oficio N° 5236-2023-D-DRET/GOB.REG.TACNA y Oficio N° 2685-2023-OA-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA, los Directores Regionales de Educación y Salud de Tacna remiten

estado situacional del servicio de internet e intranet en los establecimientos contemplados en el contrato.

**Respecto al punto 4: Informar estado situacional del período 2023 sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto**

Al respecto se absuelve el mismo con la información que se detalla en el punto 3.

**Respecto al punto 5: Remita una copia de los comprobantes de pago generados por la cancelación del servicio de internet en las instituciones abonadas obligatorias – Año 2022 – 2023**

Se remite captura de pantalla del SIAF – GRT, que evidencia el estado del trámite de pago del servicio prestado por la empresa OROCOM SAC, el mismo que al 29.12.2023 se encuentra en fase DEVENGADO.

**Respecto al punto 6: Informar respecto a la falta de pago al contratista OROCOM SAC, por el lapso de 6 meses aproximadamente, en los que las instituciones abonadas no contaron con servicio de internet.**

Al respecto se tiene a la fecha, que de acuerdo a la captura de pantalla del SIAF-GRT, el trámite de pago del servicio se encuentra en la etapa de devengado, por lo que aún no se ha realizado el pago en su totalidad, considerando que a la fecha se ha tomado conocimiento que las instituciones educativas de Tarata y Candarave reportan falla del servicio, asimismo de algunos establecimientos de la Red de Salud, por lo que esta gerencia ha remitido mediante Oficio N° 038-2024-GRA/GOB.REG.TACNA a la Gerencia Regional de Desarrollo Social que se realice conjuntamente con la Dirección Regional de Educación y la Red de Salud la verificación in situ de la prestación del servicio correspondiente.

Asimismo, se ha tomado conocimiento que mediante Oficio N° 2275-2023-MTC/24.09 el Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones PRONATEL solicita al gerente general de la empresa OROCOM SAC evaluar y subsanar las observaciones de la supervisión en campo del segundo semestre del período de operación de acceso de los proyectos "Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna"; así también mediante el Oficio N° 2352-2023-MTC/24.09, el Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones PRONATEL cursa documento a la gerencia general de la empresa OROCOM SAC con el cual indica los resultados de los descargos presentados por OROCOM SAC, por lo que la Dirección de Ingeniería y Operaciones mediante Informe N° 5327-2023-MTC/24.09 indica que las observaciones presentadas fueron subsanadas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



CFC. ELIZABETH ZULEMA OSO MAMANI  
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Adjunto:  
Documento de la referencia (      folios)  
C.c.: Archivo  
EZOM/smca

CUD N° 11 005504



DRET  
DIRECCIÓN REGIONAL  
DE EDUCACIÓN TACNA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"  
"Decenio de Oportunidades Para Mujeres y Homores"  
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOC

**RECIBIDO**  
19 SEP 2023  
Registro: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_

Calana, 18 SEP 2023

OFICIO N° 4041 -2023-OAD-D-DRET/GRT

Sr. JULIO AGUILAR VILCA  
GERENTE REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL GRT.  
PRESENTE.

11221235  
19 SEP 2023

ASUNTO : REMITO INFORME SOLICITADO  
REF. : M/C N° 103-2023-GRDIS/GRT R- 5423

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, donde solicita informar sobre la conformidad del servicio de Acceso a Internet e Intranet de la Empresa OROCOM S.A.C. y continuar con el trámite correspondiente.

Al respecto le anexo el INFORME N° 242-2023-UI-OAD-DRET/GRT de la Unidad de Informática, donde informa que para efectuar el pago correspondiente, la Empresa OROCOM debe adjuntar las Actas de instalación de las instituciones educativas beneficiadas, y corresponde a su representada abonar el servicio, ya que el contrato fue suscrito por su entidad y asignaron un presupuesto para tal fin.

Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROF. ALDO R. ESPINOZA RODRIGUEZ  
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE TACNA

# PROVEIDO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

BASEA: G.R.A


- |                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines       | <input type="checkbox"/> Projectar Resolución        |
| <input type="checkbox"/> Trámite con dependiente    | <input checked="" type="checkbox"/> Projectar Oficio |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación      | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta          |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                | <input type="checkbox"/> Informar                    |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad | <input type="checkbox"/> Archivar                    |

Fecha: 19 SEP 2023

V°B°



**INFORME N° 242-2023-UI-OAD-DRET/GOB.REG.TACNA**



**PARA :** CPC. LOURDES ROXANA JUÁREZ CONDORI  
**JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

**DE :** ING. GROVER DUEÑAS ARROYO  
**JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**ASUNTO :** SOBRE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET E INTRANET DE  
**LA EMPRESA OROCOM S.A.C.**

**REFERENCIA:** MEMORANDO N° 540-2023-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA  
INFORME N° 195-2023-UP-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA  
MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 103-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA

**FECHA :** TACNA 04 DE SETIEMBRE DEL 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES:**

- I. MEMO N° 540 -2023-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA.
- II. INFORME N°195-2023-UP-DGI-DRET/GOB.REG.TACNA

**2. ANÁLISIS**

- I. Que, según documento recibido memo N° 540-2023-dgi-dret/gob.reg.tacna, pide informar sobre el servicio de internet e intranet de la empresa Orocom, dicho servicio de acuerdo a lo proyectado, ya está en actividad en las 33 instituciones educativas que tiene a cargo la Dret.
- II. Corresponde al Gobierno Regional de Tacna abonar el servicio, puesto que el contrato fue suscrito por ellos.
- III. Al tener ya asignado un presupuesto, se recomienda que, al momento de abonar el pago correspondiente en el primer mes, se pida como requisito al proveedor (Orocom), adjuntar las Actas de instalación de cada Institución Educativa, para proceder con el trámite.

**3. CONCLUSIÓN**

- I. Por lo expuesto anteriormente se concluye que, para efectuar el pago correspondiente, la empresa (Orocom) adjunte las Actas instalación de las IIEE para efectuar su pago.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA  
CERTIFICO: que esta copia es exactamente igual  
al documento original con el que confronté.

Tacna,

11 SEP 2023

HILDA SARA MRYTA CALDERON  
FEDATARIA

#### 4. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda remitir el presente Documento al Gobierno Regional de Tacna para continuar con el Trámite correspondiente.

Es todo cuanto debo informar a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA  
**ING. CROVER DUENAS ARROYO**  
JEFE DE UNIDAD DE INFORMÁTICA  
DRET

Adj. memorando n° 540-2023-dgi-dret/gob.reg.tacna  
Informe n° 195-2023-up-dgi-dret/gob.reg.tacna  
Memorandum circular n° 103-2023-grdis/gob.reg.tacna  
UTI/GDA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA  
Oficina de Administración  
SECRETARÍA  
17 AGO 2023  
Firma: ..... Hora: 3.12

MEMORANDUM CIRCULAR N° 103 -2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA

A : Mgr. MIGUEL ÁNGEL FLORES CÉSPEDES.  
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA.

Lic. JANET MARTHA RIVERA CHIRINOS.  
DIRECTORA REGIONAL DE SALUD TACNA.

DE : C.P.C. YOVANA MANDAMIENTO NINA.  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

ASUNTO : INFORMAR CONFORMIDAD Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE  
CORRESPONDIENTE.

REFERENCIA : OFICIO N°2077-2023-GRA/GOB.REG.TACNA.

FECHA : Tacna, 16 AGO 2023

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
TACNA  
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
17 AGO 2023  
2023 0011188572  
RECIBIDO  
Recibido por: ..... Hora: 9:23

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez por medio de la presente, le REMITO EL OFICIO N°2077-2023-GRA/GOB.REG.TACNA, para que INFORME LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, sobre lo solicitado y de acuerdo a sus funciones, continúe el trámite correspondiente.

Sin otro en particular y de acuerdo a sus funciones proceda a dar trámite según corresponda e informe a esta Gerencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

C.P.C. YOVANA MANDAMIENTO NINA  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PROVEIDO: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA

Pase: Administración Reg. N°: .....

Conocimiento y Acciones  Trámite Correspondiente

Atención de lo Solicitado  Acciones Pertinentes

Projectar Respuesta  Informar

Projectar Resolución  Archivar

Observaciones: .....

Fecha: 17 AGO 2023 Firma: .....

ADJUNTO: - OFICIO N°2077-2023-GRA/GOB.REG.TACNA, a fojas 07.  
- OFICIO N°1799-2023-DIREC.EJEC.-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, a fojas 12.

c.c. arch.  
YMN/jvdr.

3437  
17 AGO 2023

188572

88

PROVEIDO DE: DAD / DRE: 4986  
Reg. N°

Pase: DGT / Pica puerto

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocimiento y acciones   | <input type="checkbox"/> Trámite correspondiente |
| <input type="checkbox"/> Atención de lo solicitado | <input type="checkbox"/> Acciones pertinentes    |
| <input type="checkbox"/> Proyectar respuesta       | <input checked="" type="checkbox"/> Informar     |
| <input type="checkbox"/> Proyectar Resolución      | <input type="checkbox"/> Archivar                |

Observaciones: Verificar si se contrato el servicio internet

Fecha: con OROCOM Firma: 


18 AGO. 2023



Tacna, 01 de Agosto de 2023

OFICIO N° 2077 - 2023-GRA/GOB.REG.TACNA

Señora  
C.P.C. YOVANA MANDAMIENTO NINA  
Gerente General de Desarrollo e Inclusión Social  
Presente. -



**ASUNTO : REMITO RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACCESO A INTERNET E INTRANET  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - EMPRESA: OROCOM S.A.C.**

**REFERENCIA : A) Carta PR-RAE-1318-D, de fecha 06.07.2023  
B) Informe N° 1348-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA**

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez en atención al documento de referencia A), la empresa OROCOM SAC señala que su representada viene prestando los servicios de acceso a internet e Intranet por lo que remite y adjunta el recibo N° S002-00000002, con detalle de usuarios correspondiente a diversas instituciones educativas por el importe Total de s/ 11,286.36 soles, correspondiente al mes de junio 2023; asimismo en dicha carta la empresa hace referencia al contrato de financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna", Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e intranet para instituciones Abonadas Obligatorias y Constancia de Activación del Servicio de acceso a internet e intranet

Por otro lado, en la fecha 10.07.2023, el sub gerente de abastecimiento – Lic. Adm. Fabio David Iglesias Salas, emite el informe N° 1348-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA, en el cual informa: "Sobre el particular, con oficios Nros. 646-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA, 667-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA y 672-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA, este despacho traslado ante la gerencia general de asesoría jurídica, los documentos presentados por la empresa OROCOM SAC, a su vez señalar que, la atención del tramite administrativo regular que comprende el contrato del servicio de acceso a internet del proyecto "Instalación de banda Ancha para la conectividad integral u Desarrollo Social de la Región de Tacna", no corresponde a este despacho". (subrayado agregado), el cual se adjunta copia simple como referente para indicar que el contrato de servicio no se realizo mediante la sub gerencia de abastecimiento.

Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, elevo el presente a su despacho para conocimiento y fines necesarias en vista que la empresa está solicitando el pago correspondiente al mes de junio 2023.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Adjunto:  
Documento de la referencia (06 folios)  
C.c.: Archivo  
RBVF/Irtch

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
  
LIC. ADM. REYNALDO BELARMINO VEGA FLORES  
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

1174377

SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Secretaría - D

- |                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Convocatoria                       | <input type="checkbox"/> Expedir Resolución            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite correspondiente | <input type="checkbox"/> Proyectar Oficio              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Emisión      | <input checked="" type="checkbox"/> Preparar respuesta |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                        | <input type="checkbox"/> Informar                      |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad         | <input type="checkbox"/> Archivar                      |
| <input type="checkbox"/> Evaluación y proyección            | <input type="checkbox"/> respuesta                     |

Fecha: 02 AGO 2023 V°B°





INFORME Nro. 1348 -2023 -GRA -SGABAST/GOB.REG.TACNA

A : LIC. ADM. REYNALDO BELARMINO VEGA FLORES  
Gerente Regional de Administración

ASUNTO : Sobre comunicación efectuada por la empresa OROCOM S.A.C. con relación a la suscripción de constancia de activación de servicios, en el marco de la suscripción de los contratos de abonado del proyecto: "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna".

REF. : a) Carta PR-RAE-1190-D  
b) Oficio N°1119-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA

FECHA : Tacna, 10 de julio de 2023

Por el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, a la vez para manifestarle que, en razón al documento anotado en la referencia a), en donde la (e) Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social- Abg. Olivia G. Aro Quispe traslada la petición por parte del Gerente Legal de la OROCOM S.A.C, quienes comunican sobre el inicio de la prestación de servicios de internet e Intranet de las instituciones Abonadas Obligatorias, conforme a lo establecido en los Contratos de Abonados suscritos entre la entidad y la OROCOM S.A.C el pasado 12.05.2023. Asimismo, menciona que el inicio de la facturación de la facturación de los servicios referidos se computa a partir del 15.05.2023, por lo que remitirán los recibos correspondientes.

Sobre el particular, con Oficios Nros. 646-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA, 667-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA y 672-2023-GRA-SGABAST/GOB.REG.TACNA, este despacho trasladó ante la Gerencia General de Asesoría Jurídica, los documentos presentados por la empresa OROCOM S.A.C., a su vez señalar que, la atención del trámite administrativo regular que comprende el contrato del servicio de acceso a internet del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral u Desarrollo Social de la Región de Tacna", no corresponde a este despacho.

Por lo que, agradeceré se adopten las acciones pertinentes para su atención.

Atentamente;

C.c.: Archivo

Adjunto:

-Documentos de la referencia a fojas,02  
FDIS/\*



Av. Manuel Olgüín 373 – Edificio El Qubo  
 Of 504 Santiago de Surco  
 Tel: (51 1) 631 – 2922  
 www.oro.com.pe

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 GERENCIA GENERAL  
 07 JUL 2023  
 RECIBI

CARTA PR-RAE-1318-D

Lima, 06 de julio de 2023

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 Presente. -

Atención: **LILIANA DEL CARMEN VELAZO CORNEJO**  
 Gobernadora Regional

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 OFICINA DE SECRETARÍA Y  
 ARCHIVO INSTITUCIONAL  
 1151205  
 07 JUL 2023  
 RECORRIDO  
 REGISTRO  
 13-25

- Referencia:
- a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")
  - b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias
  - c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de junio de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referirnos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.

En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de junio de 2023, ascendente al valor de S/. 11,286.36 (Once mil doscientos ochenta y seis con 36/100 Soles) con I.G.V., en formato virtual, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

Milagros Grijalba Salaverry  
 Gerente Legal

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION  
 10 JUL 2023  
 RECORRIDO  
 8:40 FIRMA

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
**PROVEIDO**

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

PAGEA: CPC. LOURDES TUBANA

INDICACIONES

- |                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocer y Fines                  | <input type="checkbox"/> Trámite Corresponsiente               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Evaluación | <input checked="" type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                         | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                    |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Archivar                              |

OBSERVACIONES:

FECHA: 10 JUL. 2023



GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DERIVADO A: GRD

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EMISOR Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONOCIMIENTO Y FINE              |
| <input type="checkbox"/>            | PREPARAR RESPUESTA               |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                          |

OBSERVACIONES:

FECHA: 07/07/23





Orocom.S.A.C  
 Ruc 20603080590  
 Av. Manuel Olgúin 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 RUC : 20519752515  
 Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
 Distrito : Tacna  
 Departamento : Tacna  
 Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación – Mes Junio 2023**

|                    |                 |                       |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 01/06              | 30/06           | 15/07                 |
| Inicio de<br>Ciclo | Fin de<br>Ciclo | Último día<br>de Pago |

**FECHA de EMISION**

05/ 07 /2023

**RECIBO**

S002-00000002

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,286.36  
 Vence 15/07/2023


**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |

|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEL                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |

|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROGUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |

### Evolutivo

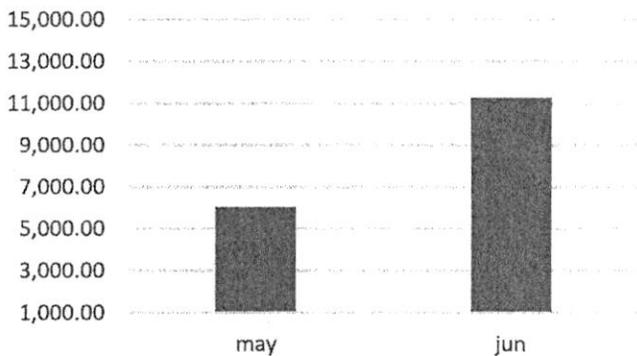

### Resumen de Facturación

|                      |            |                  |
|----------------------|------------|------------------|
| 1. Servicios         |            | 9,564.71         |
| 2. Descuentos        |            |                  |
| Sub Total            | S/.        | 9,564.71         |
| IGV                  | S/.        | 1,721.65         |
| No Gravado           | S/.        | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>S/.</b> | <b>11,286.36</b> |



Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

#### Lugares de Pago

##### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

#### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



[atenciones@orocom.pe](mailto:atenciones@orocom.pe)

#### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844

Tacna, 25 de Julio del 2023

OFICIO N° 01799 -2023-DIREC.EJEC.-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA

Señora/ita  
CPC. Yovana MANDAMIENTO NINA  
Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social  
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

11170486  
26 JUL 2023  
5257

Ciudad.-

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REF. : MEMORANDUM CIRCULAR N° 080-2023-GRDIS/G.R.T.

Me es grato dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia a través del cual requiere se le remita la lista de las personas a cargo de las instituciones abonadas obligatorias que cuentan con provisión del servicio de internet e intranet de banda ancha del proyecto; al respecto derivar el INFORME N° 0547-202-UEI-DIREC.EJEC.-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, emitido por la Jefa de la Unidad de Estadística e Informática de nuestro Nosocomio a través del cual informa sobre lo solicitado por su despacho.

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA  
MED. PAMELA DE LOS MILAGROS CÁCERES CÁCERES  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL HHUT  
CMP 37972 RNE 38968

Adj. 011 folios  
C.c.  
Archivo  
PdIMCC/ylsc

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
26 JUL 2023  
Registro: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_

REGIÓN DE TACNA  
SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

CANAL: Secretaría - D

- |                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Concordar                         | <input type="checkbox"/> Proyectar Resolución        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite de expedientes | <input checked="" type="checkbox"/> Proyectar Oficio |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Examen                 | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta          |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                       | <input type="checkbox"/> Informar                    |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad        | <input type="checkbox"/> Archivar                    |

Consolidar y  
elaborar respuesta GR

Fecha:

26 JUL 2023



**INFORME N°0547-2023-UEI-DIREC.EJEC-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA**

**A** : MÉD. PAMELA DE LOS MILAGROS CACERES CACERES  
Director Ejecutivo  
Hospital Hipólito Unanue de Tacna


**DE** : ING. LUZ MERCEDES MAMANI RAMOS  
Jefe de la Unidad de Estadística e Informática  
Hospital Hipólito Unanue de Tacna

**ASUNTO** : Datos de Contacto

**REFERENCIA** : Memorando circular N°080-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA

**FECHA** : Tacna, 25 de julio del 2023

Mediante el presente tengo a bien saludarla y a su vez brindar los datos de contacto para los proyectos que se mencionan en el documento de la referencia.



| Establecimientos de Salud            |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombres y Apellidos                  | Luz Mercedes Mamani Ramos                                    |
| Documento Nacional de Identificación | 04744357                                                     |
| Cargo                                | Jefe de la Unidad de Estadística e Informática               |
| Número de contacto                   | 995-559078                                                   |
| Correo Electrónico                   | ueit@hospitaltacna.gob.pe                                    |
| Nombre y Código del Establecimiento  | Hospital Hipólito Unanue de Tacna<br>Cod. Renipress 00002864 |

Sin otro particular es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA  
Ing. Luz Mercedes MAMANI RAMOS  
Jefe de la Unidad de Estadística, Informática y T.  
C.I.D. N° 71876

LMMR  
C.c. Archivo



**GRDIS**  
GERENCIA REGIONAL  
DE DESARROLLO  
E INCLUSIÓN SOCIAL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
HOSPITAL HIPÓLITO UNANI  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

07 JUL. 2023

TRAMITE DOCUMENTAR

REG. N°: 8207  
FIRMA: \_\_\_\_\_ HORA: 11:01

**MEMORANDUM CIRCULAR N° 080-2023-GRDIS/GOB.REG.TACNA**

**A.** : MAG.MIGUEL ANGEL FLORES CESPEDES  
**DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TACNA**  
Dr. JAVIER ANTONIO GARCÍA RONDÓN  
**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TACNA**  
ENF.JANET RIVERA CHIRINOS  
**DIRECTOR REGIONAL DE SALUD**  
LIC.ENF.CLARISA GILMA COAQUIRA CARPIO  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD DE TACNA**  
MÉD.PAMELA CACERES CACERES  
**DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA**

**DE** : ABOG. OLIVIA G. ARO QUISPE  
**GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**

**ASUNTO** : REMITA LISTA DE PERSONAS A CARGO DE LAS INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS DEL PROYECTO.

**REFERENCIA** : CARTA PR-LEG-A-308-R  
CARTA PR-LEG-A-315-R

**FECHA** : TACNA, 06 de Julio del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de saludarlos cordialmente y en atención al documento de la referencia, el Gerente Legal de la empresa OROCOM, nos reitera se remita la lista de personas a cargo de las instituciones Abonadas Obligatorias que cuentan con la provisión del servicio de internet e intranet de Banda Ancha del Proyecto, por ello se remite el presente documento de la referencia para que **remitan urgente la relación de las personas según el cuadro matriz adjunta en el documento de referencia**, establecimientos de salud con dato completos y locales escolares de gestión estatal, cumpla con la remisión de los actuados, a vuestro despacho para su atención, evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarles mis sentimientos de especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



ABOG. OLIVIA G. ARO QUISPE  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (e)

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
10 JUL. 2023  
**RECIBIDO**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

Adjunto:  
Documento de referencia (a 09 Folios).  
OGAQ/GRDIS

150972

CARTA PR-LEG-A-308-R

Lima, 15 de mayo de 2023

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**Gerencia General Regional**  
**Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social**

 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Registro: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

17 MAY 2023

 GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 OFICINA DE SECRETARIA Y  
 ARCHIVO INSTITUCIONAL

 11103978  
 16 MAY 2023

**RECIBIDO**  
 REGISTRO HORA: 8:08

Presente. -

 Atención: Sr. Luis Ramon Torres Robledo  
 Gobernador Regional de Tacna

 Con copia: Sr. Jaime Lizardo Carpio Camacho  
 Gerente General Regional

 Sr. Julio Aguilar Vilca  
 Gerente de Desarrollo e Inclusión Social

 Referencia: a) Proyecto de "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región de Tacna" ("en adelante, **Proyecto**")

 b) Contrato de servicio de acceso a internet para instituciones abonadas obligatorias y Contrato de servicio de acceso a intranet para institución abonada obligatoria ("**Contratos de abonados**").

Asunto: Solicitamos lista de personas a cargo de las Instituciones Abonadas Obligatorias

De nuestra mayor consideración:

La presente tiene por objeto saludarlo muy cordialmente, y a la vez, hacer mención al Proyecto de la referencia relacionado al Contrato de Financiamiento para la provisión del servicio de Internet e Intranet de Banda Ancha en las Instituciones Abonadas Obligatorias del Proyecto.

Sobre el particular, muy cordialmente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva a remitirnos la relación de las personas a cargo de las Instituciones Abonadas Obligatorias en el marco del Proyecto y, en consecuencia, del Contrato de Abonado.

Lo expuesto es de suma importancia a fin de agilizar las atenciones y validar la identidad de las comunicaciones que, en adelante, se cursen, por ejemplo, para efectos de la tramitación de ciertas solicitudes relacionadas al servicio de internet provisto por mi representada.

En esa línea, agradeceremos se sirvan remitirnos la siguiente matriz completada:

| Establecimientos de salud            |  |
|--------------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos                  |  |
| Documento Nacional de Identificación |  |
| Cargo                                |  |
| Número de contacto                   |  |
| Correo electrónico                   |  |
| Nombre y Código del Establecimiento  |  |

**PROVEIDO**  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PASE A: *Secretaría*

- |                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocer                            | <input type="checkbox"/> Projectar Resolución |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite correspondiente | <input type="checkbox"/> Projectar Oficio     |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación              | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta   |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                        | <input type="checkbox"/> Informar             |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad         | <input type="checkbox"/> Archivar             |

Fecha: **17 MAY 2023**



**PROVEIDO**  
GOBERNACIÓN REGIONAL

PASE A: *GRDIS*

**OBSERVACIONES**

- |                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y Fines | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente    |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación           | <input type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                        | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta         |
|                                                          | <input type="checkbox"/> Archivar                   |

FECHA: **17 MAY 2023** **V°B°**



| Locales escolares de gestión estatal |  |
|--------------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos                  |  |
| Documento Nacional de Identificación |  |
| Cargo                                |  |
| Número de contacto                   |  |
| Correo electrónico                   |  |
| Nombre y Código del Establecimiento  |  |

Asimismo, y con la finalidad de coadyuvar con las labores del proyecto, tenemos a bien comunicar nuestros canales de atención conforme al siguiente detalle:

- Centro Atención Usuarios: Urb. Quinta Hidalgo Mz. A Lt. 2
- Teléfono de atención: 0800-74073
- Correo: [atenciontacna@oroRocom.pe](mailto:atenciontacna@oroRocom.pe)

Finalmente, en caso tenga una consulta o desee contactarse con nosotros en relación con la presente carta, agradeceremos comunicarse al correo [notificaciones@oroRocom.pe](mailto:notificaciones@oroRocom.pe) y/o directamente con nuestro especialista legal, José Luis Arroyo Sánchez, al número de teléfono 935138242 con correo [jarroyo@oroRocom.pe](mailto:jarroyo@oroRocom.pe).


Sin otro particular, quedamos atentos.

Muy atentamente,



Milagros Grijalba Salaverry  
Gerente Legal





Av. Manuel Olgüín 373 – Edificio El Qubo  
 Of 504 Santiago de Surco  
 Tel: (51 1) 631 – 2922  
 www.oro.com.pe

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 GERENCIA GENERAL REGIONAL  
 RECIBIDO

CARTA PR-LEG-A-315-R

Lima, 08 de junio de 2023

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 RECIBIDO

09 JUN 2023

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 OFICINA DE SECRETARIA Y  
 ARCHIVO INSTITUCIONAL  
 1126532  
 08 JUN 2023  
 RECIBIDO  
 REGISTRO N°: HORA: 14:45  
 FIRMA:

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
 Gerencia General Regional  
 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

Registro: 14:33  
 Recibido por:

Presente. -

Atención: Sr. Luis Ramon Torres Robledo  
 Gobernador Regional de Tacna

Con copia: Sr. Jaime Lizardo Carpio Camacho  
 Gerente General Regional

Sr. Julio Aguilar Vilca  
 Gerente de Desarrollo e Inclusión Social

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
 GOBERNACIÓN REGIONAL  
 08 JUN 2023  
 RECIBIDO  
 HORA: 16:39 FIRMA:

Referencia: a) Carta PR-LEG-A-308-R (20230011103978)  
 b) Proyecto de "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región de Tacna" ("en adelante, **Proyecto**")  
 c) Contrato de servicio de acceso a internet para instituciones abonadas obligatorias y Contrato de servicio de acceso a intranet para institución abonada obligatoria ("**Contratos de abonados**").

Asunto: Reiteramos nuestra solicitud de lista de personas a cargo de las Instituciones Abonadas Obligatorias

De nuestra mayor consideración:

La presente tiene por objeto saludarlo muy cordialmente, y a la vez, hacer mención a nuestra comunicación de la referencia a) relacionada a nuestra solicitud del listado de personas a cargo de las Instituciones abonadas obligatorias que cuentan con la provisión del servicio de Internet e Intranet de Banda Ancha del Proyecto.

Sobre el particular, muy cordialmente, tenemos a bien reiterar la necesidad de que vuestro Despacho nos remita la relación de las personas a cargo de las Instituciones Abonadas Obligatorias en el marco del Proyecto, las mismas que remitimos en calidad de anexo a la presente. En esa línea, agradeceremos se sirvan remitirnos la siguiente matriz completada:

| Establecimientos de salud            |  |
|--------------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos                  |  |
| Documento Nacional de Identificación |  |
| Cargo                                |  |
| Número de contacto                   |  |
| Correo electrónico                   |  |
| Nombre y Código del Establecimiento  |  |
| Locales escolares de gestión estatal |  |
| Nombres y Apellidos                  |  |
| Documento Nacional de Identificación |  |
| Cargo                                |  |
| Número de contacto                   |  |
| Correo electrónico                   |  |
| Nombre y Código del Establecimiento  |  |



# PROVEIDO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

*Secretaría*

- |                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines               | <input type="checkbox"/> Proyectar Resolución |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite correspondiente | <input type="checkbox"/> Proyectar Oficio     |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación              | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta   |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                        | <input type="checkbox"/> Informar             |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad         | <input type="checkbox"/> Archivar             |

FECHA: 09 JUN 2023



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL  
DERIVADO A: *GRDD*

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EVALUACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE |
| <input type="checkbox"/>            | CONOCIMIENTO Y FINES                 |
| <input type="checkbox"/>            | REVISIÓN Y EVALUACIÓN                |
| <input type="checkbox"/>            | INFORMAR                             |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVAR                             |

OBSERVACIONES:

*09 JUN 2023*

FECHA:



# PROVEIDO

## GOBERNACION REGIONAL


PASE A: *GR / GRDIS*

OBSERVACIONES

- |                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y Fines | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente    |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación           | <input type="checkbox"/> Atender según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                        | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta         |
|                                                          | <input type="checkbox"/> Archivar                   |

FECHA: 09 JUN 2023

V°B°





Av. Manuel Olguín 373 – Edificio El Cubo  
Of 504 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 631 – 2922  
www.oroCom.pe


Asimismo, y con la finalidad de coadyuvar con las labores del proyecto, tenemos a bien recordar a vuestro Despacho nuestros canales de atención, los mismos que podrá observar conforme al siguiente detalle:

- Centro Atención Usuarios: Urb. Quinta Hidalgo Mz. A Lt. 2
- Teléfono de atención: 0800-74073
- Correo: [atenciontacna@oroCom.pe](mailto:atenciontacna@oroCom.pe)

Finalmente, en caso tenga una consulta o desee contactarse con nosotros en relación con la presente carta, agradeceremos comunicarse al correo [notificaciones@oroCom.pe](mailto:notificaciones@oroCom.pe) y/o directamente con nuestro especialista legal, José Luis Arroyo Sánchez, al número de teléfono 935138242 con correo [jarroyo@oroCom.pe](mailto:jarroyo@oroCom.pe).

Sin otro particular, quedamos atentos.

Muy atentamente,

  
Mitagros Grijalba Salaverri  
Gerente Legal






Av. Manuel Ojquin 373 - Edificio El Qubo.  
OF 503 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 618 - 9200  
www.orocom.pe

### ANEXO N° 01

| N° | REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD                             | CÓDIGO LOCAL | NOMBRE DEL LOCAL ESCOLAR             | TIPO DE SERVICIO (**) | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) (***) | TARIFA CONTRATADA |
|----|--------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | TACNA  | TACNA     | TACNA               | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO)          | 809087       | 364                                  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 2  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | SANTA RITA                            | 487732       | 377                                  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 3  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | PIEDRA BLANCA                         | 487727       | 376 SANTO DOMINGO SABIO              | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 4  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | CERRO BLANCO                          | 487713       | 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 5  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                           | 487888       | 354 VIRGEN MARIA                     | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 6  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                           | 487911       | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN            | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 7  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | TOMASIRI                              | 487874       | 329                                  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 8  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROTER SAMA    | 643214       | 443 SANTA TERESITA                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 9  | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | PACHIA                                | 487930       | 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 10 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | CALIENTES                             | 488005       | 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 11 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                               | 487992       | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE        | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 12 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                               | 488072       | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN           | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 13 | TACNA  | TACNA     | PALCA               | PALCA                                 | 488152       | 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 14 | TACNA  | TACNA     | PALCA               | EL INGENIO LA LIBERTAD (ALTO INGENIO) | 699927       | 43507                                | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 15 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | BUENA VISTA                           | 488449       | 380                                  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 16 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)              | 808573       | 42259                                | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 17 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                             | 488425       | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA              | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 18 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                             | 488473       | 42207 SAN PEDRO                      | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 19 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO                          | 488468       | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 20 | TACNA  | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                             | 486087       | 352                                  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 21 | TACNA  | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                             | 486662       | 42044 ALFONSO UGARTE                 | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |





Av. Manuel Olguín 373 - Edificio El Qubo.  
 OF 503 Santiago de Surco  
 Tel: (51 1) 618 - 9200  
 www.orocom.pe

|    |       |               |                     |                                                 |        |                                      |                     |         |          |
|----|-------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 22 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUEVO COPARE)                        | 808813 | 42261 NUEVO COPARE                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 23 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4                                  | 486520 | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR       | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 24 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   | 486006 | 233                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 25 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   | 486681 | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 26 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              | 486073 | 340 DIVINO NIÑO JESUS                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 27 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              | 486515 | 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA        | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 28 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         | 486105 | 356                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 29 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         | 486488 | 42065 ROMULO BOLLUARTE PONCE DE LEON | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 30 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PUEBLO LIBRE                                    | 808672 | 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 31 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 1                                  | 486493 | 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 32 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                                      | 486025 | 304                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 33 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                                      | 486450 | 42017 NEISER G. LLACSA ARCE          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 34 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASOCIACION DE CRIAMEN 26 DE OCTUBRE LAS LAGUNAS | 486233 | 407                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 35 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PESCADORES SANTA ROSA                           | 808827 | 42263 VIRGINIA LAZARO VILLARROEL     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 36 | TACNA | CANDARAVE     | CANDARAVE           | MULLINI                                         | 488642 | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN      | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 37 | TACNA | CANDARAVE     | CANDARAVE           | JIRATA                                          | 488996 | 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 38 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                                   | 488878 | 326                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 39 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                                   | 810788 | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 40 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CORAGUAYA                                       | 489316 | 42031 DANIEL ALCIDES CARRION         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 41 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                                         | 489175 | 349                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 42 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                                         | 489284 | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI            | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 43 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | NUEVA CAMILACA                                  | 810806 | 430 VIRGEN DEL CARMEN                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 44 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | ALTO CAMIARA                                    | 777576 | 42233                                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |





Av. Manuel Ojguín 373 - Edificio El Qubo.  
Of 503 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 618 - 9200  
www.orocom.pe

|    |       |                  |                      |                       |        |                                                           |                     |         |          |
|----|-------|------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 45 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | LOCUMBA              | PUENTE CAMIARA        | 489062 | 403 PUENTE CAMIARA                                        | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 46 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | LOCUMBA              | PAMPA SITANA          | 810302 | 432 SITANA                                                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 47 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ILABAYA              | ILABAYA               | 489142 | 311                                                       | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 48 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ILABAYA              | ILABAYA               | 489298 | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 49 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ILABAYA              | BOROGUENA             | 489161 | 347                                                       | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 50 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ILABAYA              | BOROGUENA             | 489279 | TUPAC AMARU II                                            | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 51 | TACNA | CANDARAVE        | QUILAHUANI           | QUILAHUANI            | 489000 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO<br>ESTRADA                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 52 | TACNA | CANDARAVE        | QUILAHUANI           | QUILAHUANI            | 559960 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO<br>ESTRADA                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 53 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | VILLA MILITAR EL EDEN | 489397 | 321 CORONEL RAMON ZAVALA<br>JUAREZ                        | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 54 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | VILLA MILITAR EL EDEN | 489463 | MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 55 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | PAMPA BAJA            | 489415 | 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 56 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | PAMPA BAJA            | 489439 | 42055 OLGA GROHMANN DE<br>BASADRE                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 57 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | LAS VILCAS            | 801005 | 42054 CTA JOSE CARLOS<br>MARIATEGUI                       | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 58 | TACNA | JORGE<br>BASADRE | ITE                  | LAS VILCAS            | 810222 | 428 LAS VILCAS - ITE                                      | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 59 | TACNA | TARATA           | TARATA               | PUEBLO LIBRE UMUTE    | 489651 | RAMON COPAJA                                              | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 60 | TACNA | TARATA           | HEROES<br>ALBARRACIN | CHUCATAMANI           | 489689 | 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 61 | TACNA | TARATA           | ESTIQUE              | ESTIQUE               | 489745 | 42205                                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 62 | TACNA | TARATA           | ESTIQUE              | TALABAYA              | 489731 | 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 63 | TACNA | TARATA           | ESTIQUE-<br>PAMPA    | ESTIQUE PAMPA         | 810590 | 339 ESTIQUE PAMPA                                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 64 | TACNA | TARATA           | SITAJARA             | SITAJARA              | 489774 | 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 65 | TACNA | TARATA           | SUSAPAYA             | SUSAPAYA              | 810547 | 42096 MATEO PUMACAHUA                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 66 | TACNA | TARATA           | SUSAPAYA             | YABROCO               | 489806 | 332 YABROCO                                               | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 67 | TACNA | TARATA           | TARUCACHI            | TARUCACHI             | 489849 | 310 TARUCACHI                                             | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 68 | TACNA | TARATA           | TICACO               | TICACO                | 489868 | 316 VICTORIA BARGIA BONIFATTI                             | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |





Av. Manuel Olgüín 373 - Edificio El Quboo.  
OF 503 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 618 - 9200  
www.orecom.pe

**OROCOM™**

**ANEXO N° 02**

| N° | REGIÓN | PROVINCIA     | DISTRITO               | LOCALIDAD                        | CÓDIGO<br>RENAES | NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO DE SALUD  | TIPO DE SERVICIO    | VELOCIDAD DE<br>TRANSMISIÓN<br>(Mbps) | TARIFA CONTRATADA |
|----|--------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | TACNA  | TACNA         | INCLAN                 | SAMA GRANDE                      | 2914             | INCLAN                                  | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 2  | TACNA  | TACNA         | PACHIA                 | PACHIA                           | 2893             | PACHIA                                  | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 3  | TACNA  | TACNA         | PALCA                  | PALCA                            | 2897             | PALCA                                   | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 4  | TACNA  | TACNA         | SAMA                   | VILA VILA                        | 2903             | VILA VILA                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 5  | TACNA  | TACNA         | SAMA                   | BOCA DEL RIO                     | 2902             | P.S CARLOS ALBERTO JARA<br>ALMONTE FLOR | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 6  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS<br>PALOS | LOS PALOS                        | 2908             | LOS PALOS                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 7  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS<br>PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE<br>AGOSTO) | 2904             | 28 DE AGOSTO                            | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 8  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS<br>PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6               | 2905             | 5 Y 6 LA YARADA                         | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 9  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS<br>PALOS | LOS OLIVOS                       | 2906             | LOS OLIVOS                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 10 | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS<br>PALOS | PESCADORES SANTA ROSA            | 2907             | SANTA ROSA                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 11 | TACNA  | CANDARAVE     | CAMILACA               | ALTO CAMILACA                    | 2873             | CAMILACA                                | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 12 | TACNA  | CANDARAVE     | CAMILACA               | CAMBAYA                          | 2912             | CAMBAYA                                 | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 13 | TACNA  | JORGE BASADRE | ILABAYA                | ILABAYA                          | 2909             | ILABAYA                                 | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 14 | TACNA  | JORGE BASADRE | ILABAYA                | BOROGUEÑA                        | 2910             | BOROGUEÑA                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 15 | TACNA  | CANDARAVE     | QUILAHUANI             | QUILAHUANI                       | 2880             | P.S QUILAHUANI                          | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 16 | TACNA  | JORGE BASADRE | ITE                    | PAMPA BAJA                       | 2901             | PAMPA BAJA                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 17 | TACNA  | TARATA        | HEROES<br>ALBARRACIN   | CHUCATAMANI                      | 2925             | CHUCATAMANI                             | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 18 | TACNA  | TARATA        | ESTIQUE                | TALABAYA                         | 2927             | TALABAYA                                | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 19 | TACNA  | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA          | ESTIQUE PAMPA                    | 2928             | ESTIQUE PAMPA                           | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |





Av. Manuel Ojguín 373 - Edificio El Qubo.  
Of 503 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 618 - 9200  
www.orocom.pe

|    |       |        |           |           |      |           |                     |        |         |
|----|-------|--------|-----------|-----------|------|-----------|---------------------|--------|---------|
| 20 | TACNA | TARATA | SITAJARA  | SITAJARA  | 2929 | SITAJARA  | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps | S/89.72 |
| 21 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA  | SUSAPAYA  | 2930 | SUSAPAYA  | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps | S/89.72 |
| 22 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA  | YABROCO   | 2931 | YABROCO   | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps | S/89.72 |
| 23 | TACNA | TARATA | TARUCACHI | TARUCACHI | 2933 | TARUCACHI | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps | S/89.72 |
| 24 | TACNA | TARATA | TICACO    | TICACO    | 2934 | TICACO    | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps | S/89.72 |



Tacna, 19 OCT. 2023

OFICIO N° 2922 -2023-GRA/GOB.REG.TACNA

SEÑOR:

ABG. JULIO AGUILAR VILCA

Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Presente. -



**ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OROCOM S.A.C**

**REFERENCIA :** a) Carta PR-LEG-352-E  
b) Carta PR-LEG-A-393-E  
c) Carta PR-LEG-A-386-E  
d) Carta PR-LEG-A-391-E


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir a su despacho los documentos de la referencia, en los cuales la empresa Orocom S.A.C. remitió los recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente a los meses de julio y setiembre de 2023, correspondiente al **PROYECTO: "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna"**.

En tal sentido, se remite a su despacho para que se proceda a otorgar la **CONFORMIDAD** al servicio prestado de Acceso a Internet e Intranet para instituciones abonadas conforme se detalla en el Anexo III del **CONTRATO DE ACCESO A INTERNET PARA INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**, asimismo se adjunta los contratos al presente en CD.

Por lo expuesto, se deriva a su despacho a fin que se pueda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



.....  
CPC. ELIZABETH ZULEMA OSCO MAMANI  
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c/Archivo

Se adjunta:

-Documentos de la referencia (17) folios + 01CD

EZOM/

11254167

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL


- ( ) Proyectar Resolución
- ( ) Proyectar Oficio
- ( ) Preparar respuesta
- ( ) Informar
- ( ) Archivar

2023





Av. Manuel Olguin 373 - Edificio El Qubo  
Of 504 Santiago de Surco



CARTA PR-LEG-352-E

Lima, 08 de septiembre de 2023

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
Presente. -

Atención: **LUIS RAMON TORRES ROBLEDO**  
Gobernador Regional

- Referencia:
- a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")
  - b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias
  - c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de julio de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referimos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.

En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo físico, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de agosto de 2023, ascendente al valor de S/. 11,251.43 (Once mil doscientos cincuenta y uno con 43/100 Soles) con I.G.V., en formato físico, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.


Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,



**Milagros Grijalba Salaverry**  
Gerente Legal  
OROCOM S.A.C.



**GOBIERNO REGIONAL TACNA**  
**PROVEIDO**  
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 PASE A. Bach. Eduardo Merquez  
 INDICACIONES  
 Conocimiento y Fines     Trámite Correspondiente  
 Revisión y Evaluación     Atender Según Normatividad  
 Informar     Preparar Respuesta  
 Archivar  
 OBSERVACIONES:  
 FECHA: 19 SEP 2023    V°B° 

**PROVEIDO**  
**GOBERNACIÓN REGIONAL**  
 PASE A. GRD  
 OBSERVACIONES  
 Conocimiento y Fines     Trámite Correspondiente  
 Revisión y Evaluación     Atender Según Normatividad  
 Informar     Preparar Respuesta  
 Archivar  
 FECHA: 18 SEP 2023    V°B° 



Orocom.S.A.C  
 Ruc 20603080590  
 Av. Manuel Olgúin 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 RUC : 20519752515  
 Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
 Distrito : Tacna  
 Departamento : Tacna  
 Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación – Mes Agosto 2023**

|                    |                 |                       |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 01/08              | 31/08           | 15/09                 |
| ●                  | ●               | ●                     |
| Inicio de<br>Ciclo | Fin de<br>Ciclo | Último día<br>de Pago |

**FECHA de EMISION**

05/09/2023

**RECIBO**

S002-00000004

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,251.43  
 Vence 15/09/2023

**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |

|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEL                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |

|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROGUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |

**Descuentos:**

Incidencia 14Ago2023  
68 Instituciones Educativas  
24 Centros de Salud

- S/ 24.36

Incidencia 27Ago2023


TA\_A\_4004\_CS01  
TA\_A\_4004\_IE02  
TA\_A\_4004\_IE01  
TA\_A\_4019\_IE01  
TA\_A\_4030\_CS01  
TA\_A\_4030\_IE01  
TA\_A\_4030\_IE02  
TA\_A\_4031\_CS01  
TA\_A\_4031\_IE01  
TA\_A\_4032\_IE01  
TA\_A\_4033\_IE01  
TA\_A\_4066\_IE01  
TA\_A\_4066\_IE02  
TA\_A\_4034\_IE01  
TA\_A\_4034\_IE02  
TA\_A\_4035\_CS01  
TA\_A\_4035\_IE01  
TA\_A\_4035\_IE02  
TA\_A\_4037\_IE01  
TA\_A\_4039\_CS01  
TA\_A\_4039\_IE01  
TA\_A\_4039\_IE02  
TA\_A\_4062\_CS01  
TA\_A\_4062\_IE01  
TA\_A\_4067\_IE01  
TA\_A\_4068\_IE01

- S/ 5.24



Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

### Evolutivo

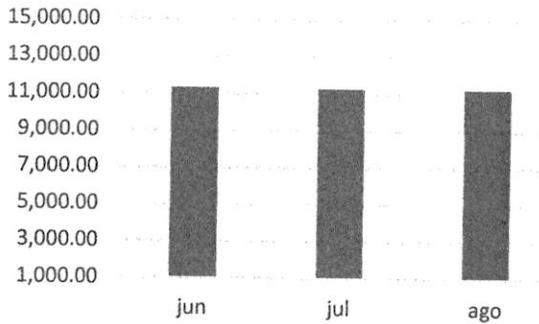

### Resumen de Facturación

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Servicios             |     | 9,564.71         |
| 2. Descuentos            |     | -29.60           |
| Sub Total                | S/. | 9,535.11         |
| IGV                      | S/. | 1,716.32         |
| No Gravado               | S/. | 0.00             |
| <b>Total a Pagar S/.</b> |     | <b>11,251.43</b> |

### Lugares de Pago

#### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



atenciones@oro.com.pe

### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844



Av. Manuel Olguin 373 – Edificio El Qubo  
Of 504 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 631 – 2922  
www.oro.com.pe



CARTA PR-LEG-A-393-E

Lima, 06 de octubre de 2023

Señores:  
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
Presente. -



Atención: LUIS RAMON TORRES ROBLEDO  
Gobernador Regional

- Referencia: a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")
- b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias
- c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de septiembre de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referimos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.

En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de septiembre de 2023, ascendente al valor de S/. 11,246.99 (Once mil doscientos cuarenta y seis con 99/100 Soles) con I.G.V., en formato virtual, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

  
Milagros Grijalba Salaverry  
Gerente Legal



**GOBIERNO REGIONAL TACNA**  
**PROVEIDO**  
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 PASE A. Bach. Eduardo Marquez  
 INDICACIONES  
 Conocimiento y Fines  
 Revisión y Evaluación  
 Informar  
 Trámite Correspondiente  
 Atender Según Normatividad  
 Preparar Respuesta  
 Archivar  
 OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 FECHA: 10 OCT 2023 V°B° 

**PROVEIDO**  
**GOBERNACION REGIONAL**  
 PASE A. GRA  
 OBSERVACIONES  
 Conocimiento y Fines  
 Revisión y Evaluación  
 Informar  
 Trámite Correspondiente  
 Atender Según Normatividad  
 Preparar Respuesta  
 Archivar  
 FECHA: 09 OCT 2023 V°B° 



Orocom.S.A.C  
 Ruc 20603080590  
 Av. Manuel Olgúin 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 RUC : 20519752515  
 Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
 Distrito : Tacna  
 Departamento : Tacna  
 Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación–Mes Setiembre'23**

|                    |                 |                       |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 01/09              | 30/09           | 15/10                 |
| ●                  | ●               | ●                     |
| Inicio de<br>Ciclo | Fin de<br>Ciclo | Último día<br>de Pago |

**FECHA de EMISION**

05/10/2023

**RECIBO**

S002-00000005

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,246.99  
 Vence 15/10/2023

**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |

|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEL                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |

|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROGUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |


**Descuentos:**

|                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Incidencia 22Sep2023<br>TA_A_4068_IE01                                                                                                                               | - S/ 9.62  |
| Incidencia 26Sep2023<br>TA_A_4034_CS01<br>TA_A_4034_IE01<br>TA_A_4034_IE02                                                                                           | - S/ 2.43  |
| Incidencia 28Sep2023<br>TA_A_4044_IE01<br>TA_A_4046_IE01<br>TA_A_4005_CS01<br>TA_A_4005_IE01<br>TA_A_4005_IE02                                                       | - S/ 14.70 |
| Incidencia 29Sep2023<br>TA_A_4044_IE01<br>TA_A_4050_CS01<br>TA_A_4050_IE01<br>TA_A_4050_IE02<br>TA_A_4045_CS01<br>TA_A_4045_IE01<br>TA_A_4045_IE02<br>TA_A_4069_IE01 | - S/ 6.35  |
| Incidencia 30Sep2023<br>TA_A_4068_IE01                                                                                                                               | - S/ 0.28  |



Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

### Evolutivo

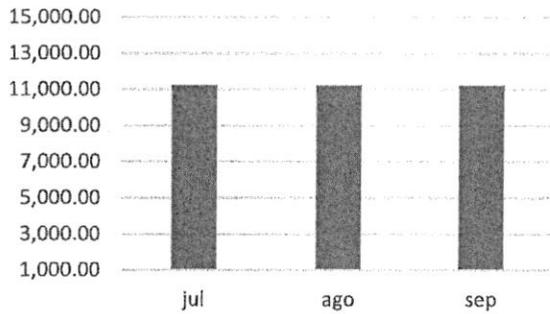

### Resumen de Facturación

|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| 1. Servicios  |     | 9,564.71 |
| 2. Descuentos |     | -33.37   |
| Sub Total     | S/. | 9,531.34 |
| IGV           | S/. | 1,715.64 |
| No Gravado    | S/. | 0.00     |

**Total a Pagar S/. 11,246.99**

### Lugares de Pago

#### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



atenciones@orocom.pe

### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844



Av. Manuel Olgüín 373 – Edificio El Quijote  
Of 504 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 631 – 2922  
www.oro.com.pe



CARTA PR-LEG-A-386-E

Lima, 04 de octubre de 2023



Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
Presente. -



Atención: **LUIS RAMON TORRES ROBLEDO**  
Gobernador Regional

Con copia: **Jaime Lizardo Carpio Camacho**  
Gerente General Regional



Referencia:  
a) OFICIO 746-2023-GRAJ-GGR/GOB.REG.TACNA  
b) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")  
c) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias y Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Información relacionada al requerimiento de pago por servicio de Internet e intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referirnos a la comunicación de la referencia a) relacionado a la solicitud de los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias (IAO), suscritos con vuestro Despacho.

En el marco de lo anterior, y con la finalidad de coadyuvar con las labores que viene realizando vuestro Despacho, tenemos a bien remitir adjunto a la presente en calidad de Anexo, en formato digital la documentación que sustenta nuestro requerimiento de pago en el marco de la prestación de los servicios de internet e intranet del Proyecto. Asimismo, tenemos a bien señalar que la acreditación de la prestación del servicio con la debida conformidad podrá observarse en los Oficios 2275-2023-MTC/24.09 y 2353-2023-MTC/24.09, mediante los cuales el Pronatel realiza la evaluación y conformidad del segundo semestre de operación de la Red de Acceso del Proyecto.

Por otro lado, respecto a la unidad operativa o ejecutora del Gobierno Regional autorizado a realizar el pago, expresamos, muy respetuosamente, que corresponde a vuestro Despacho determinar el área más idónea para proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados respecto a las instituciones educativas y centros de salud pertenecientes al Proyecto. Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la recepción de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, aprovechamos en comentarles que en Orocom contamos nuestra mejor disposición para, realizar presentaciones, mesas de trabajo u otras pertinentes a fin cerrar la brecha digital y mejorar la vida en las localidades del Proyecto. Para cualquier consulta, agradeceremos se puedan canalizar directamente al buzón [notificaciones@oro.com.pe](mailto:notificaciones@oro.com.pe), y/o comunicarse con nuestro Especialista Legal, Sr. José Luis Arroyo Sánchez con número de teléfono: 935138242, a fin de realizar las coordinaciones pertinentes.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

Miguel Ángel Celavany  
Gerente Legal



**GOBIERNO REGIONAL TACNA**  
**PROVEIDO**  
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 PASE A: Bach. Eduardo Vergara  
 INDICACIONES  
 Conocimiento y Fines     Trámite Correspondiente  
 Revisión y Evaluación     Atender Según Normatividad  
 Informar     Preparar Respuesta  
 Archivar  
 OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 06 OCT 2023    VºBº 

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
 DERIVADO A: GRD  
 EVALUACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE  
 CONOCIMIENTO Y FINES  
 PROYECTAR OFICIO  
 ARCHIVO  
 OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 05-10-23    VºBº 



Av. Manuel Olguin 373 – Edificio El Qubo  
Of 504 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 631 – 2922  
www.oro.com.pe

## ANEXO

Con la finalidad de coadyuvar con las labores que viene desarrollando vuestro Despacho, tenemos a bien poner a vuestra disposición la documentación relacionada a la prestación de los servicios de internet e intranet, así como la conformidad, conforme se observa a continuación:

- Contrato de Servicio de acceso a internet para Instituciones Abonadas Obligatorias.
- Contrato de Servicio de acceso a intranet para Institución Abonada Obligatoria.
- Constancia de Activación del Servicio.
- Oficios N°2275-2023-MTC/24.09 y N° 2352-2023-MTC/24.09 que acreditan la conformidad efectuada por el Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL.

La información señalada podrá observarse en el enlace que se indica a continuación:

[https://orocom.sac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/notificaciones\\_oro.com\\_pe/EI7xgX4AQetNIIY-KjVIUAsBgydkcL0Jcie3rKOQlxM-jA?e=2cqwk](https://orocom.sac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/notificaciones_oro.com_pe/EI7xgX4AQetNIIY-KjVIUAsBgydkcL0Jcie3rKOQlxM-jA?e=2cqwk)



CARTA PR-LEG-A-391-E

Lima, 06 de octubre de 2023

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
Presente. -Atención: **LUIS RAMON TORRES ROBLEDO**  
Gobernador Regional

- Referencia: a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")
- b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias
- c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de septiembre de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referimos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.



En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo físico, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de septiembre de 2023, ascendente al valor de S/. 11,246.99 (Once mil doscientos cuarenta y seis con 99/100 Soles) con I.G.V., en formato físico, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

  
**Milagros Grijalba Salaverry**  
Gerente Legal  
OROCOM S.A.C.

**GOBIERNO REGIONAL TACNA  
PROVEIDO**

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

PASE A: *Alcaldía Municipal de Arequipa* *Alc. Jordin Galdames*

INDICACIONES

- |                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y Fines  | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Evaluación | <input checked="" type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                         | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                    |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Archivar                              |

OBSERVACIONES

FECHA: 12 OCT 2023

VºBº



**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL**

REVISADO A: *GBA*

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EVALUACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONOCIMIENTO Y FINES                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PROYECTAR CERRAR                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARCHIVO                              |

OBSERVACIONES:

FECHA: 11-10-23





Orocom.S.A.C  
 Ruc 20603080590  
 Av. Manuel Olgúin 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 RUC : 20519752515  
 Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
 Distrito : Tacna  
 Departamento : Tacna  
 Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación—Mes Setiembre'23**



**FECHA de EMISION**  
 05/10/2023

**RECIBO**  
 S002-00000005

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,246.99  
 Vence 15/10/2023

**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |

|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEL                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |

|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROQUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |


**Descuentos:**

|                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Incidencia 22Sep2023<br>TA_A_4068_IE01                                                                                                                               | - S/ 9.62  |
| Incidencia 26Sep2023<br>TA_A_4034_CS01<br>TA_A_4034_IE01<br>TA_A_4034_IE02                                                                                           | - S/ 2.43  |
| Incidencia 28Sep2023<br>TA_A_4044_IE01<br>TA_A_4046_IE01<br>TA_A_4005_CS01<br>TA_A_4005_IE01<br>TA_A_4005_IE02                                                       | - S/ 14.70 |
| Incidencia 29Sep2023<br>TA_A_4044_IE01<br>TA_A_4050_CS01<br>TA_A_4050_IE01<br>TA_A_4050_IE02<br>TA_A_4045_CS01<br>TA_A_4045_IE01<br>TA_A_4045_IE02<br>TA_A_4069_IE01 | - S/ 6.35  |
| Incidencia 30Sep2023<br>TA_A_4068_IE01                                                                                                                               | - S/ 0.28  |



Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

### Evolutivo

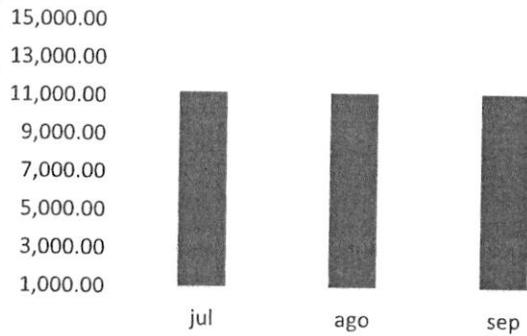

### Resumen de Facturación

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Servicios             |     | 9,564.71         |
| 2. Descuentos            |     | -33.37           |
| Sub Total                | S/. | 9,531.34         |
| IGV                      | S/. | 1,715.64         |
| No Gravado               | S/. | 0.00             |
| <b>Total a Pagar S/.</b> |     | <b>11,246.99</b> |

### Lugares de Pago

#### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



atenciones@oro.com.pe

### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844

Tacna, 22 NOV 2023

OFICIO N° 3246 -2023-GRA/GOB.REG.TACNA

SEÑOR:

**ABG. JULIO AGUILAR VILCA**

Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Presente. -

**ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA OROCOM S.A.C  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE 2023**

**REFERENCIA : a) Carta PR-LEG-A-405-E  
b) Carta Pr-LEG-A-406-E**

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

22 NOV 2023

11:49


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir a su despacho los documentos de la referencia, en el cual la empresa Orocom S.A.C. remitió los recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de octubre 2023, respecto al **PROYECTO: "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna"**.

En tal sentido, se remite el presente a su despacho para que de acuerdo a sus atribuciones y en virtud al **CONTRATO DE ACCESO A INTERNET PARA INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS**, otorgue **CONFORMIDAD** según corresponda y en extrita observancia de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, se deriva a su despacho a fin que se pueda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

  
CPC. ELIZABETH ZULEMA OSCO MAMANI  
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c / Archivo  
Se adjunta:  
- Documentos de la referencia (10) folios  
EZOM/

# PROVEIDO

## AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Asunto: *Tanja Eglio*

- |                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conformación de lista   | <input type="checkbox"/> Proyectar Resolución |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite correspondiente | <input type="checkbox"/> Proyectar Oficio     |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Ejecución               | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta   |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                        | <input type="checkbox"/> Informar             |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad         | <input type="checkbox"/> Archivar             |

Fecha: 22 NOV 2023



CARTA PR-LEG-A-406-E

Lima, 13 de noviembre de 2023

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
Presente. -Atención: **LUIS RAMON TORRES ROBLEDO**  
Governador RegionalReferencia: a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")  
b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias  
c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de octubre de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referimos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.



En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo físico, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de octubre de 2023, ascendente al valor de S/. 11,238.03 (Once mil doscientos treinta y ocho con 03/100 Soles) con I.G.V., en formato físico, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

  
**Milagros Grijalba Salaverry**  
Gerente Legal  
OROCOM S.A.C.

**GOBIERNO REGIONAL TACNA**  
**PROVEIDO**  
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 PASE A. Bach. Efraim Harguac  
 INDICACIONES

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines             | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Evaluación | <input checked="" type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                         | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                    |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Archivar                              |

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

FECHA: 20 NOV 2023 V°B°



**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
 DERIVADO A: GRD

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EVALUACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONOCIMIENTO Y FINES                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PROCESAR OFICIO                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARCHIVO                              |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FECHA: 17-11-23





Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080590  
Av. Manuel Olgún 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
RUC : 20519752515  
Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
Distrito : Tacna  
Departamento : Tacna  
Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación – Mes Octubre 2023**

|                    |                 |                       |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 01/10              | 31/10           | 15/11                 |
| ●                  | ●               | ●                     |
| Inicio de<br>Ciclo | Fin de<br>Ciclo | Último día<br>de Pago |

**FECHA de EMISION**

05/11/2023

**RECIBO**

S002-00000006

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,238.03  
Vence 15/11/2023

**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |



|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEL                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |



|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROGUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |

**Descuentos:**

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Incidencia 01Oct2023 | S/. | -10.09 |
| TA_A_4069_IE01       |     |        |
| TA_A_4046_IE01       |     |        |
| TA_A_4005_CS01       |     |        |
| TA_A_4005_IE01       |     |        |
| TA_A_4005_IE02       |     |        |
| TA_A_4044_IE01       |     |        |
| TA_A_4050_CS01       |     |        |
| TA_A_4050_IE01       |     |        |
| TA_A_4050_IE02       |     |        |
| TA_A_4045_CS01       |     |        |
| TA_A_4045_IE01       |     |        |
| TA_A_4045_IE02       |     |        |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -0.55 |
| TA_A_4046_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_CS01       |     |       |
| TA_A_4005_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_IE02       |     |       |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Incidencia 24Oct2023 | S/. | -0.95 |
| TA_A_4046_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_CS01       |     |       |
| TA_A_4005_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_IE02       |     |       |

**Compensación**


|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -25.57 |
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -1.40  |
| Incidencia 24Oct2023 | S/. | -2.39  |





Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

### Evolutivo

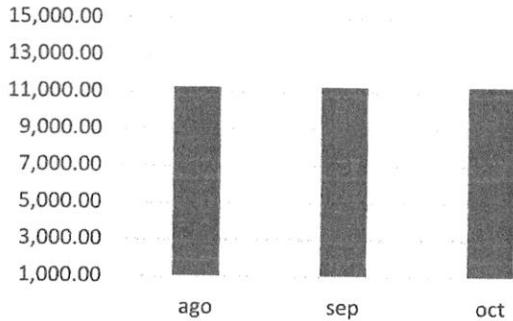

### Resumen de Facturación

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Servicios             |     | 9,564.71         |
| 2. Descuentos            |     | -11.61           |
| 3. Compensación          |     | -29.35           |
| Sub Total                | S/. | 9,523.76         |
| IGV                      | S/. | 1,714.28         |
| No Gravado               | S/. | 0.00             |
| <b>Total a Pagar S/.</b> |     | <b>11,238.03</b> |

### Lugares de Pago

#### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



atenciones@orocom.pe

### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844



#10



Av. Manuel Olguin 373 – Edificio El Qubo  
Of 504 Santiago de Surco  
Tel: (51 1) 631 – 2922  
www.orocom.pe




CARTA PR-LEG-A-405-E

Lima, 13 de noviembre de 2023

Señores:  
**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
Presente. -

Atención: **LUIS RAMON TORRES ROBLEDO**  
Gobernador Regional



- Referencia: a) Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna" (en adelante, el "Proyecto")
- b) Contratos de Abonado de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias
- c) Constancia de Activación del Servicio de acceso a Internet e Intranet

Asunto: Se remite recibos del servicio público de Acceso a Internet e Intranet correspondiente al mes de octubre de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestros cordiales saludos y, a la vez, referimos al documento de la referencia b) mediante el cual mi representada suscribió con vuestro Despacho los Contratos de Servicios de Acceso a Internet e Intranet para Instituciones Abonadas Obligatorias.

En el marco de lo anterior, muy cordialmente le expresamos que tal como se encuentra señalado en el documento c) mi representada viene prestando los servicios de Acceso a Internet e Intranet, por lo que tenemos a bien adjuntar a la presente, en calidad de Anexo, los recibos de los servicios públicos de Acceso a Internet e Intranet correspondientes al mes de octubre de 2023, ascendente al valor de S/. 11,238.03 (Once mil doscientos treinta y ocho con 03/100 Soles) con I.G.V., en formato virtual, adjunto a la presente.

Asimismo, en caso vuestra entidad tuviese un proceso distinto para la remisión de los recibos correspondientes, sírvase remitirnos el referido proceso; así como, una persona de contacto, a fin de poder cumplir con el mismo.

Finalmente, muy respetuosamente, tenemos a bien solicitar que vuestro Despacho se sirva proceder con el pago respectivo de los recibos adeudados.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos de ustedes no sin antes aprovechar la oportunidad para expresarles nuestros sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

Milagros Grijalba Salaverry  
Gerente Legal

**PROVEIDO**  
**GOBERNACION REGIONAL**  
PASE A. GRA

OBSERVACIONES

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y Fines | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente    |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación           | <input type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                        | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta         |
|                                                          | <input type="checkbox"/> Archivar                   |

FECHA: 13 NOV 2023 V°B°

GOBIERNO REGIONAL TACNA  
**PROVEIDO**  
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

PASEA. Abg. Jerolín Calderón

INDICACIONES

- |                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y Fines  | <input type="checkbox"/> Trámite Correspondiente               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y Evaluación | <input checked="" type="checkbox"/> Atender Según Normatividad |
| <input type="checkbox"/> Informar                         | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                    |
|                                                           | <input type="checkbox"/> Archivar                              |

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

FECHA: 14 NOV 2023





Orocom.S.A.C  
 Ruc 20603080590  
 Av. Manuel Olguín 373

Cliente/ Abonado: **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
 RUC : 20519752515  
 Dirección Legal : Av. Gregorio Albarracín N°526  
 Distrito : Tacna  
 Departamento : Tacna  
 Código Cliente : 07900

**Ciclo de Facturación – Mes Octubre 2023**

|                 |              |                    |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 01/10           | 31/10        | 15/11              |
|                 |              |                    |
| Inicio de Ciclo | Fin de Ciclo | Último día de Pago |

**FECHA de EMISION**  
 05/11/2023

**RECIBO**  
 S002-00000006

**TOTAL a PAGAR**

S/. 11,238.03  
 Vence 15/11/2023

**Detalle de Facturación**

| N° | Detalle de Usuarios                                 | Velocidad Contratada | Importe(S/) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | TA_A_4030_IE02 42207 SAN PEDRO                      | 10 Megas             | 113.82      |
| 2  | TA_A_4002_IE01 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | 10 Megas             | 113.82      |
| 3  | TA_A_4031_IE01 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | 10 Megas             | 113.82      |
| 4  | TA_A_4032_IE01 42261 NUEVO COPARE                   | 10 Megas             | 113.82      |
| 5  | TA_A_4034_IE02 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | 10 Megas             | 113.82      |
| 6  | TA_A_4005_IE02 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | 10 Megas             | 113.82      |
| 7  | TA_A_4050_IE01 347                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 8  | TA_A_4028_IE01 380                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 9  | TA_A_4052_IE01 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | 10 Megas             | 113.82      |
| 10 | TA_A_4008_IE01 42205                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 11 | TA_A_4001_IE01 354 VIRGEN MARIA                     | 10 Megas             | 113.82      |
| 12 | TA_A_4054_IE02 428 LAS VILCAS - ITE                 | 10 Megas             | 113.82      |
| 13 | TA_A_4020_IE01 377                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 14 | TA_A_4054_IE01 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI     | 10 Megas             | 113.82      |
| 15 | TA_A_4053_IE02 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE       | 10 Megas             | 113.82      |
| 16 | TA_A_4045_IE01 349                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 17 | TA_A_4004_IE01 352                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 18 | TA_A_4006_IE01 311                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 19 | TA_A_4011_IE01 42096 MATEO PUMACAHUA                | 10 Megas             | 113.82      |
| 20 | TA_A_4019_IE01 364                                  | 10 Megas             | 113.82      |
| 21 | TA_A_4025_IE01 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS | 10 Megas             | 113.82      |
| 22 | TA_A_4013_IE01 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI        | 10 Megas             | 113.82      |
| 23 | TA_A_4067_IE01 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | 10 Megas             | 113.82      |
| 24 | TA_A_4003_IE01 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 10 Megas             | 113.82      |
| 25 | TA_A_4065_IE01 43507                                | 10 Megas             | 113.82      |
| 26 | TA_A_4043_IE01 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | 10 Megas             | 113.82      |
| 27 | TA_A_4018_IE01 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA       | 10 Megas             | 113.82      |

|    |                                                                          |          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 28 | TA_A_4026_IE02 MICULLA                                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 29 | TA_A_4050_IE02 TUPAC AMARU II                                            | 10 Megas | 113.82 |
| 30 | TA_A_4069_IE01 RAMON COPAJA                                              | 10 Megas | 113.82 |
| 31 | TA_A_4057_IE01 332 YABROCO                                               | 10 Megas | 113.82 |
| 32 | TA_A_4005_IE01 326                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 33 | TA_A_4064_IE01 443 SANTA TERESITA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 34 | TA_A_4062_IE01 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEI                           | 10 Megas | 113.82 |
| 35 | TA_A_4066_IE02 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON                       | 10 Megas | 113.82 |
| 36 | TA_A_4021_IE01 376 SANTO DOMINGO SABIO                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 37 | TA_A_4010_IE01 319 SAN JUAN BAUTISTA                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 38 | TA_A_4048_IE01 403 PUENTE CAMIARA                                        | 10 Megas | 113.82 |
| 39 | TA_A_4042_IE01 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN                           | 10 Megas | 113.82 |
| 40 | TA_A_4001_IE02 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 41 | TA_A_4034_IE01 233                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 42 | TA_A_4006_IE02 GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                    | 10 Megas | 113.82 |
| 43 | TA_A_4053_IE01 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 44 | TA_A_4068_IE01 407                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 45 | TA_A_4012_IE01 310 TARUCACHI                                             | 10 Megas | 113.82 |
| 46 | TA_A_4056_IE01 42125 JOSE MANUEL UBALDE                                  | 10 Megas | 113.82 |
| 47 | TA_A_4052_IE02 MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA<br>BLINDADA DEL FUERTE ARICA | 10 Megas | 113.82 |
| 48 | TA_A_4045_IE02 42030 LUIS BANCHERO ROSSI                                 | 10 Megas | 113.82 |
| 49 | TA_A_4018_IE02 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                            | 10 Megas | 113.82 |
| 50 | TA_A_4046_IE01 430 VIRGEN DEL CARMEN                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 51 | TA_A_4037_IE01 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR                      | 10 Megas | 113.82 |
| 52 | TA_A_4066_IE01 356                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 53 | TA_A_4035_IE01 340 DIVINO NIÑO JESUS                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 54 | TA_A_4047_IE01 42233                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 55 | TA_A_4044_IE01 42031 DANIEL ALCIDES CARRION                              | 10 Megas | 113.82 |
| 56 | TA_A_4030_IE01 353 NIÑO JESUS DE PRAGA                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 57 | TA_A_4039_IE02 42017 NEISER G. LLACSA ARCE                               | 10 Megas | 113.82 |
| 58 | TA_A_4007_IE01 42086 HEROES ALBARRACIN                                   | 10 Megas | 113.82 |
| 59 | TA_A_4033_IE01 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR                            | 10 Megas | 113.82 |
| 60 | TA_A_4035_IE02 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA                             | 10 Megas | 113.82 |
| 61 | TA_A_4049_IE01 432 SITANA                                                | 10 Megas | 113.82 |
| 62 | TA_A_4063_IE01 329                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 63 | TA_A_4039_IE01 304                                                       | 10 Megas | 113.82 |
| 64 | TA_A_4029_IE01 42259                                                     | 10 Megas | 113.82 |
| 65 | TA_A_4026_IE01 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE                             | 10 Megas | 113.82 |
| 66 | TA_A_4009_IE01 339 ESTIQUE PAMPA                                         | 10 Megas | 113.82 |
| 67 | TA_A_4004_IE02 42044 ALFONSO UGARTE                                      | 10 Megas | 113.82 |
| 68 | TA_A_4022_IE01 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO                      | 10 Megas | 113.82 |
| 69 | TA_A_4031_CS01 P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR                      | 8 Megas  | 76.03  |
| 70 | TA_A_4003_CS01 PALCA                                                     | 8 Megas  | 76.03  |
| 71 | TA_A_4018_CS01 P.S QUILAHUANI                                            | 8 Megas  | 76.03  |
| 72 | TA_A_4004_CS01 LOS PALOS                                                 | 8 Megas  | 76.03  |
| 73 | TA_A_4006_CS01 ILABAYA                                                   | 8 Megas  | 76.03  |
| 74 | TA_A_4056_CS01 TALABAYA                                                  | 8 Megas  | 76.03  |
| 75 | TA_A_4001_CS01 INCLAN                                                    | 8 Megas  | 76.03  |

|    |                                |         |       |
|----|--------------------------------|---------|-------|
| 76 | TA_A_4013_CS01 TICACO          | 8 Megas | 76.03 |
| 77 | TA_A_4030_CS01 VILA VILA       | 8 Megas | 76.03 |
| 78 | TA_A_4005_CS01 CAMILACA        | 8 Megas | 76.03 |
| 79 | TA_A_4009_CS01 ESTIQUE PAMPA   | 8 Megas | 76.03 |
| 80 | TA_A_4010_CS01 SITAJARA        | 8 Megas | 76.03 |
| 81 | TA_A_4045_CS01 CAMBAYA         | 8 Megas | 76.03 |
| 82 | TA_A_4035_CS01 5 Y 6 LA YARADA | 8 Megas | 76.03 |
| 83 | TA_A_4007_CS01 CHUCATAMANI     | 8 Megas | 76.03 |
| 84 | TA_A_4050_CS01 BOROGUENA       | 8 Megas | 76.03 |
| 85 | TA_A_4053_CS01 PAMPA BAJA      | 8 Megas | 76.03 |
| 86 | TA_A_4012_CS01 TARUCACHI       | 8 Megas | 76.03 |
| 87 | TA_A_4002_CS01 PACHIA          | 8 Megas | 76.03 |
| 88 | TA_A_4039_CS01 LOS OLIVOS      | 8 Megas | 76.03 |
| 89 | TA_A_4057_CS01 YABROCO         | 8 Megas | 76.03 |
| 90 | TA_A_4062_CS01 SANTA ROSA      | 8 Megas | 76.03 |
| 91 | TA_A_4034_CS01 28 DE AGOSTO    | 8 Megas | 76.03 |
| 92 | TA_A_4011_CS01 SUSAPAYA        | 8 Megas | 76.03 |

**Descuentos:**

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Incidencia 01Oct2023 | S/. | -10.09 |
| TA_A_4069_IE01       |     |        |
| TA_A_4046_IE01       |     |        |
| TA_A_4005_CS01       |     |        |
| TA_A_4005_IE01       |     |        |
| TA_A_4005_IE02       |     |        |
| TA_A_4044_IE01       |     |        |
| TA_A_4050_CS01       |     |        |
| TA_A_4050_IE01       |     |        |
| TA_A_4050_IE02       |     |        |
| TA_A_4045_CS01       |     |        |
| TA_A_4045_IE01       |     |        |
| TA_A_4045_IE02       |     |        |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -0.55 |
| TA_A_4046_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_CS01       |     |       |
| TA_A_4005_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_IE02       |     |       |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Incidencia 24Oct2023 | S/. | -0.95 |
| TA_A_4046_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_CS01       |     |       |
| TA_A_4005_IE01       |     |       |
| TA_A_4005_IE02       |     |       |


**Compensación**

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -25.57 |
| Incidencia 15Oct2023 | S/. | -1.40  |
| Incidencia 24Oct2023 | S/. | -2.39  |



Orocom.S.A.C  
Ruc 20603080580  
Av. Manuel Olguin 373

### Evolutivo

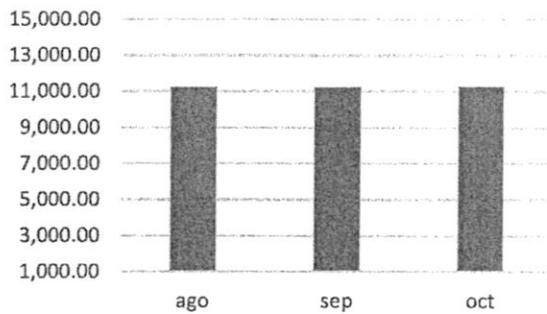

### Resumen de Facturación

|                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Servicios    |     | 9,564.71 |
| 2. Descuentos   |     | -11.61   |
| 3. Compensación |     | -29.35   |
| Sub Total       | S/. | 9,523.76 |
| IGV             | S/. | 1,714.28 |
| No Gravado      | S/. | 0.00     |

**Total a Pagar S/. 11,238.03**

### Lugares de Pago

#### Cuentas Recaudadoras

BCP 191-2616735-0-65

### Atención Exclusiva



Tacna y Moquegua  
0800-74073  
Desde un fijo o móvil



atenciones@orocom.pe

### Otros Servicios



Central OSIPTEL 225-1313

Fono Ayuda 1844



**GRI**  
GERENCIA REGIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades  
para Mujeres y Hombres"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Tacna, 24 de noviembre 2023

**OFICIO N° 7184- 2023-GRI/GOB.REG.TACNA**

Señor:

**MED. JULIO AGUILAR VILCA**

Gerencia Regional de Desarrollo Social – Gobierno Regional de Tacna

**Presente.** -



**ASUNTO: REMITO DOCUMENTO POR CORRESPONDER**

**REFERENCIA: OFICIO N° 1439-2023-CG/GRTA  
OFICIO N° 0546-2023-CG/VCST**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito a su despacho por corresponder.

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  
Gerente Regional de Infraestructura

ADJUNTO 05 FOLIOS  
C.c. Archivo  
EWRZ/rct

293893

# BOVEIDO

## GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PASE A: *Zonja 6.*

- |                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conocer el expediente   | <input type="checkbox"/> Proyectar Resolución |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trámite correspondiente | <input type="checkbox"/> Proyectar Oficio     |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Tratamiento             | <input type="checkbox"/> Preparar respuesta   |
| <input type="checkbox"/> Visto Bueno                        | <input type="checkbox"/> Informar             |
| <input type="checkbox"/> Atender según normatividad         | <input type="checkbox"/> Archivar             |


Fecha: 27 NOV 2023



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Tacna, 22 de Noviembre de 2023  
**OFICIO N° 001439-2023-CG/GRTA**

Señor:  
**Luis Ramon Torres Robledo**  
Gobernador Regional  
**Gobierno Regional Tacna**  
Av. Gregorio Albarracín Nro. 526  
Tacna/Tacna/Tacna



**Asunto** : Requerimiento de Información

**Referencia** : a) Oficio N° 000546-2023-CG/VCST de 07 de noviembre de 2023.  
b) Literal a) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  
c) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 10 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el despacho de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República acreditó la comisión de control en la modalidad de Control Concurrente al Proyecto: "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna" a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones Pronatel, el cual tiene como objetivos: (a) atender la demanda de acceso a internet y de acceso a intranet en cincuenta y dos (52) Localidades Beneficiarias, (b) brindar una conexión de acceso a internet e intranet a ciento tres (103) Instituciones Beneficiarias Obligatorias, conformadas por establecimientos de salud pública, locales escolares de gestión estatal y, comisarias de la Región y, (c) Desarrollar programas de Construcción de Capacidades en cada una de las Localidades Beneficiarias.

Sobre el particular, como parte de la ejecución del referido servicio de control, se ha evidenciado que la Institución Educativa Inicial N° 326 ubicada en la localidad de Alto Camilaca del distrito de Camilaca, provincia de Candarave; Institución Abonada Obligatoria, beneficiaria del presente proyecto, no cuenta con servicio alguno de energía eléctrica, por lo que, resulta necesario contar con información pertinente y en mérito a la normativa b) y c) de la referencia, se solicita remita la información y/o documentación según el detalle siguiente:

1. Informe que acciones adoptó a la fecha el Gobierno Regional de Tacna, respecto a la falta de energía eléctrica de la Institución Educativa Inicial N° 326 ubicada en la localidad de Alto Camilaca del distrito de Camilaca, provincia de Candarave, considerando que forma parte de las instituciones beneficiadas con el proyecto.
2. Remita información respecto a la evaluación anual del período 2022, sobre los beneficios obtenidos por el Proyecto, en atención al Punto 5.2.5 del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna, suscrito el 01 de octubre del 2015.
3. Asimismo, de ser el caso remita el estado situacional del período 2023, respecto a los beneficios obtenidos por el Proyecto, a la fecha.
4. Se informe el listado de las instituciones educativas y/o establecimientos de salud de la región que no cuentan con servicio alguno de energía eléctrica, y que se encuentran en el listado de Instituciones Abonadas Obligatorias del Proyecto, el cual se adjunta al presente.



5. Remita una (1) copia de los comprobantes de pago por la cancelación del servicio de internet de las Instituciones Abonadas Obligatorias del Proyecto, realizados al contratista Orocom S.A.C. durante los años 2022 – 2023.
6. Se ha tomado conocimiento, que durante el período 2023 hubo un lapso de tiempo de aproximadamente seis (6) meses, en los cuales las instituciones abonadas obligatorias de la Región no contaron con el servicio de internet por falta de pago al contratista Orocom S.A.C, por lo que, se solicita se sirva informar cuales fueron las causas que originaron tal situación y que acciones se adoptaron al respecto, documente su respuesta.

En tal sentido, considerando que los plazos son muy cortos para el desarrollo de nuestra labor de control, estimaré que la información solicitada se remita en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibido el presente a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Los Álamos N° 1976 – 1978 – Tacna.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Arturo Alejandro Zea Manrique**  
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional  
de Control de Tacna  
Contraloría General de la República

**GOBIERNO REGIONAL TACNA**  
**PROVEIDO**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
PASE A 67805

INDICACIONES

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines  | <input checked="" type="checkbox"/> Trámite Correspondiente |
| <input type="checkbox"/> Revisión y Evaluación | <input type="checkbox"/> Atender Según Normatividad         |
| <input type="checkbox"/> Informar              | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                 |
|                                                | <input type="checkbox"/> Archivar                           |

OBSERVACIONES  
Por correspondencia

FECHA: 23/11/23 VºB

(AZM/fcv)

Nro. Emisión: 10797 (L475 - 2023) Elab:(U20000 - L475)

**MUY URGENTE**

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL  
DERIVADO A: ORA/ORA

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EVALUACIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONOCIMIENTO Y FINES                 |
| <input type="checkbox"/>            | PROYECTAR OFICINA                    |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                              |

OBSERVACIONES:

FECHA: 22-11-23



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Jesús María, 07 de Noviembre de 2023  
**OFICIO N° 000546-2023-CG/VCST**

Señora  
**Sarita Iedayola Vilchez Castellanos**  
Directora Ejecutiva  
**Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel**  
Av. Paseo De La Republica N° 1645  
La Victoria/Lima/Lima

- Asunto** : Acreditación de la Comisión de Control del Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Control Concurrente
- Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 31 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro y en aplicación de la normativa de la referencia a) y b), que regula el Servicio de Control Simultáneo a cargo de los Órganos del Sistema Nacional de Control, el cual tiene por finalidad contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado.

Para tal efecto, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha dispuesto que el Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Control Concurrente al "Proyecto: Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna"; continúe ejecutándose a cargo de la Gerencia Regional de Control de Tacna, habiéndose designado a la señora Eyleen Scarleth Arias Hinojosa y el señor Fernando Eduardo Cohaila Villagra, supervisor y jefe de la Comisión de Control, respectivamente, a la cual acredito; por lo que, agradeceré se sirva brindar las facilidades del caso, para la realización del servicio antes mencionado.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Luis Alonso Robas Sanchez**  
Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial  
Contraloría General de la República



(LRS/ecm)

Nro. Emisión: 06346 (L100 - 2023) Elab:(U60718 - L475)


do digitalmente por  
IANRIQUE Arturo  
dro FAU 20131378972

Doi Visto Bueno  
: 07-11-2023 17:04:01 -05:00

93

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente






TACNA

Apéndice N° 1

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

I Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS OBLIGATORIAS

| Nro | Cod/INEI/2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | NUMERO DE INSTITUCIONES ABONADAS |                           | DATOS DE UBICACION      |                  |            |            | ALTURA (m.s.n.m.) |
|-----|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|     |               |              |           |                     |                               | LOCALES ESCOLARES                | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE           | LONGITUD   | LATITUD    |                   |
| 1   | 2301010008    | TACNA        | TACNA     | TACNA               | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO)  | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.320800 | -18.081100 | 336               |
| 2   | 2301030010    | TACNA        | TACNA     | CALANA              | SANTA RITA                    | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.200400 | -17.980500 | 754               |
| 3   | 2301030011    | TACNA        | TACNA     | CALANA              | PIEDRA BLANCA                 | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.187100 | -17.965400 | 818               |
| 4   | 2301090013    | TACNA        | TACNA     | TACNA               | CERRO BLANCO                  | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.189300 | -17.981800 | 769               |
| 5   | 2301050001    | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                   | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.495000 | -17.795000 | 515               |
| 6   | 2301050016    | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | NUEVO TOMASIRI                | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.515400 | -17.843000 | 460               |
| 7   | 2301050019    | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | PROTER SAMA                   | 1                                | 0                         | 0                       | ESTUDIO DE CAMPO | -70.533790 | -17.831830 | 451               |
| 8   | 2301050001    | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | PACHIA                        | 1                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.154700 | -17.896800 | 1,088             |
| 9   | 2301060010    | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | CALIENTES                     | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.123900 | -17.863800 | 1,283             |
| 10  | 2301060011    | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                       | 2                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.132800 | -17.877300 | 1,239             |
| 11  | 2301070001    | TACNA        | TACNA     | PALCA               | PALCA                         | 1                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -69.959000 | -17.776900 | 2,989             |
| 12  | 2301070062    | TACNA        | TACNA     | PALCA               | EL INGENIO                    | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -69.928416 | -17.768486 | 3,300             |
| 13  | 2301090002    | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BUENA VISTA                   | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.540300 | -17.844900 | 431               |
| 14  | 2301090015    | TACNA        | TACNA     | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)      | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.880900 | -17.994900 | 33                |
| 15  | 2301090020    | TACNA        | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                     | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.724900 | -18.115700 | 22                |
| 16  | 2301090023    | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO                  | 1                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.679100 | -18.158600 | 16                |
| 17  | 2301110001    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.436600 | -18.285900 | 25                |
| 18  | 2301110002    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUEVO COPARE)      | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.430500 | -18.124000 | 134               |
| 19  | 2301110003    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4                | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.465900 | -18.146300 | 100               |
| 20  | 2301110004    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.457500 | -18.163700 | 96                |
| 21  | 2301110005    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.427300 | -18.183700 | 109               |
| 22  | 2301110006    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 2                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.465900 | -18.178800 | 85                |
| 23  | 2301110008    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | PUEBLO LIBRE                  | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.504300 | -18.175400 | 61                |
| 24  | 2301110010    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 2                | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.526300 | -18.189700 | 45                |
| 25  | 2301110018    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.513300 | -18.208100 | 40                |
| 26  | 2301110033    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LAS LAGUNAS                   | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.409200 | -18.266600 | 54                |
| 27  | 2301110055    | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                    | 1                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.389300 | -18.335800 | 17                |
| 28  | 2302010052    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | MULLINI                       | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.189300 | -17.298500 | 3,154             |
| 29  | 2302010054    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | JIRATA                        | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.207100 | -17.336500 | 2,965             |
| 30  | 2302030001    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | ALTO CAMILACA                 | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.387800 | -17.243000 | 3,849             |
| 31  | 2302030018    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | CORAGUAYA                     | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.425300 | -17.276900 | 3,444             |
| 32  | 2302030021    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | CAMBAYA                       | 2                                | 1                         | 1                       | MED-GPS          | -70.431800 | -17.322800 | 2,599             |
| 33  | 2302030026    | TACNA        | CANDARAVE | CANDARAVE           | NUEVA CAMILACA                | 1                                | 0                         | 0                       | MED-GPS          | -70.384300 | -17.281500 | 3,608             |



| Nro | Cod/INEI/2015 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO          | LOCALIDAD             | NUMERO DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS |                           |                         | DATOS DE UBICACION |            |            |                   |
|-----|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
|     |               |              |               |                   |                       | LOCALES ESCOLARES                             | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DEPENDENCIAS POLICIALES | FUENTE             | LONGITUD   | LATITUD    | ALTURA (m.s.n.m.) |
| 34  | 2303010021    | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | ALTO CAMIARA          | 1                                             | 0                         | 2                       | MED-GPS            | -70.900500 | -17.646900 | 576               |
| 35  | 2303010024    | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PUENTE CAMIARA        | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.841600 | -17.682300 | 420               |
| 36  | 2303010028    | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA           | PAMPA SITANA          | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.855900 | -17.578600 | 823               |
| 37  | 2303020001    | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA               | 2                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.512800 | -17.420700 | 1,383             |
| 38  | 2303020007    | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUEÑA             | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.439600 | -17.314800 | 2,811             |
| 39  | 2303020029    | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA           | MIRAVE                | 2                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.548000 | -17.478400 | 1,091             |
| 40  | 2303030002    | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN | 2                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.843100 | -17.703800 | 438               |
| 41  | 2303030016    | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA            | 2                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.977500 | -17.885300 | 45                |
| 42  | 2303030018    | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS            | 2                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.977400 | -17.859900 | 188               |
| 43  | 2304010079    | TACNA        | TARATA        | TARATA            | UMUTE                 | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.036000 | -17.490600 | 3,036             |
| 44  | 2304020001    | TACNA        | TARATA        | HEROES ALBARRACIN | CHUCATAMANI           | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.122600 | -17.480200 | 2,337             |
| 45  | 2304030001    | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | ESTIQUE               | 1                                             | 0                         | 0                       | MED-GPS            | -70.018500 | -17.541900 | 3,153             |
| 46  | 2304030005    | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | TALABAYA              | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -69.987300 | -17.551500 | 3,430             |
| 47  | 2304040001    | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA     | ESTIQUE PAMPA         | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.031700 | -17.538800 | 3,072             |
| 48  | 2304050001    | TACNA        | TARATA        | SITAJARA          | SITAJARA              | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.133900 | -17.375400 | 3,162             |
| 49  | 2304060001    | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | SUSAPAYA              | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.132700 | -17.353200 | 3,407             |
| 50  | 2304060045    | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | YABROCO               | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.117600 | -17.346300 | 3,304             |
| 51  | 2304070001    | TACNA        | TARATA        | TARUCACHI         | TARUCACHI             | 1                                             | 1                         | 0                       | MED-GPS            | -70.028900 | -17.526200 | 3,073             |
| 52  | 2304080001    | TACNA        | TARATA        | TICACO            | TICACO                | 1                                             | 1                         | 1                       | MED-GPS            | -70.047700 | -17.444500 | 3,305             |

## II INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

### II.1 Establecimientos de Salud Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |           |                     |              |                  | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |           |                                       |  |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
|     | Cod/INEI/2015         | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD    | COD. UNICO MINSA | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO          | CATEGORIA | DIRECCION                             |  |
| 1   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE  | 00002914         | INCLAN                             | I-2       | CALLE ALTO RAYO SIN                   |  |
| 2   | 2301060001            | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | PACHIA       | 00002893         | PACHIA                             | I-2       | CALLE ARIAS ARAGUEZ SIN               |  |
| 3   | 2301070001            | TACNA        | TACNA     | PALCA               | PALCA        | 00002897         | PALCA                              | I-2       | CALLE PALCA SIN CARRETERA TACNA-COLPA |  |
| 4   | 2301090020            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | VILA VILA    | 00002903         | VILA VILA                          | I-2       | OTROS CALETA VILA VILA                |  |
| 5   | 2301090023            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO | 00002902         | BOCA DEL RIO                       | I-2       | AVENIDA GRAU SIN BOCA DEL RIO         |  |
| 6   | 2301110001            | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS    | 00002908         | LOS PALOS                          | I-2       | OTROS CPM. LOS PALOS SIN              |  |




| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |                     | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |                 |                           |           |                                    |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|
|     | Codineiz2015          | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO            | LOCALIDAD                          | COD_UNICO MINSA | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION                          |
| 7   | 2301110004            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)      | 00002904        | 28 DE AGOSTO              | I-3       | OTROS VIA CONSTANERA TACNA-LO KM20 |
| 8   | 2301110005            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6                 | 00002905        | 5 Y 6 LA YARADA           | I-1       | OTROS ASENTAMIENTO 5 Y 6 LA YARADA |
| 9   | 2301110018            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                         | 00002906        | LOS OLIVOS                | I-1       | COOPERATIVA AGRARIA LOS OLIVOS SIN |
| 10  | 2301110055            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                         | 00002907        | SANTA ROSA                | I-1       | OTROS BALNEARIO SANTA ROSA         |
| 11  | 2302030001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                      | 00002873        | CAMILACA                  | I-2       | AVENIDA TACNA SIN                  |
| 12  | 2302030021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                            | 00002912        | CAMBAYA                   | I-1       | AVENIDA JESUS MARIA SIN            |
| 13  | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | ILABAYA                            | 00002909        | ILABAYA                   | I-3       | CALLE GRAL IGLESIAS SIN            |
| 14  | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | BOROGUENA                          | 00002910        | BOROGUENA                 | I-1       | AVENIDA TACNA SIN                  |
| 15  | 2303020029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | MIRAVE                             | 00002911        | MIRAVE                    | I-1       | CALLE ARICA SIN                    |
| 16  | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE                 | PAMPA BAJA                         | 00002901        | PAMPA BAJA                | I-2       | CALLE PRINCIPAL PAMPA BAJA         |
| 17  | 2304020001            | TACNA        | TARATA        | HEROES ALBARRACIN   | CHUCATAMANI                        | 00002925        | CHUCATAMANI               | I-2       | CALLE 1° DE SEPTIEMBRE SIN         |
| 18  | 2304030005            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE             | TALABAYA                           | 00002927        | TALABAYA                  | I-2       | CALLE CALVARIO SIN                 |
| 19  | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA       | ESTIQUE PAMPA                      | 00002928        | ESTIQUE PAMPA             | I-2       | CALLE TACNA SIN                    |
| 20  | 2304050001            | TACNA        | TARATA        | SITAJARA            | SITAJARA                           | 00002929        | SITAJARA                  | I-1       | AVENIDA GRAU SIN                   |
| 21  | 2304060001            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA            | SUSAPAYA                           | 00002930        | SUSAPAYA                  | I-2       | CALLE TACNA SIN                    |
| 22  | 2304060045            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA            | YABROCO                            | 00002931        | YABROCO                   | I-1       | CALLE TACNA SIN CPM YABROCO        |
| 23  | 2304070001            | TACNA        | TARATA        | TARUCACHI           | TARUCACHI                          | 00002933        | TARUCACHI                 | I-2       | CALLE GRAU SIN                     |
| 24  | 2304080001            | TACNA        | TARATA        | TICACO              | TICACO                             | 00002934        | TICACO                    | I-2       | CALLE A.B LEGUIA SIN               |

## II.2 Dependencias Policiales Obligatorias

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |               | DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL |        |                                       |                                     |                                                                 |                               |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | Codineiz2015          | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO      | LOCALIDAD                        | CODIGO | NOMBRE                                | DIRECCION                           | REFERENCIA                                                      | DIRTERPOL                     |
| 1   | 2301050001            | TACNA        | TACNA         | INCLAN        | SAMA GRANDE                      | 0875   | CPNP SAMA INCLAN                      | Avenida LAS VILCAS # SIN            | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL                                     | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 2   | 2301060001            | TACNA        | TACNA         | PACHIA        | PACHIA                           | 0876   | CPNP PACHIA                           | Avenida DOMINGO ARIAS ARAGUEZ # SIN | FRENTE A LA E. JUAN MARIA REJAS                                 | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 3   | 2301090023            | TACNA        | TACNA         | SAMA          | BOCA DEL RIO                     | 0870   | CPNP BOCA DEL RIO                     | SECTOR BOCA DEL RIO                 | FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL - COSTADO DE LA POSTA MEDICA        | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 4   | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA       | ALTO CAMIARA                     | 0887   | CPNP ESPECIAL CAMIARA                 | Carretera PANAMERICANA SUR # SIN    | AL COSTADO DE LA COMISARIA PNP PROTECCION DE CARRETERAS CAMIARA | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 5   | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA       | ALTO CAMIARA                     | 1375   | CPNP PROT. DE CARRETERAS CAMIARA      | Carretera PANAMERICANA SUR # SIN    | CRUCE CON CARRETERA A TOQUEPALA                                 | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 6   | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA       | ILABAYA                          | 0889   | CPNP RURAL ILABAYA                    | Carretera SALIDA CHEIAYA # SIN      | AL COSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL                               | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 7   | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE           | PAMPA BAJA                       | 1374   | CPNP PROT. DE CARRETERAS BOCA DEL RIO | Carretera COSTANERA SUR # SIN       | AL COSTADO DEL MUSEO DE ITE                                     | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 8   | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA | ESTIQUE PAMPA                    | 0882   | CPNP ESTIQUE PAMPA                    | Carretera TACNA TARATA # SIN        | COSTADO DE CONTROL SENASA                                       | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |

Licitación Pública Especial – Proceso de Promoción de la Inversión Privada de los Proyectos de Instalación 144 de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones Junín, Puno, Moquegua y Tacna Anexo N° 8-B de las BASES - Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso




| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |           |          | DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL |        |                     |                                 |                                             |                               |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD                        | CODIGO | NOMBRE              | DIRECCIÓN                       | REFERENCIA                                  | DIRTERPOL                     |
| 9   | 2304050001            | TACNA        | TARATA    | SITAJARA | SITAJARA                         | 0683   | CPNP RURAL SITAJARA | Calle MIGUEL GRAU # SN          | A UN COSTADO DEL PUESTO DE SALUD            | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 10  | 2304060001            | TACNA        | TARATA    | SUSAPAYA | SUSAPAYA                         | 0884   | CPNP RUAL SUSAPAYA  | Calle BOLOGNESI # SN            | A MEDIA CUADRA ARRIBA DE LA PLAZA PRINCIPAL | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |
| 11  | 2304080001            | TACNA        | TARATA    | TICACO   | TICACO                           | 0895   | CPNP TICACO         | Carretera TARATA CANDARAVE # SN | A UNA CUADRA DE LA I.E. TICACO              | XXI DIRTEPOL TACNA - MOQUEGUA |

### II.3 Locales Escolares Obligatorios

| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |           |                     | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR      |              |                                      |                                   |                             |                                   |                                      |                                   |                             |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD                    | CÓDIGO LOCAL | NOMBRE                               | DIRECCIÓN                         | MÓDULOS                     | DIRECCIÓN                         | NOMBRE                               | DIRECCIÓN                         | MÓDULOS                     |
| 1   | 2301010008            | TACNA        | TACNA     | TACNA               | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO) | 809087       | 364                                  | CARRETERA COSTANERA LATERAL 4 S/N | INICIAL                     | CARRETERA COSTANERA LATERAL 4 S/N | 364                                  | CARRETERA COSTANERA LATERAL 4 S/N | INICIAL                     |
| 2   | 2301030010            | TACNA        | TACNA     | CALANA              | SANTA RITA                   | 487732       | 377                                  | SANTA RITA                        | INICIAL                     | SANTA RITA                        | 377                                  | SANTA RITA                        | INICIAL                     |
| 3   | 2301030011            | TACNA        | TACNA     | CALANA              | PIEDRA BLANCA                | 487727       | 376                                  | CARRETERA PIEDRA BLANCA KM 9      | INICIAL                     | CARRETERA PIEDRA BLANCA KM 9      | 376                                  | CARRETERA PIEDRA BLANCA KM 9      | INICIAL                     |
| 4   | 2301030013            | TACNA        | TACNA     | CALANA              | CERRO BLANCO                 | 487713       | 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | CERRO BLANCO                      | INICIAL                     | CERRO BLANCO                      | 335 NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | CERRO BLANCO                      | INICIAL                     |
| 5   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                  | 487888       | 354 VIRGEN MARIA                     | AVENIDA RAYO ALTO S/N             | INICIAL                     | AVENIDA RAYO ALTO S/N             | 354 VIRGEN MARIA                     | AVENIDA RAYO ALTO S/N             | INICIAL                     |
| 6   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                  | 487911       | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN            | AVENIDA PRINCIPAL S/N             | PRIMARIA, SECUNDARIA        | AVENIDA PRINCIPAL S/N             | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN            | AVENIDA PRINCIPAL S/N             | PRIMARIA, SECUNDARIA        |
| 7   | 2301050016            | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | NUEVO TOMASIRI               | 487874       | 329                                  | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | INICIAL                     | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | 329                                  | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | INICIAL                     |
| 8   | 2301050019            | TACNA        | TACNA     | INCLAN              | PROTER SAMA                  | 843214       | 443 SANTA TERESITA                   | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | INICIAL, PRIMARIA           | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | 443 SANTA TERESITA                   | CARRETERA PANAMERICANA NORTE      | INICIAL, PRIMARIA           |
| 9   | 2301050001            | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | PACHIA                       | 487930       | 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | AVENIDA JUSTO ARIAS ARAGUEZ S/N   | INICIAL                     | AVENIDA JUSTO ARIAS ARAGUEZ S/N   | 334 VIRGENCITA DE LOURDES            | AVENIDA JUSTO ARIAS ARAGUEZ S/N   | INICIAL                     |
| 10  | 2301060010            | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | CALIENTES                    | 488005       | 42060 CRNEL MARGELINO VARELA BARRIOS | AVENIDA PRINCIPAL                 | PRIMARIA                    | AVENIDA PRINCIPAL                 | 42060 CRNEL MARGELINO VARELA BARRIOS | AVENIDA PRINCIPAL                 | PRIMARIA                    |
| 11  | 2301060011            | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                      | 487992       | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE        | CARRETERA MICULLA                 | PRIMARIA                    | CARRETERA MICULLA                 | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE        | CARRETERA MICULLA                 | PRIMARIA                    |
| 12  | 2301060011            | TACNA        | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                      | 488072       | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN           | MICULLA                           | BASICA ALTERNATIVA AVANZADO | MICULLA                           | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN           | MICULLA                           | BASICA ALTERNATIVA AVANZADO |
| 13  | 2301070001            | TACNA        | TACNA     | PALCA               | PALCA                        | 488152       | 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | TACNA LA PAZ                      | PRIMARIA, SECUNDARIA        | TACNA LA PAZ                      | 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | TACNA LA PAZ                      | PRIMARIA, SECUNDARIA        |
| 14  | 2301070052            | TACNA        | TACNA     | PALCA               | EL INGENIO                   | 699327       | 43507                                | ALTO INGENIO                      | PRIMARIA                    | ALTO INGENIO                      | 43507                                | ALTO INGENIO                      | PRIMARIA                    |
| 15  | 2301090002            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BUENA VISTA                  | 488449       | 380                                  | CARRETERA SAMA - LAS YARAS        | INICIAL                     | CARRETERA SAMA - LAS YARAS        | 380                                  | CARRETERA SAMA - LAS YARAS        | INICIAL                     |
| 16  | 2301090015            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)     | 808573       | 42259                                | CARRETERA COSTANERA - PUERTO GRAU | INICIAL, PRIMARIA           | CARRETERA COSTANERA - PUERTO GRAU | 42259                                | CARRETERA COSTANERA - PUERTO GRAU | INICIAL, PRIMARIA           |
| 17  | 2301090020            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                    | 488425       | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA              | CALETA DE VILA VILA               | INICIAL                     | CALETA DE VILA VILA               | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA              | CALETA DE VILA VILA               | INICIAL                     |
| 18  | 2301090020            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                    | 488473       | 42207 SAN PEDRO                      | AVENIDA WENCESLAO ACHINGA S/N     | PRIMARIA                    | AVENIDA WENCESLAO ACHINGA S/N     | 42207 SAN PEDRO                      | AVENIDA WENCESLAO ACHINGA S/N     | PRIMARIA                    |
| 19  | 2301090023            | TACNA        | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO                 | 488468       | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | AVENIDA LUIS BANCHERO ROSSI S/N   | INICIAL, PRIMARIA           | AVENIDA LUIS BANCHERO ROSSI S/N   | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDOÑES       | AVENIDA LUIS BANCHERO ROSSI S/N   | INICIAL, PRIMARIA           |
| 20  | 2301110001            | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                    | 488087       | 352                                  | LOS PALOS                         | INICIAL                     | LOS PALOS                         | 352                                  | LOS PALOS                         | INICIAL                     |
| 21  | 2301110001            | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                    | 488662       | 42044 ALFONSO UGARTE                 | LOS PALOS                         | PRIMARIA, SECUNDARIA        | LOS PALOS                         | 42044 ALFONSO UGARTE                 | LOS PALOS                         | PRIMARIA, SECUNDARIA        |
| 22  | 2301110002            | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUEVO COPARE)     | 808813       | 42261 NUEVO COPARE                   | CARRETERA COSTANERA               | PRIMARIA                    | CARRETERA COSTANERA               | 42261 NUEVO COPARE                   | CARRETERA COSTANERA               | PRIMARIA                    |
| 23  | 2301110003            | TACNA        | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4               | 486520       | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR       | ASENTAMIENTO 4                    | INICIAL, PRIMARIA           | ASENTAMIENTO 4                    | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR       | ASENTAMIENTO 4                    | INICIAL, PRIMARIA           |



| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |                     |                               | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |                                      |                                           |                               |  |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|     | CodINEI2015           | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | CÓDIGO LOCAL            | NOMBRE                               | DIRECCIÓN                                 | MÓDULOS                       |  |
| 24  | 2301110004            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 486005                  | 233                                  | 28 DE AGOSTO                              | INICIAL                       |  |
| 25  | 2301110004            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 486681                  | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO          | ASENTAMIENTO NRO 3                        | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 26  | 2301110005            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 486073                  | 340 DIVINO NIÑO JESUS                | 5 Y 6 LA YARADA                           | INICIAL                       |  |
| 27  | 2301110005            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 486515                  | 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA        | 5 Y 6                                     | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 28  | 2301110006            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 486105                  | 356                                  | 60                                        | INICIAL                       |  |
| 29  | 2301110006            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 60 (HOSPICIO)    | 486486                  | 42065 ROMULO BOLLUARTE PONCE DE LEON | LA YARADA                                 | PRIMARIA                      |  |
| 30  | 2301110008            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PUEBLO LIBRE                  | 809672                  | 43506 JUVENAL UBALDO ORDONEZ SALAZAR | CARRETERA COSTANERA - PUEBLO LIBRE KM 25  | INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA |  |
| 31  | 2301110010            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 2                | 486493                  | 42200 OMAR ZILBERT SALAS             | LA ESPERANZA                              | PRIMARIA                      |  |
| 32  | 2301110018            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 486025                  | 304                                  | LOS OLIVOS                                | INICIAL                       |  |
| 33  | 2301110018            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 486450                  | 42017 NEISER G. LLACSA ARCE          | CARRETERA COOPERATIVA LOS OLIVOS SIN      | PRIMARIA                      |  |
| 34  | 2301110033            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LAS LAGUNAS                   | 486233                  | 407                                  | 26 DE OCTUBRE                             | INICIAL                       |  |
| 35  | 2301110055            | TACNA        | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | SANTA ROSA                    | 808827                  | 42263 VIRGINIA LAZARO VILLARROEL     | HITO 01 FRONTERA CON CHILE                | INICIAL, PRIMARIA             |  |
| 36  | 2302010052            | TACNA        | CANDARAVE     | CANDARAVE           | MULLINI                       | 486642                  | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN      | MULLINI                                   | PRIMARIA                      |  |
| 37  | 2302010054            | TACNA        | CANDARAVE     | CANDARAVE           | JIRATA                        | 486986                  | 42033 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR          | CALLE TACNA SIN                           | PRIMARIA                      |  |
| 38  | 2302030001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                 | 486876                  | 326                                  | ALTO CAMILACA                             | PRIMARIA                      |  |
| 39  | 2302030001            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                 | 810788                  | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI         | CALLE PRINCIPAL SIN                       | INICIAL                       |  |
| 40  | 2302030018            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | CORAGUAYA                     | 489316                  | 42031 DANIEL ALCIDES CARRION         | CORAGUAYA                                 | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 41  | 2302030021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                       | 489175                  | 349                                  | CALLE MIRAFLORES SIN                      | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 42  | 2302030021            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                       | 489284                  | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI            | ILABAYA                                   | INICIAL                       |  |
| 43  | 2302030026            | TACNA        | CANDARAVE     | CAMILACA            | NUOVA CAMILACA                | 810806                  | 430 VIRGEN DEL CARMEN                | YARAMA                                    | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 44  | 2303010021            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | ALTO CAMIARA                  | 777576                  | 42233                                | CARRETERA PANAMERICANA NORTE SIN          | INICIAL                       |  |
| 45  | 2303010024            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | PUNTE CAMIARA                 | 489062                  | 403 PUENTE CAMIARA                   | CARRETERA PUENTE CAMIARA                  | PRIMARIA                      |  |
| 46  | 2303010028            | TACNA        | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | PAMPA SITANA                  | 810302                  | 432 SITANA                           | CARRETERA ALTO CAMIARA - TOQUEPALA KM 8.5 | INICIAL                       |  |
| 47  | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | ILABAYA                       | 489142                  | 311                                  | CALLE NUEVA SIN                           | INICIAL                       |  |
| 48  | 2303020001            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | ILABAYA                       | 489298                  | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS               | CALLE ARICA SIN                           | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 49  | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | BOROGUEÑA                     | 489161                  | 347                                  | BOROGUEÑA                                 | INICIAL                       |  |
| 50  | 2303020007            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | BOROGUEÑA                     | 489279                  | TUPAC AMARU II                       | AVENIDA TUPAC AMARU SIN                   | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 51  | 2303020029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | MIRAVE                        | 489156                  | 325 JESUS MI SALVADOR                | CALLE ARICA MZ O LOTE 05                  | INICIAL                       |  |
| 52  | 2303020029            | TACNA        | JORGE BASADRE | ILABAYA             | MIRAVE                        | 489260                  | 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER      | AVENIDA MILLER SIN                        | PRIMARIA, SECUNDARIA          |  |
| 53  | 2303030002            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE                 | VILLA MILITAR EL EDEN         | 489397                  | 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ      | CALLE LOS CLAVES SIN                      | INICIAL                       |  |



| Nro | DATOS DE LA LOCALIDAD |              |               |                   | DATOS DEL LOCAL ESCOLAR |              |                                                        |                                         |                                 |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|     | Cod.INEI2015          | DEPARTAMENTO | PROVINCIA     | DISTRITO          | LOCALIDAD               | CÓDIGO LOCAL | NOMBRE                                                 | DIRECCIÓN                               | MÓDULOS                         |
| 54  | 2303030002            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN   | 489463       | MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA BLINDADA DEL FUERTE ARICA | CARRETERA PANAMERICA SUR SIN            | TECNICO PRODUCTIVA              |
| 55  | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA              | 489415       | 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                | CARRETERA VIA COSTANERA PAMPA BAJA      | INICIAL                         |
| 56  | 2303030016            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA              | 489439       | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE                         | CARRETERA CRUCE COSTANERA - ITE         | PRIMARIA                        |
| 57  | 2303030018            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS              | 801005       | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI                       | AVENIDA LAS VILCAS PARTE ALTA SIN.      | SECUNDARIA                      |
| 58  | 2303030018            | TACNA        | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS              | 810222       | 428 LAS VILCAS - ITE                                   | CARRETERA COSTANERA - ITE               | INICIAL                         |
| 59  | 2304010079            | TACNA        | TARATA        | TARATA            | UMUTE                   | 489851       | RAMON COPAJA                                           | CARRETERA TARATA - TACNA KM 02          | SUPERIOR TECNOLÓGICA SECUNDARIA |
| 60  | 2304020001            | TACNA        | TARATA        | HEROES ALBARRACIN | CHUCATAMANI             | 489889       | 42086 HEROES ALBARRACIN                                | CALLE 1 DE SETIEMBRE 138                | INICIAL - PRIMARIA, SECUNDARIA  |
| 61  | 2304030001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | ESTIQUE                 | N.D.         | ESTRELLITAS (PRONOEI)                                  | ESTIQUE PUEBLO (LOCAL DE USO MULTIPLES) | INICIAL (PRONOEI)               |
| 62  | 2304030005            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE           | TALABAYA                | 489731       | 42125 JOSE MANUEL UBALDE                               | JIRON CALVARIO S/N                      | PRIMARIA                        |
| 63  | 2304040001            | TACNA        | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA     | ESTIQUE PAMPA           | 810590       | 339 ESTIQUE PAMPA                                      | CALLE ESTIQUE PAMPA SIN                 | INICIAL                         |
| 64  | 2304050001            | TACNA        | TARATA        | SITAJARA          | SITAJARA                | 489774       | 319                                                    | CALLE SAN MARTIN S/N                    | INICIAL                         |
| 65  | 2304060001            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | SUSAPAYA                | 810547       | 42096 MATEO PUMACAHUA                                  | CALLE TACNA S/N                         | SECUNDARIA                      |
| 66  | 2304060045            | TACNA        | TARATA        | SUSAPAYA          | YABROCO                 | 489806       | 332 YABROCO                                            | CALLE TACNA S/N                         | INICIAL                         |
| 67  | 2304070001            | TACNA        | TARATA        | TARUCACHI         | TARUCACHI               | 489849       | 310 TARUCACHI                                          | CALLE 1 DE SETIEMBRE S/N                | INICIAL                         |
| 68  | 2304080001            | TACNA        | TARATA        | TICACO            | TICACO                  | 489868       | 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI                          | CALLE LEGUIA 51                         | INICIAL                         |

**ACTA N° 002-2024-CG/GRTA-SCC/IBACIDSRT-H12**

**“ACTA DE ENTREVISTA”**

En el distrito de Tacna, provincia Tacna y departamento de Tacna, siendo las \_\_\_\_\_ horas de 19 de Enero 2024, personal de la Contraloría General de la República, se apersonó a las instalaciones de la Gerencia General Regional de Gobierno Regional de Tacna ubicado en Av. Manuel A. Odría N° 1045 Tacna, acompañado del Gerente General Regional, Jaime Carpio Comacho, a fin de realizar la recopilación de Información en mérito al literal a) del artículo 22 de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

| Información general                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Entidad / proyecto                                                                                                                                                                                                                                     | Gobierno Regional de Tacna                                   |
| Unidad orgánica                                                                                                                                                                                                                                        | Gerencia General Regional                                    |
| Nombres y apellidos                                                                                                                                                                                                                                    | Jaime Carpio Comacho                                         |
| Grado de instrucción                                                                                                                                                                                                                                   | Superior                                                     |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerente                                                      |
| Documento de designación                                                                                                                                                                                                                               | Resolución Ejecutiva Regional N° 380 - 2023-GR-GOB.REG.TACNA |
| Período en el cargo                                                                                                                                                                                                                                    | desde 25 Agosto 2023                                         |
| Instrucciones:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lea cuidadosamente las preguntas y responda a los aspectos consultados. De ser el caso adjunte la información que estime pertinente, para la mejor comprensión de la operatividad de su dirección.</li> </ul> |                                                              |



**CUESTIONARIO**

1. ¿Tiene conocimiento del Proyecto de instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna?

Si, formó conocimiento a través de una reunión  
 en Lima, donde fue abordado por la empresa OROCOM.  
 Reunión en el MTC.

2. ¿Tiene conocimiento de los alcances del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna”? (en que consiste, cuáles son las obligaciones de ambas partes, que Gerencias intervienen en su ejecución y supervisión).

Si, por el cual el CRT debe pagar una contraprestación mensual, OROCOM manifiesto que MTC debía transferir los recursos.

3. ¿Conoce usted si el Gobierno Regional de Tacna, ha cumplido con el pago de los servicios que brinda el operador Orocom S.A.C. en las Instituciones Abonadas bajo su jurisdicción?, de ser el caso precise cuál es el procedimiento del pago.

La empresa señala que cumplió el CRT está verificando que se hubiera cumplido el servicio.

Desconoce si se ha efectuado el pago, no se podría precisar.

4. De no haber realizado los respectivos pagos al operador Orocom S.A.C. a la fecha, precise cuales son los motivos que generaron tal situación, y el estado actual de la deuda.

Se encuentra en verificación el cumplimiento del servicio.

5. Precise si tiene conocimiento, que funcionarios y/o servidores intervienen en la conformidad del servicio, si se les asignó funciones mediante documento formal, y quien supervisa tales labores, alcance una copia de la documentación que sustente su respuesta.



Supervisa la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, por su parte de sus funciones, todo vez que DIRESA y DRET dependen de dicha gerencia.

6. De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Tacna, precise si a la fecha se ha brindado mantenimiento a los equipos otorgados por PRONATEL, o de ser el caso se efectuó la reposición de los mismos para su óptimo funcionamiento.

No puede precisar en este momento.

7. Sírvase precisar, si se ha verificado que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias de la Región Tacna (colegios, establecimientos de salud y/o comisarías), se realizaron haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el Proyecto.

No puede precisar dicha información  
Esa i



8. Precise si tiene conocimiento, si el Gobierno Regional de Tacna efectuó la evaluación anual de los beneficios obtenidos por el Proyecto, de ser el caso, precise el nombre del funcionario designado para efectuar tal labor, alcance una copia de las evaluaciones efectuadas.

No puede precisar dicha información

9. Indique si el Gobierno Regional de Tacna, a la fecha ha implementado proyectos complementarios de desarrollo social, gestión territorial y seguridad, soportados sobre la red de transporte terrestre de banda ancha implementada, de ser el caso precise el nombre y código de los proyectos. O en su defecto indique si tiene conocimiento si alguna institución educativa o centro de salud pública, fuera del radio urbano de la ciudad de Tacna cuenta con algún servicio de internet gestionado por el Gobierno Regional de Tacna.

*Desconocen o no pueden precisar la implementación de algún proyecto*

10. Precise si tiene conocimiento, si el referido convenio ha sido modificado o ampliado mediante adendas y/o convenios adicionales con el contratista Orocom S.A.C., considerando que su vigencia se extiende hasta la vigencia del Contrato de Financiamiento el cual concluye el 21 de julio de 2032, de ser el caso proporcione una copia de los documentos de modificación y/o ampliación.

*Se habría realizado una adenda a mediados del año 2023, información que se debería solicitar a Desarrollo Social.*



11. Como parte del Servicio de Control Concurrente al período de operación del referido proyecto, se ha identificado que diversas Instituciones Educativas, precisan que, la cobertura y velocidad del internet brindado por el operador Orocom S.A.C. (acceso a 5 equipos) resulta insuficiente en relación a la cantidad de alumnos por aula (Entre 20 a 30 alumnos), ¿tiene usted conocimiento de dicha situación?, de ser el caso que medidas se han adoptado al respecto?

*No tenía conocimiento.*

12. ¿Precise si se ha previsto solicitar una mayor cobertura al contratista Orocom S.A.C.?, de ser el caso indique si se ha efectuado el trámite respectivo y adjunte documentación que sustente su respuesta.

*El CRT observó la situación y OROCOM señaló que se iba a plantear una adenda que a la fecha no se concreta.*

13. En relación a la pregunta anterior, se identificó que, en diversas Instituciones Educativas verificadas, la dirección del colegio efectuó el traslado del ambiente de la "sala de cómputo" instalada por el proyecto de PRONATEL (ambiente para cinco (5) equipos de cómputo), a fin de brindar acceso a las tecnologías de la información a la totalidad de alumnos de un salón de clases, trasladando solo los equipos de cómputo (monitores, CPU) entregados por PRONATEL, sin embargo la infraestructura de red (gabinetes de equipos de red, antenas receptoras externas, pararrayos, etc.) permanece en el lugar inicial sin uso algo.

Por lo que, se le consulta si a la fecha se ha tomado conocimiento de tal situación, ¿y qué medidas se han adoptado?


*No se tiene conocimiento.*



14. De igual forma, se identificó que dos (2) Instituciones Educativas Abonadas no cuentan con el Servicio de Electricidad, por lo que, a pesar de contar con el equipamiento de PRONATEL a la fecha no reciben los beneficios del proyecto; por lo tanto, indique si tiene conocimiento de dicha situación y las acciones adoptadas al respecto.

*No se puede precisar en este momento.*





Tacna, 19 de enero de 2024

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**

  
Firma: **ING° JAIME LIZARDO CARPIO CAMACHO**  
Nombre y apellidos: **CERENTE GENERAL REGIONAL** Jaime Carpio Camacho  
DNI: **00427645**  
Fecha: 19 de enero de 2024





2. ¿Tiene conocimiento de los alcances del Convenio N° 025-2015/GOB.REG.TACNA “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna”? (en que consiste, cuáles son las obligaciones de ambas partes, que Gerencias intervienen en su ejecución y supervisión).

Si tiene conocimiento que es un servicio de internet para Colegios y Establecimiento de Salud, pero no tiene conocimiento del encargado de la supervisión, sin embargo los recibos de pago este oficina son remitidos a Administración.

3. ¿Conoce usted si el Gobierno Regional de Tacna, ha cumplido con el pago de los servicios que brinda el operador Orocom S.A.C. en las Instituciones Abonadas bajo su jurisdicción?, de ser el caso precise cuál es el procedimiento del pago.

Tiene conocimiento que Administración tenía un compromiso de pago con Orocom en diciembre 2023.

4. De no haber realizado los respectivos pagos al operador Orocom S.A.C. a la fecha, precise cuales son los motivos que generaron tal situación, y el estado actual de la deuda.

Desconoce.

5. Precise si tiene conocimiento, que funcionarios y/o servidores intervienen en la conformidad del servicio, si se les asignó funciones mediante documento formal, y quien supervisa tales labores, alcance una copia de la documentación que sustente su respuesta.

*La Gerencia de Administración.*

6. De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Tacna, precise si a la fecha se ha brindado mantenimiento a los equipos otorgados por PRONATEL, o de ser el caso se efectuó la reposición de los mismos para su óptimo funcionamiento.

*Desconoce.*

7. Sírvase precisar, si se ha verificado que los cursos de capacitación dirigidos a las instituciones públicas beneficiarias de la Región Tacna (colegios, establecimientos de salud y/o comisarías), se realizaron haciendo uso de la conectividad de banda ancha brindada por el Proyecto.

*No podía precisar.*

8. Precise si tiene conocimiento, si el Gobierno Regional de Tacna efectuó la evaluación anual de los beneficios obtenidos por el Proyecto, de ser el caso, precise el nombre del funcionario designado para efectuar tal labor, alcance una copia de las evaluaciones efectuadas.

*Desconoce, sólo analizó los pagos hacia la Gerencia de Administración.*

9. Indique si el Gobierno Regional de Tacna, a la fecha ha implementado proyectos complementarios de desarrollo social, gestión territorial y seguridad, soportados sobre la red de transporte terrestre de banda ancha implementada, de ser el caso precise el nombre y código de los proyectos. O en su defecto indique si tiene conocimiento si alguna institución educativa o centro de salud pública, fuera del radio urbano de la ciudad de Tacna cuenta con algún servicio de internet gestionado por el Gobierno Regional de Tacna.

Sólo hay un proyecto de Telecomunicaciones para radio VHF - UHF (radio instaladas) en Centros de Salud de la Región. Asimismo tiene conocimiento que la Red de Salud tiene un (proyecto) de Internet Satelital a cargo de la UE Red de Salud, se precisa que es un servicio en algunos establecimientos de Salud.

10. Precise si tiene conocimiento, si el referido convenio ha sido modificado o ampliado mediante adendas y/o convenios adicionales con el contratista Orocom S.A.C., considerando que su vigencia se extiende hasta la vigencia del Contrato de Financiamiento el cual concluye el 21 de julio de 2032, de ser el caso proporcione una copia de los documentos de modificación y/o ampliación.

Desconoce.

11. Como parte del Servicio de Control Concurrente al período de operación del referido proyecto, se ha identificado que diversas Instituciones Educativas, precisan que, la cobertura y velocidad del internet brindado por el operador Orocom S.A.C. (acceso a 5 equipos) resulta insuficiente en relación a la cantidad de alumnos por aula (Entre 20 a 30 alumnos), ¿tiene usted conocimiento de dicha situación?, de ser el caso que medidas se han adoptado al respecto?

En un EESS indicó que la velocidad no era óptima, pero no se procesó el mecanismo para mejorarla o quien asumiría dicho pago por la mejora.

12. ¿Precise si se ha previsto solicitar una mayor cobertura al contratista Orocom S.A.C.?, de ser el caso indique si se ha efectuado el trámite respectivo y adjunte documentación que sustente su respuesta.

*Desconoce.*

13. En relación a la pregunta anterior, se identificó que, en diversas Instituciones Educativas verificadas, la dirección del colegio efectuó el traslado del ambiente de la "sala de cómputo" instalada por el proyecto de PRONATEL (ambiente para cinco (5) equipos de cómputo), a fin de brindar acceso a las tecnologías de la información a la totalidad de alumnos de un salón de clases, trasladando solo los equipos de cómputo (monitores, CPU) entregados por PRONATEL, sin embargo la infraestructura de red (gabinetes de equipos de red, antenas receptoras externas, pararrayos, etc.) permanece en el lugar inicial sin uso algo.

Por lo que, se le consulta si a la fecha se ha tomado conocimiento de tal situación, ¿y qué medidas se han adoptado?

*Desconoce.*

14. De igual forma, se identificó que dos (2) Instituciones Educativas Abonadas no cuentan con el Servicio de Electricidad, por lo que, a pesar de contar con el equipamiento de PRONATEL a la fecha no reciben los beneficios del proyecto; por lo tanto, indique si tiene conocimiento de dicha situación y las acciones adoptadas al respecto.

*Desconoce.*

15. De la información publicada en el portal web del Gobierno Regional, se identificó la nota de prensa de 16 de mayo de 2023 referida al “Internet para colegios y centros de salud”, en cuyo contenido se indica que el Gobierno Regional de Tacna suscribió contrato con la empresa OROCOM SAC con el fin de dotar de servicio de internet a 68 instituciones educativas y 24 establecimientos de salud de las zonas rurales de las cuatro provincias de la región, en el marco del “Proyecto de Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Tacna”.

En ese sentido, se le solicita se sirva precisar quienes son los funcionarios responsables de la supervisión al cumplimiento de dicho contrato, además de alcanzar una copia de dicho documento.

No tiene conocimiento sobre la supervisión del contrato con Orocom.

*A*

16. ¿Desea efectuar algún comentario adicional?


De manera injusta se tomó conocimiento que el RTC no ha transferido los partidas presupuestales para el pago al proveedor Orocom S.A.C.

.....

Tacna, 19 de enero de 2024

**GÓBIERNO REGIONAL DE TACNA**

  
.....  
**DR. JULIO AGUILAR VILCA**  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



Firma  
Nombre y apellidos: *Julio Aguilar Vilca*  
DNI: *00423383*  
Fecha: 19 de enero de 2024

## CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Internet que celebran, de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**, con R.U.C. N°20519752515, con domicilio legal en Av. Gregorio Albarracín N°526, distrito, provincia y departamento de Tacna, representada por su Gobernador Regional, Luis Ramon Torres Robledo, identificado con D.N.I. N° 00428265, a quien en adelante se le denominará EL ABONADO, y por la otra parte OROCOM S.A.C, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20603080590, debidamente representada por su Representante Legal, Sra. Milagros del Rosario Grijalba Salaverry, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 41471728, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica 14065551, con domicilio en Avenida Manuel Olgúin N° 375, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, en adelante EL OPERADOR, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL OPERADOR brinda el servicio de acceso a Internet en el marco del Contrato de Financiamiento del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Tacna", en adelante el PROYECTO, financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL (Ahora Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL).

### CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

En el texto del presente contrato los siguientes términos que denoten en singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera:

2. CICLO DE FACTURACIÓN: Es el período correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN y que culmina en la FECHA DE CIERRE DE CICLO DE FACTURACIÓN. Este período deberá de ser de 30 días como mínimo.
- 2.2. CONDICIONES DE USO: Es el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTTEL y sus modificatorias o norma que la sustituya.
- 2.3. CONSTANCIA DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO: Es el documento donde consta la fecha de inicio del SERVICIO.
- 2.4. CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el Contrato de Financiamiento suscrito por FITEL y EL OPERADOR, con fecha 09 de mayo del 2018.
- 2.5. CPE: Es el equipamiento de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal de EL USUARIO acceder a la red de EL OPERADOR para utilizar el SERVICIO, incluye el equipo módulo suscriptor.
- 2.6. EL ABONADO: Es la Entidad de la Administración Pública que contrata con EL OPERADOR el SERVICIO para LOS USUARIOS.

2.7. EL OPERADOR: Es la empresa concesionaria de servicios de telecomunicaciones que ha suscrito el Contrato de Financiamiento del PROYECTO con el FITEL.

2.8. EL USUARIO: Es la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA a quién EL OPERADOR debe instalar y proveer EL SERVICIO contratado con EL ABONADO, en virtud del contrato de financiamiento suscrito con el FITEL.

2.9. FECHA DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestación del SERVICIO por parte de EL OPERADOR a favor de EL ABONADO, la cual coincidirá con la fecha de inicio del periodo de operación del contrato de financiamiento del PROYECTO. EL OPERADOR entregará a EL ABONADO una CONSTANCIA DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO indicando la fecha de la misma.

2.10. FECHA DE CIERRE DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual concluye el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.

2.11. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual se inicia el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.

2.12. FECHA DE VENCIMIENTO DEL RECIBO: Es la fecha en la cual se vence el período normal para el pago del recibo. Esta fecha no puede ser menor a 15 días calendarios, ni mayor a 20 días calendarios desde la FECHA DE CIERRE DEL CICLO DE FACTURACIÓN.

2.13. FITEL<sup>1</sup>: Es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones; toda referencia al FITEL como persona jurídica de Derecho Público o la Secretaría Técnica del FITEL debe entenderse hecha al Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL.

2.14. INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es la Entidad Pública comprendida en el PROYECTO, en la cual EL OPERADOR se obliga a instalar el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO.

2.15. MODULO DE ACCESO: Es el equipamiento descrito en el ANEXO IV del presente Contrato.

2.16. ORDEN DE SERVICIO: Es el documento o formato de EL OPERADOR donde consta los datos de EL ABONADO y del USUARIO, debiendo el OPERADOR adjuntar el documento que acredite la dirección de instalación, las especificaciones técnicas, la cantidad de los equipos y materiales instalados, las pruebas de activación realizadas, la fecha de instalación, el nombre del instalador y la conformidad del USUARIO; y que EL OPERADOR deberá comunicar a EL ABONADO.

2.17. OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

2.18. PARTES DEL CONTRATO: Son EL OPERADOR y EL ABONADO.

Mediante Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, se aprobó la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL con personería jurídica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, correspondiéndole a este último la calidad de entidad absorbente y la administración del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, el cual mantiene su intangibilidad. En virtud de lo anterior, se creó el Programa Nacional de Telecomunicaciones - FITEL, en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente del Viceministerio de Comunicaciones. De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, toda referencia al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL como persona jurídica de Derecho Público o la Secretaría Técnica del FITEL debe entenderse hecha al FITEL

- 2.19. PROYECTO: Son los Proyectos "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Tacna" e "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Tacna".
- 2.20. SERVICIO: Es la provisión de acceso a Internet que EL OPERADOR brinda a EL USUARIO, otorgando un MODULO DE ACCESO, el cual será entregado e instalado de manera gratuita a cada USUARIO conforme a lo estipulado en el Contrato de Financiamiento.
- 2.21. SWITCH DE COMUNICACIONES: Es el dispositivo que se incluye en el Anexo V del Presente Contrato.

### CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

- 3.1 Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL OPERADOR brindará el SERVICIO contratado por EL ABONADO para LOS USUARIOS que se detallan en el Anexo III del presente Contrato de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente Contrato.
- 3.2 EL ABONADO podrá solicitar a EL OPERADOR el servicio de acceso a Intranet, el cual se prestará sin costo siempre que la velocidad de conexión sea la misma de la conexión a internet.

### CLÁUSULA CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

- 4.1 Las características del SERVICIO a brindar por parte de EL OPERADOR se señalan en el ANEXO I y ANEXO II del presente Contrato.
- 4.2 Una vez iniciada la prestación del SERVICIO, EL USUARIO sólo podrá efectuar modificaciones en los equipos, redes y/o el software operativo instalados por EL OPERADOR, siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de EL OPERADOR. En caso que EL OPERADOR autorice alguna modificación que implique costos adicionales, se requerirá también la autorización de EL ABONADO, salvo que EL USUARIO asuma dichos costos.
- 4.3 EL OPERADOR instalará los equipos y servicios indicados en el Anexo IV, según el módulo que corresponda al tipo de USUARIO, así como el Software Operativo y los programas que se instalen en las computadoras; éstos pasarán a ser de propiedad de EL ABONADO, con la excepción del CPE y el Access Point, debiendo efectuarse la transferencia de propiedad por parte de EL OPERADOR a EL ABONADO, conforme a la normatividad vigente.
- 4.4 Como parte del SERVICIO, EL OPERADOR entrega a cada USUARIO, los equipos de propiedad de EL OPERADOR que se señalan en el ANEXO IV.

### CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

- 5.1. El presente Contrato entra en vigencia a partir del día de la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO hasta el 31 de diciembre de 2023, periodo que podrá ser renovado de forma automática por el plazo de un año, el mismo que está supeditado al financiamiento del servicio objeto del contrato, en cada ejercicio presupuestal.

- 5.2. Siendo las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS Entidades Públicas comprendidas en el PROYECTO, la FECHA DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO coincidirá con la fecha de inicio del período de operación mencionado en el Contrato de Financiamiento del PROYECTO; si por algún motivo EL OPERADOR activara el servicio con anterioridad a la fecha antes citada, esta se considerará como período de prueba y estará exonerada de facturación a EL ABONADO.

## CLÁUSULA SEXTA: RETRIBUCIÓN

- 6.1. La Instalación del SERVICIO es libre de pago. Las condiciones de dicha instalación están establecidas en el ANEXO I del presente contrato.
- 6.2. EL ABONADO pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información transmitida o recibida, considerando la velocidad de transmisión contratada que se indica en el Anexo III, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato. La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL ABONADO puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I.

Para la contratación de nuevas velocidades EL OPERADOR y EL ABONADO deberán suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demás cláusulas del presente Contrato.

El incumplimiento en el pago oportuno de la retribución dará lugar a la constitución en mora automática de EL ABONADO devengándose el interés legal a la tasa fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, con la excepción del supuesto señalado en el último párrafo del numeral 6.3 de la presente Cláusula.

- 6.3. EL OPERADOR remitirá a EL ABONADO el recibo correspondiente por el importe mensual del SERVICIO que a la FECHA DE CIERRE DEL CICLO DE FACTURACIÓN le corresponda pagar. El recibo por el importe mensual del SERVICIO deberá ser entregado a EL ABONADO como mínimo tres (3) días calendarios antes de la FECHA DE VENCIMIENTO DEL RECIBO en el domicilio señalado por EL ABONADO. Asimismo, el recibo podrá ser remitido utilizando cualquier otro medio alternativo propuesto por, o a través del medio electrónico y/o informático que disponga EL OPERADOR, conforme al artículo 122 de las CONDICIONES DE USO, en cuyo caso dicha entrega deberá realizarse por lo menos tres (3) días calendario antes de la FECHA DE VENCIMIENTO DEL RECIBO, en este caso, la carga de la prueba sobre la recepción por parte de EL ABONADO corresponderá a EL OPERADOR.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, EL ABONADO podrá solicitar en forma expresa la remisión mediante documento impreso del recibo, en el domicilio señalado por éste.

Los pagos deberán realizarse dentro del plazo de vencimiento señalado en el recibo. No obstante lo anterior, EL ABONADO deberá cancelar el importe del recibo mensual dentro de los ocho (08) días calendario posteriores a la fecha de vencimiento del recibo, sin el cobro de cargos adicionales ni intereses por parte de EL OPERADOR. La falta de recepción del recibo mensual del SERVICIO por parte de EL ABONADO no le exime del pago puntual correspondiente al importe mensual facturado por el SERVICIO, para lo cual EL OPERADOR deberá poner

a disposición de EL ABONADO el número telefónico libre de costo N° 0800-74073 para informarle el importe mensual facturado por el SERVICIO.

6.4. Si la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN, EL ABONADO sólo pagará el valor proporcional del consumo mensual correspondiente al periodo de días que transcurra entre la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DEL CICLO DE FACTURACIÓN.

6.5. EL OPERADOR efectuará la devolución vía compensación proporcionalmente a EL ABONADO, incluyendo el respectivo interés de ser el caso, cuando por causas atribuibles a EL OPERADOR se interrumpa el SERVICIO, siempre que la tarifa haya sido cancelada; de no haber realizado aún EL ABONADO pago alguno, EL OPERADOR no podrá exigir pago por el período que duró la interrupción conforme a lo señalado en el artículo 45° de las CONDICIONES DE USO.

Sólo podrá realizar las devoluciones vía compensación cuando las interrupciones del SERVICIO superen a los sesenta (60) minutos consecutivos conforme a lo señalado en el artículo 47° de las CONDICIONES DE USO.

Esta devolución vía compensación no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera de control de EL OPERADOR, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

En este supuesto, EL OPERADOR efectuará la devolución vía compensación a más tardar en el recibo correspondiente al segundo ciclo inmediato posterior o en caso no sea posible a través del recibo de servicio, en el plazo de dos (2) meses contados desde la fecha en que FITEL notifique a EL OPERADOR que su acreditación no ha sido aceptada.

6.6. Tratándose de una interrupción por más de quince (15) días calendario, continuos o alternados dentro de un CICLO DE FACTURACIÓN, EL OPERADOR exonerará a EL ABONADO del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE FACTURACIÓN.

Esta exoneración no será aplicable si la interrupción se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor u otras circunstancias fuera de control de EL OPERADOR, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

En este supuesto, EL OPERADOR efectuará la devolución vía compensación a más tardar en el recibo correspondiente al segundo ciclo inmediato posterior o en caso no sea posible a través del recibo de servicio, en el plazo de dos (2) meses contado desde la fecha en que FITEL notifique a EL OPERADOR que su acreditación no ha sido aceptada.

6.7. El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, deberá reflejar las tarifas conforme al ANEXO I del presente Contrato.

6.8. EL OPERADOR podrá efectuar la suspensión del SERVICIO por falta de pago luego de transcurrido el plazo establecido en el último párrafo del numeral 6.3 del presente Contrato, correspondiente al segundo CICLO DE FACTURACIÓN impago consecutivo o alterno.

- 6.9 Transcurridos dos (2) meses posteriores a la suspensión del SERVICIO por falta de pago y subsistiendo dicho incumplimiento por parte de EL ABONADO, siempre que no exista reclamo pendiente sobre cualquier monto adeudado, EL OPERADOR podrá proceder al corte del SERVICIO, previa comunicación a EL ABONADO, mediante documento escrito que deberá realizar con una anticipación no menor de siete (7) días calendario anteriores a la fecha de corte. La carga de la prueba sobre la recepción por parte de EL ABONADO de dicha comunicación corresponderá a EL OPERADOR. En caso EL ABONADO cancele su deuda y solicite la reconexión del SERVICIO, EL OPERADOR efectuará dicha reconexión previo pago de la tarifa correspondiente.

EL OPERADOR podrá dar de baja al SERVICIO, conforme a lo establecido en las CONDICIONES DE USO.

### CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE EL ABONADO Y/O EL USUARIO

- 7.1. EL ABONADO cumplirá con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y oportunidad señaladas en la cláusula quinta y sexta.

- 7.2. EL ABONADO y/o EL USUARIO se obligan a permitir que el personal de EL OPERADOR o los terceros autorizados por él, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para: (i) instalarlo; (ii) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal operación del SERVICIO, y (iii) en caso de resolución o culminación del presente contrato, retirar el SERVICIO y todo el equipamiento externo al local de EL USUARIO instalado hasta el CPE, incluido este último. Asimismo, EL ABONADO permitirá que personal de FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para la supervisión del mismo.

- 7.3. EL ABONADO y EL USUARIO son responsables solidariamente de mantener las configuraciones de los equipos de modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL OPERADOR.

- 7.4. EL ABONADO y/o EL USUARIO informarán a EL OPERADOR de los problemas y acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a tomar las acciones correspondientes.

- 7.5. EL ABONADO proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto del SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluación y monitoreo del PROYECTO.

- 7.6. EL ABONADO se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual, específicamente la legislación en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL ABONADO utilizará licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que deberán estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software libre o de código abierto, se considerará que éste será completamente compatible con su equivalente licenciado.

- 7.7. EL ABONADO no podrá utilizar los derechos de propiedad intelectual de EL OPERADOR, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por escrito. El uso de tales derechos no podrá extenderse más allá del plazo indicado por EL OPERADOR en la autorización respectiva o, en su defecto, del plazo de duración del

presente contrato. EL ABONADO tendrá propiedad intelectual sobre la información que desarrolle.

7.8. EL ABONADO y el USUARIO son responsables del cuidado y mantenimiento de todo el equipamiento (hardware y software) proporcionado por EL OPERADOR, el mismo que es transferido en propiedad a favor de EL ABONADO como parte del MODULO DE ACCESO, excluyendo de estos al CPE así como todo equipamiento y sistema de puesta a tierra instalado. Para la solución de problemas técnicos con el equipamiento de responsabilidad de EL ABONADO, éste deberá hacer uso de la garantía señalada en el ANEXO IV del presente Contrato.

7.9. Utilizar el SERVICIO así como los equipos para los fines de este Contrato y custodiarlos con la diligencia ordinaria requerida y de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente sobre la materia. No deberá modificar la instalación del SERVICIO efectuada por EL OPERADOR, ni los equipos, ni utilizarlos en forma ilícita, por ejemplo: (i) realizando transmisiones o difusiones de materiales o contenidos que violen la legislación, o; (ii) accediendo a otros sistemas no autorizados por sus titulares. En caso reconfigure, manipule, sustituya o modifique los equipos sin el consentimiento expreso de EL OPERADOR será de absoluta responsabilidad de EL USUARIO.

7.10. No utilizar el SERVICIO ni trasladar los equipos fuera del domicilio en el que fue instalado.

#### CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL OPERADOR

8.1. EL OPERADOR es responsable del cuidado y mantenimiento de todo equipamiento (hardware y software) instalado hasta el CPE, incluido este último, el mismo que sirve para brindar el SERVICIO. Asimismo, EL OPERADOR es responsable de implementar los mecanismos de seguridad física, de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.

8.2. EL OPERADOR es responsable de instalar y configurar a favor de EL ABONADO, un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL USUARIO use el SERVICIO sin restricciones y a la velocidad de transmisión contratada.

EL OPERADOR es responsable de la instalación y configuración de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL USUARIO para el uso del SERVICIO. El inventario de los componentes (marca, modelo, serie) del MODULO DE ACCESO, así como la información de cada uno de estos se señalan en el ANEXO IV del presente Contrato y consta en la ORDEN DE SERVICIO de EL OPERADOR que ampara la Instalación de los equipos.

8.4. Una vez instalados los componentes del MÓDULO DE ACCESO dentro del local de EL USUARIO, e iniciado el SERVICIO en la fecha de activación respectiva EL OPERADOR deberá efectuar la Transferencia de propiedad correspondiente a que hace referencia la Cláusula Cuarta, numeral 4.3.

8.5. EL OPERADOR deberá proporcionar un número telefónico libre de costo a través del cual brinde asesoría permanente dedicada a orientar y asesorar a EL ABONADO y/o EL USUARIO en la absolución de consultas relacionadas con el SERVICIO, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del SERVICIO.

- 8.6. EL OPERADOR cumplirá con toda la normativa aplicable emitida por el OSIPTEL incluyendo las CONDICIONES DE USO que se encuentren vigentes durante la vigencia del presente Contrato.
- 8.7. EL OPERADOR realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura, así como de todo equipamiento instalado incluido el CPE, el Access Point y el sistema de puesta a tierra. Ello implica realizar a dicho equipamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen el normal funcionamiento de los mismos y que no caigan en obsolescencia anticipada, a fin de brindar el SERVICIO bajo los estándares establecidos en el presente Contrato.
- 8.8. EL OPERADOR está obligado a reparar las averías de todo equipamiento instalado dentro del local de EL USUARIO hasta el CPE, y el Access Point, por causas imputables a él, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.
- 8.9. EL OPERADOR deberá instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de ingeniería que le permita proteger los equipos que se encuentren fuera del local de EL USUARIO, así como los medios de protección necesarios para enfrentar condiciones climáticas adversas.

#### CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO

- 9.1. El incremento de velocidad de transmisión (migración) a solicitud de EL ABONADO no implicará el pago de montos adicionales a los efectuados por EL ABONADO, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad de transmisión contratada. EL ABONADO declara conocer que esta migración importa la extinción de cualquier beneficio o promoción otorgada por EL OPERADOR.

El incremento de velocidad mencionado se sujetará a la tarifa que fije OSIPTEL conforme a la Tabla descrita en el Anexo I.

- 9.2. EL OPERADOR garantiza el SERVICIO en el punto de conexión hasta el CPE.
- 9.3. La velocidad de transmisión y la velocidad mínima garantizada se indican en el ANEXO I.

La información que rige el presente contrato, así como las CONDICIONES DE USO están disponibles en la página web [www.oro.com.pe](http://www.oro.com.pe)

#### CLAUSULA DECIMA: SUSPENSIÓN Y TRASLADO DEL SERVICIO

- 10.1 El ABONADO podrá solicitar la suspensión del SERVICIO por un período de tiempo máximo de tres (03) meses, consecutivos o no, dentro de un (01) año de operación, luego de transcurrido el periodo de suspensión solicitado por EL ABONADO, EL SERVICIO será reactivado.
- 10.2 EL ABONADO deberá abonar la tarifa respectiva por el concepto de reactivación por suspensión del SERVICIO.
- 10.3 EL ABONADO podrá solicitar a EL OPERADOR el traslado del SERVICIO al mismo USUARIO dentro de la misma localidad. Corresponde a EL OPERADOR realizar el

traslado del SERVICIO y de los componentes que se instalaron para la prestación del servicio como el CPE, Access Point y el Switch, conforme se señala en las CONDICIONES DE USO debiendo poner en conocimiento al FITEL de dicho cambio. EL ABONADO será el responsable de realizar la reubicación de los equipos del MÓDULO DE ACCESO, excepto los que son de propiedad del OPERADOR. Así mismo EL ABONADO asumirá el costo por el traslado del SERVICIO. Dicho costo será acordado entre EL OPERADOR y EL ABONADO y será incluido en el recibo posteriormente facturado, siempre y cuando EL ABONADO se encuentre de acuerdo con el costo por el traslado del SERVICIO.

10.4 En el caso de reemplazo de la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA solicitada por EL ABONADO a EL OPERADOR, este último informará y obtendrá la aprobación del FITEL, conforme a lo estipulado en el Contrato de Financiamiento del PROYECTO. En el supuesto de aprobarse dicha solicitud, EL ABONADO será el responsable de realizar la reubicación de los equipos del MÓDULO DE ACCESO, excepto el CPE a la nueva INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA. Así mismo EL ABONADO asumirá el costo por el traslado del SERVICIO. Dicho costo será acordado entre EL OPERADOR y EL ABONADO y será incluido en el recibo posteriormente facturado, siempre y cuando EL ABONADO se encuentre de acuerdo con el costo por el traslado del SERVICIO.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se resolverá por:

11.1. EL ABONADO podrá resolver el presente Contrato cuando:

- a) EL OPERADOR deje de prestar EL SERVICIO por más de seis (06) meses consecutivos por causas atribuibles a él.
- b) Cuando EL OPERADOR aplique tarifas distintas a las vigentes al momento de la contratación del servicio, siempre que resulten desfavorables para el ABONADO.
- c) Cuando EL ABONADO no cuente con el financiamiento del servicio objeto del contrato, dentro de cada ejercicio presupuestal, siempre que cuente con la debida acreditación.

11.2. EL OPERADOR podrá resolver el presente Contrato luego de haber transcurrido seis (06) meses desde la fecha en la que se hizo efectivo el corte del SERVICIO.

11.3. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato en caso se resuelva el Contrato de Financiamiento suscrito entre el FITEL y EL OPERADOR.

11.4. En cualquiera de los supuestos de resolución antes mencionados, la parte que incurra en la causal de resolución asumirá los costos y gastos de traslados de equipos al FITEL señalados en el numeral 4.3 de la cláusula cuarta del presente Contrato.

11.5. De resolverse el presente Contrato, EL ABONADO se obliga a transferir al FITEL la propiedad de los equipos señalados en el 4.3. de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. Cabe precisar, que es responsabilidad de EL ABONADO que todos los equipos se encuentren debidamente operativos y se entreguen en dicha condición a satisfacción del FITEL.

En caso corresponda, EL ABONADO deberá cancelar los importes adeudados por EL SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez éste. Asimismo, de ser el caso EL ABONADO deberá permitir a EL OPERADOR el retiro de cualquier

dispositivo o equipamiento instalado al exterior de la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, hasta el CPE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO se regirá de acuerdo con el Procedimiento de Reclamos establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 047-2015-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD**

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier información que puedan recibir con relación a la prestación del SERVICIO materia del presente Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CESIÓN**

EL OPERADOR podrá ceder su posición contractual o sus obligaciones, previa aprobación del Directorio del FITEL o quien haga las veces de él en el marco del contrato de financiamiento del PROYECTO y lo comunicará al ABONADO por escrito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO**

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operación o utilización del presente Contrato que transgreda el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como sus modificatorias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

EL ABONADO declara conocer que EL OPERADOR está obligado a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables.

Asimismo, EL ABONADO autoriza a EL OPERADOR a entregar a FITEL y/o OSIPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información consignada en su recibo por este SERVICIO; ii) copia de su recibo por este SERVICIO; y iii) otros relacionados con el SERVICIO que EL OPERADOR le preste.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LOS SERVICIOS EN INTERNET**

EL USUARIO deberá utilizar el SERVICIO cumpliendo con la normativa legal, la moral, las buenas costumbres y el orden público relacionados con el uso de Internet, lo que se encuentra reseñado en la Política disponible en la página web de EL OPERADOR. EL OPERADOR podrá adoptar las medidas del caso si toma conocimiento de alguna infracción de EL USUARIO a lo anterior. Son actividades prohibidas: la pornografía infantil, el "spam", infringir el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos

personales, infringir los derechos de propiedad intelectual, realizar actividades de "hacking" y similares.

EL OPERADOR no tiene obligación de controlar los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por EL USUARIO, por lo que: (i) no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la forma, condiciones, características y circunstancias del uso de Internet que pueda hacer EL USUARIO, ni que dichos terceros no autorizados no puedan acceder y, en su caso, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular de cualquier modo los contenidos y comunicaciones de toda clase que EL USUARIO transmita, difunda, almacene, ponga a disposición, reciba, obtenga o acceda a través del SERVICIO; (ii) no controla previamente ni garantiza la ausencia de virus en los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles a través del SERVICIO, ni la ausencia de otros elementos que puedan producir alteraciones en la computadora de EL USUARIO o en los documentos electrónicos y carpetas almacenados en dichas computadoras o transmitidos desde las mismas; (iii) respecto de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles a través del SERVICIO, EL OPERADOR no interviene en la creación, transmisión ni en la puesta a disposición y no ejerce control alguno previo ni garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, EL OPERADOR actuará dentro de los alcances de las normas vigentes, protegiendo los datos personales de EL USUARIO y salvaguardando el secreto de las telecomunicaciones.

### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de Lima, sin perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la atención de reclamos a los usuarios.

Suscrito en la ciudad de Tacna, a los.....12.....días del mes de.....mayo..... del año 2023 en dos (02) ejemplares de igual valor.



Por EL OPERADOR    Por EL ABONADO  
**LUIS RAMÓN TORRES ROBLEDO**  
GOBERNADOR REGIONAL



## ANEXO I – INSTALACION Y TARIFA POR EL SERVICIO

1. La instalación consiste en:
  - a. Implementación de los equipos y configuración en la red de EL OPERADOR necesarios para brindar el servicio de acceso a Internet.
  - b. Instalación y configuración de todo el equipamiento del módulo de acceso mencionados en el Anexo IV en la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA que permiten la conexión a la red de EL OPERADOR y la prestación del SERVICIO. La instalación del SERVICIO es libre de pago hasta alcanzar el número de instalaciones gratuitas establecidas en el Contrato de Financiamiento.
  - c. Pruebas de conectividad.

EL OPERADOR facturará la tarifa tope mensualmente, de acuerdo al tipo de conexión, independientemente del volumen de información transmitida según lo indicado en el siguiente cuadro:

| Tipo de Conexión | Velocidad de Transmisión de descarga (Mbps) | Tarifa* Tope Mensual (en soles Incluye Impuestos de Ley) |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                | 8 Mbps                                      | 89.72**                                                  |
| 2                | 10 Mbps                                     | 134.31**                                                 |
| 3                | 12 Mbps**                                   | 182.48**                                                 |
| 4                | 20 Mbps**                                   | 203.94**                                                 |
| 5                | 40 Mbps**                                   | 245.14**                                                 |

\* La tarifa tope mensual es aplicable por cada USUARIO listado en el Anexo III.

\*\*Esos valores se actualizarán conforme a la normativa vigente que sobre el particular emita OSIPTEL.

- 2.1 EL ABONADO solicita a EL OPERADOR contratar la velocidad establecida en el Anexo N° III, para el servicio de Acceso a internet en el total de instalaciones indicadas en el anexo antes señalado del Contrato.
- 2.2 EL ABONADO se obliga a pagar a EL OPERADOR la velocidad contratada por cada una de las conexiones realizadas que se encuentran debidamente detalladas en el Anexo N° III del Contrato.
- 2.3 El monto a ser pagado por EL ABONADO a EL OPERADOR es el resultante de la sumatoria de todas las tarifas detalladas en el Anexo N° III.



## ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

1. Garantía de disponibilidad del servicio de red será de 98%, medido hasta el **POP**
2. Garantía de la latencia en la red será menor a 150 ms (ida y vuelta), desde el CPE instalado por EL OPERADOR en las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, hasta un servidor alojado en el NOC de acceso de EL OPERADOR
3. Garantía por pérdida de paquetes en la red no será mayor a 2% **medido desde el CPE hasta un servidor alojado en el NOC de acceso de EL OPERADOR.**

4. Garantía<sup>2</sup> de la velocidad de conexión no menor al 40% de la velocidad contratada, medido desde el CPE.

5. Garantía de servicio al cliente que incluye:

- a. Procedimiento para la cancelación de pagos, señalando los medios y lugares donde realizar ello.
- b. Procedimiento sobre cómo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u otra información relacionado a este.
- c. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En éste se deberá precisar cómo EL USUARIO reporta la falla del SERVICIO a EL OPERADOR en primera instancia, a OSIPTEL en segunda instancia si su reclamo no es atendido, y cómo el OPERADOR informara dichos reportes al FITEL. También se deberá precisar cuáles son los datos o información que se debe proporcionar durante un reporte de falla, los medios que acreditan el reporte realizado por EL USUARIO, cómo este último puede consultar el avance del reclamo realizado, y el plazo máximo para la atención de un reclamo por EL OPERADOR.




Este Procedimiento será aprobado por el FITEL, en tanto el OSIPTEL no apruebe el respectivo Procedimiento para áreas rurales.

<sup>2</sup> La velocidad garantizada a la que se hace referencia va acorde a lo dispuesto en la normatividad vigente, y estará sujeta a cualquier modificación sobre la materia.

ANEXO III

USUARIOS DONDE SE HA INSTALADO LOS SERVICIOS (\*)

| N° | REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO            | LOCALIDAD                             | CÓDIGO LOCAL | NOMBRE DEL LOCAL ESCOLAR              | TIPO DE SERVICIO (**) | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) (***) | TARIFA CONTRATADA |
|----|--------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | TACNA  | TACNA     | TACNA               | MAGOLLO (IRRIGACION MAGOLLO)          | 809087       | 364                                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 2  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | SANTA RITA                            | 487732       | 377                                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 3  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | PIEDRA BLANCA                         | 487727       | 376 SANTO DOMINGO SABIO               | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 4  | TACNA  | TACNA     | CALANA              | CERRO BLANCO                          | 487713       | 335 NUJESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 5  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                           | 487888       | 354 VIRGEN MARIA                      | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 6  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | SAMA GRANDE                           | 487911       | 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN             | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 7  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | TOMASIRI                              | 487874       | 329                                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 8  | TACNA  | TACNA     | INCLAN              | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROTER SAMA    | 643214       | 443 SANTA TERESITA                    | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 9  | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | PACHIA                                | 487930       | 334 VIRGENCITA DE LOURDES             | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 10 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | CALIENTES                             | 488005       | 42060 CRNEL MARCELINO VARELA BARRIOS  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 11 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                               | 487992       | 42058 OLGA GROHMAN DE BASADRE         | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 12 | TACNA  | TACNA     | PACHIA              | MICULLA                               | 488072       | CEBA - JOSE JOAQUIN INCLAN            | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 13 | TACNA  | TACNA     | PALCA               | PALCA                                 | 488152       | 42063 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO  | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 14 | TACNA  | TACNA     | PALCA               | EL INGENIO LA LIBERTAD (ALTO INGENIO) | 699927       | 43507                                 | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 15 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | BUENA VISTA                           | 488449       | 380                                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 16 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | MORRO SAMA (PUERTO GRAU)              | 808573       | 42259                                 | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 17 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                             | 488425       | 353 NIÑO JESUS DE PRAGA               | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 18 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | VILA VILA                             | 488473       | 42207 SAN PEDRO                       | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 19 | TACNA  | TACNA     | SAMA                | BOCA DEL RIO                          | 488468       | 42197 VICTOR GUTIERREZ ORDONES        | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |
| 20 | TACNA  | TACNA     | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                             | 486087       | 352                                   | INTERNET E INTRANET   | 10 Mbps                               | S/134.31          |



|    |       |               |                     |                                                 |        |                                         |                     |         |          |
|----|-------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 21 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                                       | 486662 | 42044 ALFONSO UGARTE                    | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 22 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | COPARE II (NUEVO COPARE)                        | 808813 | 42261 NUEVO COPARE                      | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 23 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 4                                  | 486520 | 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCÁZAR          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 24 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   | 486006 | 233                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 25 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO)                   | 486681 | 42199 JUAN VELASCO ALVARADO             | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 26 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              | 486073 | 340 DIVINO NIÑO JESUS                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 27 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6                              | 486515 | 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE TARA           | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 28 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         | 486105 | 356                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 29 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | HOSPICIO 60 - LA YARADA                         | 486488 | 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 30 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PUEBLO LIBRE                                    | 808672 | 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR    | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 31 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LA ESPERANZA 1                                  | 486493 | 42200 OMAR ZILBERT SALAS                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 32 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                                      | 486025 | 304                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 33 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                                      | 486450 | 42017 NEISER G. LLACSA ARCE             | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 34 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASOCIACION DE CRIAMEN 26 DE OCTUBRE LAS LAGUNAS | 486233 | 407                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 35 | TACNA | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PESCADORES SANTA ROSA                           | 808827 | 42263 VIRGINIA LAZARO VILLAROEEL        | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 36 | TACNA | CANDARAVE     | CANDARAVE           | MULLINI                                         | 488642 | 42114 GLORIOSO HUSARES DE JUNIN ALBUJAR | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 37 | TACNA | CANDARAVE     | CANDARAVE           | JIRATA                                          | 488996 | 42033 ENRIQUE LOPEZ                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 38 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                                   | 488878 | 326                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 39 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                                   | 810788 | 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI            | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 40 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CORAGUAYA                                       | 489316 | 42031 DANIEL ALCIDES CARRION            | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 41 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                                         | 489175 | 349                                     | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 42 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                                         | 489284 | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI               | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 43 | TACNA | CANDARAVE     | CAMILACA            | NUEVA CAMILACA                                  | 810806 | 430 VIRGEN DEL CARMEN                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 44 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | ALTO CAMIARA                                    | 777576 | 42233                                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 45 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | PUEENTE CAMIARA                                 | 489062 | 403 PUENTE CAMIARA                      | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 46 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA             | PAMPA SITANA                                    | 810302 | 432 SITANA                              | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |





|    |       |               |                   |                       |        |                                                        |                     |         |          |
|----|-------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 47 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA               | 489142 | 311                                                    | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 48 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA           | ILABAYA               | 489298 | GUSTAVO PINTO ZEVALLOS                                 | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 49 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUEÑA             | 489161 | 347                                                    | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 50 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA           | BOROGUEÑA             | 489279 | TUPAC AMARU II                                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 51 | TACNA | CANDARAVE     | QUILAHUANI        | QUILAHUANI            | 489000 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 52 | TACNA | CANDARAVE     | QUILAHUANI        | QUILAHUANI            | 559960 | 42091 ENRIQUE DEMETRIO ESTRADA                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 53 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN | 489397 | 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ                        | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 54 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | VILLA MILITAR EL EDEN | 489463 | MARISCAL CACERES 3RA BRIGADA BLINDADA DEL FUERTE ARICA | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 55 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA            | 489415 | 383 SAN ISIDRO LABRADOR                                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 56 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | PAMPA BAJA            | 489439 | 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE                         | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 57 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS            | 801005 | 42054 CTA JOSE CARLOS MARIATEGUI                       | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 58 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE               | LAS VILCAS            | 810222 | 428 LAS VILCAS - ITE                                   | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 59 | TACNA | TARATA        | TARATA            | PUEBLO LIBRE UMUTE    | 489651 | RAMON COPAJA                                           | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 60 | TACNA | TARATA        | HEROES ALBARRACIN | CHUCATAMANI           | 489689 | 42086 HEROES ALBARRACIN                                | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 61 | TACNA | TARATA        | ESTIQUE           | ESTIQUE               | 489745 | 42205                                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 62 | TACNA | TARATA        | ESTIQUE           | TALABAYA              | 489731 | 42125 JOSE MANUEL UBALDE                               | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 63 | TACNA | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA     | ESTIQUE PAMPA         | 810590 | 339 ESTIQUE PAMPA                                      | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 64 | TACNA | TARATA        | SITAJARA          | SITAJARA              | 489774 | 319 SAN JUAN BAUTISTA                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 65 | TACNA | TARATA        | SUSAPAYA          | SUSAPAYA              | 810547 | 42096 MATEO PUMACAHUA                                  | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 66 | TACNA | TARATA        | SUSAPAYA          | YABROCO               | 489806 | 332 YABROCO                                            | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 67 | TACNA | TARATA        | TARUCACHI         | TARUCACHI             | 489849 | 310 TARUCACHI                                          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |
| 68 | TACNA | TARATA        | TICACO            | TICACO                | 489868 | 316 VICTORIA BARCIA BONIFATTI                          | INTERNET E INTRANET | 10 Mbps | S/134.31 |

| N° | REGIÓN | PROVINCIA     | DISTRITO            | LOCALIDAD                     | CÓDIGO RENAES | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD  | TIPO DE SERVICIO    | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) (***) | TARIFA CONTRATADA |
|----|--------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | TACNA  | TACNA         | INCLAN              | SAMA GRANDE                   | 2914          | INCLAN                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 2  | TACNA  | TACNA         | PACHIA              | PACHIA                        | 2893          | PACHIA                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 3  | TACNA  | TACNA         | PALCA               | PALCA                         | 2897          | PALCA                                | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 4  | TACNA  | TACNA         | SAMA                | VILA VILA                     | 2903          | VILA VILA                            | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 5  | TACNA  | TACNA         | SAMA                | BOCA DEL RIO                  | 2902          | P.S CARLOS ALBERTO JARA ALMONTE FLOR | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 6  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS PALOS                     | 2908          | LOS PALOS                            | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 7  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 3 (28 DE AGOSTO) | 2904          | 28 DE AGOSTO                         | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 8  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | ASENTAMIENTO 5 Y 6            | 2905          | 5 Y 6 LA YARADA                      | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 9  | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | LOS OLIVOS                    | 2906          | LOS OLIVOS                           | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 10 | TACNA  | TACNA         | LA YARADA LOS PALOS | PESCADORES SANTA ROSA         | 2907          | SANTA ROSA                           | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 11 | TACNA  | CANDARAVE     | CAMILACA            | ALTO CAMILACA                 | 2873          | CAMILACA                             | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 12 | TACNA  | CANDARAVE     | CAMILACA            | CAMBAYA                       | 2912          | CAMBAYA                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 13 | TACNA  | JORGE BASADRE | ILABAYA             | ILABAYA                       | 2909          | ILABAYA                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 14 | TACNA  | JORGE BASADRE | ILABAYA             | BOROGUEÑA                     | 2910          | BOROGUEÑA                            | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 15 | TACNA  | CANDARAVE     | QUILAHUANI          | QUILAHUANI                    | 2880          | P.S QUILAHUANI                       | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 16 | TACNA  | JORGE BASADRE | ITE                 | PAMPA BAJA                    | 2901          | PAMPA BAJA                           | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 17 | TACNA  | TARATA        | HEROES ALBARRACIN   | CHUCATAMANI                   | 2925          | CHUCATAMANI                          | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 18 | TACNA  | TARATA        | ESTIQUE             | TALABAYA                      | 2927          | TALABAYA                             | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 19 | TACNA  | TARATA        | ESTIQUE-PAMPA       | ESTIQUE PAMPA                 | 2928          | ESTIQUE PAMPA                        | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 20 | TACNA  | TARATA        | SITAJARA            | SITAJARA                      | 2929          | SITAJARA                             | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 21 | TACNA  | TARATA        | SUSAPAYA            | SUSAPAYA                      | 2930          | SUSAPAYA                             | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 22 | TACNA  | TARATA        | SUSAPAYA            | YABROCO                       | 2931          | YABROCO                              | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 23 | TACNA  | TARATA        | TARUCACHI           | TARUCACHI                     | 2933          | TARUCACHI                            | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |
| 24 | TACNA  | TARATA        | TICACO              | TICACO                        | 2934          | TICACO                               | INTERNET E INTRANET | 8 Mbps                                | S/89.72           |



(\*) Tablas a utilizar, de acuerdo al ABONADO con quien suscribe el presente contrato.

(\*\*) Aplica para USUARIOS que requieran adicionalmente el servicio de INTRANET.

(\*\*\*) Es de precisar que la velocidad contratada corresponde a aquella indicada en los Contratos de Financiamiento de los Proyectos Regionales y, asimismo, Orocom se obliga a garantizar la velocidad exigida en el contrato, la cual está sujeta a la normativa vigente sobre la materia y sus respectivas modificaciones.

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**



**ABONADO**  
**LUIS RAMÓN TORRES ROBLEDO**  
**COMANDADOR REGIONAL**

00428265



ANEXO IV

COMPONENTES DEL MÓDULO DE ACCESO, INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

MÓDULO DE ACCESO TIPO A: Para establecimientos de salud

| N° | COD IAO | CODIGO RENAES | DETALLE          | CPE           | Switch de Comunicaciones | Access Point        | Impresora Multifuncional | UPS               | PC1     |
|----|---------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1  |         |               | Marca            | Nokia         | Alcatel Lucent           | Cambium Networks    | EPSON                    | POWET TITAN       | ADVANCE |
|    |         |               | Modelo           | 7850 NSG-C601 | OS6350-P10               | cnPilot E600 Indoor | C463C                    | Titan 1K. G2 220V | AH2700  |
|    |         |               | N° de serie      |               |                          |                     |                          |                   |         |
|    |         |               | Garantía         | 1 año         | 1 año                    | 1 año               | 1 año                    | 1 año             | 1 año   |
|    |         |               | De propiedad de: | Operador      | Abonado                  | Operator            | Abonado                  | Abonado           | Abonado |



MÓDULO DE ACCESO TIPO B: Para locales escolares

| N° | CODIGO RENANES | CO DIGORRENAES | DETALLE                                                        | CPE                                         | Switch de Comunicaciones                         | Access Point                                                 | Impresora Multifuncional           | UPS                                                  | PC1                                   | PC2                                   | PC3                                   | PC4                                   | PC5                                   |
|----|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  |                |                | Marca<br>Modelo<br>N° de serie<br>Garantía<br>De propiedad de: | Nokia<br>7850 NSG-C601<br>1 año<br>Operador | Alcatel Lucent<br>OS6350-P10<br>1 año<br>Abonado | Cambium Networks<br>cnPilot E600 Indoor<br>1 año<br>Operador | EPSON<br>C463C<br>1 año<br>Abonado | POWER TITAN<br>Titan 1K. G2 220V<br>1 año<br>Abonado | ADVANCE<br>AH2700<br>1 año<br>Abonado |

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Abonador: TORRES ROBLEDO  
 DNI: 00428265





**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 28938-2023-CG/GRTA-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
**REGIÓN TACNA**

**PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA**  
**CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA**  
**REGIÓN TACNA”**

**HITO DE CONTROL N° 10:**  
**“PARÁMETROS TÉCNICOS, OPERACIÓN Y**  
**MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO**  
**REGIONAL TACNA, A NOVIEMBRE DEL 2023”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:**  
**DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**TACNA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 28938-2023-CG/GRTA-SCC**

PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y  
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA”

HITO DE CONTROL N° 10: “PARÁMETROS TÉCNICOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL TACNA, A NOVIEMBRE DEL 2023”

**ÍNDICE**

| DENOMINACIÓN                                                                  | N° Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ORIGEN                                                                     | 2       |
| II. OBJETIVOS                                                                 | 2       |
| III. ALCANCE                                                                  | 2       |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL                                  | 3       |
| V. SITUACIONES ADVERSAS                                                       | 15      |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL                                | 39      |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS              | 39      |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES | 39      |
| IX. CONCLUSIÓN                                                                | 39      |
| X. RECOMENDACIÓN                                                              | 39      |
| XI. APÉNDICES                                                                 |         |



## INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28938-2023-CG/GRTA-SCC

### PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA”

#### HITO DE CONTROL N° 10: “PARÁMETROS TÉCNICOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL TACNA, A NOVIEMBRE DEL 2023”

#### I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República mediante Oficio n.° 000546-2023-CG/VCST del 7 de noviembre del 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L475-2023-097, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, del 30 de mayo del 2022 y modificatorias.

#### II. OBJETIVOS

##### 2.1 Objetivo general

Establecer si el Programa Nacional de Telecomunicaciones viene ejecutando el Período de Operación del Proyecto “*Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna*”, de acuerdo con lo establecido en las bases, el Contrato de Financiamiento y normativa vigente y aplicable.

##### 2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de control n.° 10: “*Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso del Proyecto en la región de Tacna, a noviembre del 2023*”, son los siguientes:

- Determinar si la operatividad y el mantenimiento de las Redes de Acceso se realizan de acuerdo a las bases, Contrato de Financiamiento, y normativa vigente y aplicable.
- Determinar si se han cumplido los parámetros técnicos de las redes de acceso y estos garantizan la operación y funcionalidad de la misma y si se realizan conforme a lo establecido en las bases, el contrato de financiamiento, y normatividad vigente y aplicable.
- Determinar si los pagos, las garantías y la aplicación de penalidades (de ser el caso), son conforme a Contrato de Financiamiento y normativa vigente y aplicable.
- Determinar si la supervisión de Pronatel viene cumpliendo con lo establecido en su normativa interna, vigente y aplicable.

#### III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 10: “Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso del Proyecto en la región de Tacna, a noviembre del 2023”, y ha sido ejecutado desde el 8 de noviembre de 2023 al 21 de noviembre del 2023, habiéndose realizado visitas a las instalaciones comprendidas en el Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”, en las provincias de Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave de la Región Tacna.



#### IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

##### 4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del Servicio de Control Concurrente, corresponde a la ejecución contractual del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", en sus periodos de Operación de la Red de Acceso a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones, en adelante, "Pronatel".

##### Descripción del Proyecto

El 9 de mayo de 2018 se suscribió el contrato de financiamiento con la empresa OROCOM S.A.C. para la ejecución del Proyecto, por un monto del financiamiento de US\$ 25 902 859,44 dólares americanos, considerando que la población beneficiada será de 17 401.

El Proyecto se ubica en la región de Tacna y tiene como objetivos<sup>1</sup>:

- a) Atender la demanda de acceso a internet y de acceso a intranet en cincuenta y dos (52) Localidades Beneficiarias, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas
- b) Brindar una conexión de acceso a internet e intranet a ciento tres (103) instituciones Abonadas Obligatorias conformadas por: veinticuatro (24) establecimientos de salud, once (11) comisarias y sesenta y ocho (68) locales escolares de gestión estatal.
- c) Desarrollar programas de Construcción de Capacidades, que comprenden las actividades de sensibilización y difusión, elaboración de contenidos y capacitación en cada una de las Localidades Beneficiarias.

Conforme el objetivo del Proyecto, se implementará una Red de Transporte de fibra óptica y la instalación, operación y mantenimiento de una Red de Acceso inalámbrica.

La Red de Transporte, estará conformada por cerca de seiscientos once (611) kilómetros de fibra óptica ADSS de cuarenta y ocho (48) hilos, que será desplegada sobre la infraestructura de las redes de alta tensión, media tensión eléctrica y postes en algunos tramos de las redes viales disponibles en la Región Tacna.


La Red de Acceso, es la infraestructura y el equipamiento electrónico que permitirá a los usuarios finales acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones y acceso a intranet utilizando para ellos la Red de Transporte.

A continuación de muestra una infografía con el alcance y el diseño de la infraestructura del proyecto.



<sup>1</sup> De acuerdo a lo dispuesto en la cuarta Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto.

**Imagen n.º 1**  
**Infografía del Proyecto de Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna**

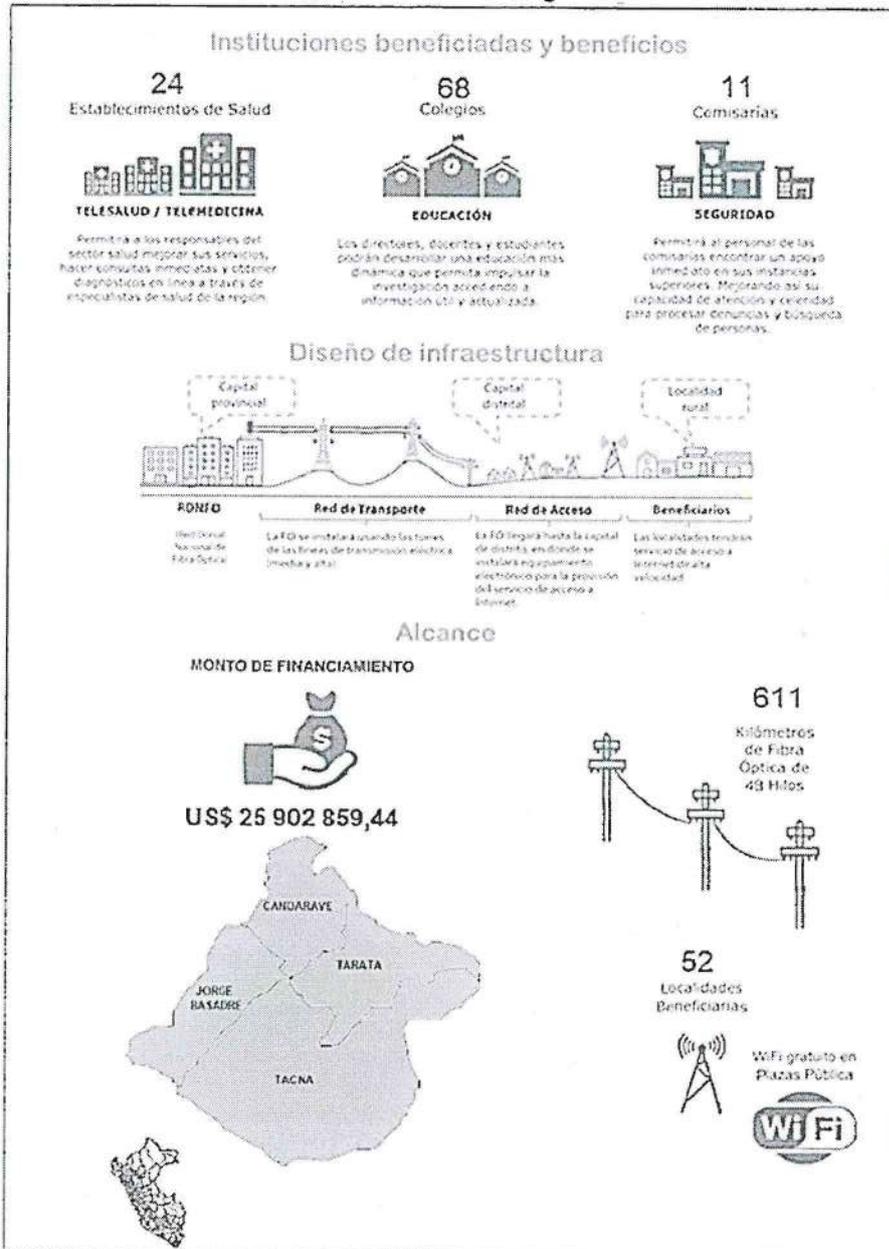

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.  
Fuente: Contrato de Financiamiento del Proyecto.

**4.2 Viabilidad del Proyecto**



El "Proyecto Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social de la Región Tacna", con código SNIP n.º 315140, fue declarado viable a nivel de Factibilidad, por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Informe Técnico n.º 414-2015-MTC/09.02, del 17 de abril del 2015, por un monto de cincuenta y un millones sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis con 00/100 soles (S/ 51 064 846,00).

El Proyecto tiene como objetivo principal, incrementar y mejorar los servicios de telecomunicaciones en los distritos de la región Tacna.

#### 4.3 Proceso de Promoción de la Inversión Privada

Mediante oficio n.º 247-2017-MTC/24 de 19 de abril de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) remitió a PROINVERSION el informe técnico del proyecto "Instalación de Banda para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", solicitándole iniciar el Proceso de Promoción de la Inversión Privada correspondientes.

Según, Acuerdo PROINVERSION n.º 5-2-2017-CPC de 24 de mayo de 2017 y publicado en el Diario oficial El Peruano el 26 de mayo de 2017, el Consejo Directivo de PROINVERSION, acordó aprobar la incorporación al proceso de promoción de la inversión privada del proyecto de "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región de Tacna".

Asimismo, en virtud del Acuerdo PROINVERSION n.º 8-2-2017-CPC de 21 de junio de 2017, sesión n.º 8, el Consejo Directivo de PROINVERSION acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada del proyecto de "Instalación de Banda para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región de Tacna".

En ese sentido, el 18 de diciembre de 2017, PROINVERSIÓN otorgó la Buena Pro del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna" al postor OROCOM S.A.C.

#### 4.4 Contrato de Financiamiento del Proyecto



El Contrato de Financiamiento no Reembolsable para la implementación, operación y mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", en adelante el "Contrato de Financiamiento del Proyecto", fue suscrito el 9 de mayo de 2018, entre el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – Fitel, ahora "Pronatel"<sup>2</sup> y la empresa OROCOM S.A.C., en adelante, el "Contratado"; con la finalidad de brindar servicios de acceso a internet e intranet de banda ancha a cincuenta y dos (52) localidades de la región de Tacna, a través de la implementación de una red de banda ancha mixta de fibra óptica y enlaces inalámbricos, definidos como Red de Transporte y Red de Acceso, respectivamente.

La inversión del Proyecto ha sido promovida bajo la modalidad de proyectos en activos, utilizando el esquema de disposición de activos, incluyendo la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de los bienes inmuebles<sup>3</sup>.

Cabe mencionar, que el referido Contrato de Financiamiento del Proyecto, también incluye la ejecución del proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua", habiendo resultado ganador de la buena pro la misma empresa.

##### 4.4.1 Objeto del Contrato de Financiamiento del Proyecto

<sup>2</sup> De acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo n.º 018-2018-MTC, que dispone la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones.

<sup>3</sup> Litera a) del artículo 31º del Decreto Legislativo n.º 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyecto en Activos.



El objeto del Contrato de Financiamiento del Proyecto, es regular la asignación del Financiamiento Adjudicado al Contratado para la ejecución del Proyecto, con la obligación de que el Contratado lo utilice bajo su cuenta y riesgo para<sup>4</sup>:

- La instalación de la Red de Transporte y de la Red del Acceso de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas.
- La operación y mantenimiento de la Red de Acceso de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas, brindando el acceso a internet e intranet en las Localidades Beneficiarias e Instituciones Abonadas Obligatorias.
- La ejecución de la Construcción de Capacidades, entendidas como el conjunto de procesos orientados a favorecer la adopción y uso de los servicios de telecomunicaciones y el acceso a Internet e Intranet por parte de la población de las Localidades Beneficiarias, además del uso de las tecnologías de la información de manera que se constituyan en una herramienta de desarrollo local. Los procesos que lo conforman son:
  - a) Sensibilización y Difusión;
  - b) Capacitación; y
  - c) Elaboración de Contenidos, en las Localidades Beneficiarias, según corresponda<sup>5</sup>.
- El cumplimiento de la oferta técnica del Contratado.
- El uso del financiamiento adjudicado para la ejecución del proyecto, para lo cual, deberá velar por su buen uso y el cumplimiento de los términos del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

Asimismo, entre otras obligaciones, el Contratado debe obtener, configurar e instalar un conjunto de Sistemas de Soporte a Operaciones y Sistemas de Soporte al Negocio (colectivamente, OSS / BSS), las cuales deben tener capacidades y funcionalidades adecuadas para garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y sensible de la Red de Transporte<sup>6</sup>.

De igual manera, el proyecto contempla la entrega de trescientos setenta y cinco (375) equipos de cómputo en las Entidades Públicas Beneficiarias: cinco (5) por cada local escolar, uno (1) por establecimiento de salud y uno (1) por dependencia policial; debiéndose capacitar a los profesionales de dichas entidades públicas<sup>7</sup>.

#### 4.4.2 Periodos en la ejecución del Proyecto

El Contrato de Financiamiento, define la ejecución del Proyecto en cuatro (4) periodos, con sus respectivos plazos, cuyo detalle se muestra a continuación:

- **Período de Inversión de la Red de Acceso:** Es el período, cuya duración máxima es hasta el 26 de mayo de 2022<sup>8</sup>, comprendiendo las actividades contempladas en la etapa de instalación (tiempo en el cual el Contratado despliega la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la Red de Acceso), así como las actividades de supervisión para dar conformidad a las instalaciones realizadas, contempladas en las especificaciones técnicas de la Red de Acceso; culminando con la suscripción del Acta de Conformidad de Instalaciones y Prueba de Servicio de la Red de Acceso.

<sup>4</sup> Cláusula Quinta del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

<sup>5</sup> Numeral 1.3.17 del TUO de las Bases de la Licitación Público Especial

<sup>6</sup> Numeral 9 del Anexo 8-A del TUO de las Bases de la Licitación Pública Especial.

<sup>7</sup> Apéndice n.° 8 del Anejo 8-B del TUO de las Bases de la Licitación Pública Especial.

<sup>8</sup> Decimosexta Adenda del Contrato de Financiamiento del Proyecto.



- **Periodo de Inversión de la Red de Transporte:** Es el período, cuya duración máxima es hasta el 7 de marzo de 2021<sup>14</sup>, comprendiendo las actividades de la etapa de instalación (tiempo en el cual el Contratado despliega la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la Red de Transporte) y la etapa de prueba; abarcando a su vez, las actividades de supervisión para dar conformidad a las instalaciones realizadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte, culminando con la suscripción del Acta de Conformidad de Instalaciones y Prueba de Servicio de la Red de Transporte.
- **Período de Operación:** Es el tiempo de duración de ciento veinte (120)<sup>9</sup> meses contados a partir del día siguiente de la culminación del Período de Inversión de la Red de Acceso, en cuyo transcurso el Contratado operará y mantendrá la Red de Acceso, para asegurar su funcionamiento y la prestación de los servicios que comprende el Proyecto Adjudicado.
- **Periodo Provisional:** Es el tiempo en que el Contratado operará y mantendrá, de ser el caso, la Red de Transporte para el uso exclusivo del Proyecto Adjudicado y permite la operación de la Red de Acceso. Dicho periodo tendrá una duración máxima de veintinueve (21)<sup>10</sup> meses, que se inician a partir del día siguiente de la culminación del Periodo de Inversión de la Red de Transporte y culmina con la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte.

La ejecución del Proyecto inició el 9 de mayo de 2018 con la suscripción del Contrato de Financiamiento, cuya conclusión del Periodo de Inversión de la Red de Acceso estuvo prevista para el 26 de mayo de 2022, de conformidad con la ampliación de plazo establecida en la Décimo Sexta Adenda del Contrato; sin embargo, la suscripción del Acta de Conformidad de Instalaciones y prueba de Servicios de la Red de Acceso, se llevó a cabo el 21 de julio de 2022, esto es casi un mes después del plazo establecido.

En cuanto a la finalización del Periodo de Inversión de la Red de Transporte, se llevó a cabo el 30 de julio de 2021, conforme lo señalado en el Acta de Inicio de Operación del Periodo Provisional de la Red de Transporte del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".

Es preciso señalar que, el Periodo de Inversión estuvo dividido en dos (2) etapas:

- a) La etapa de instalación, con una duración máxima hasta el 26 de marzo de 2022 para la Red de Acceso y hasta el 7 de enero de 2021 para la Red de Transporte y
- b) Etapa de Prueba, con una duración máxima de dos (2) meses; que inició luego de concluida la etapa de instalación.

Asimismo, el Periodo de Inversión de cada red se encuentra dividido en dos (2) etapas:

#### Red de Acceso:

- a) Etapa de Instalación, con una duración máxima hasta el 26 de marzo de 2022<sup>11</sup>.
- b) Etapa de Prueba, con una duración máxima de dos (2) meses, que inicia luego de concluida la etapa de instalación.
- c) Periodo de Operación, con una duración máxima de ciento veinte (120) meses, de suscrita el Acta de conformidad de instalaciones y pruebas de servicio de la red de acceso.

<sup>9</sup> Numeral 2.28 del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

<sup>10</sup> Numeral 2.29 de la novena Adenda.


<sup>11</sup> Decimosexta adenda del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

**Red de Transporte:**

- a) Etapa de Instalación, con una duración máxima hasta el 07 de enero de 2021<sup>12</sup>.
- b) Etapa de Prueba, con una duración máxima de dos (2) meses, que inicia luego de concluida la etapa de instalación.
- c) Período provisional, con una duración máxima de veintiún (21) meses, que inicia luego de concluida la etapa de prueba.

Los plazos máximos de los mencionados periodos y etapas del Proyecto se detallan a continuación:

**Imagen n.º 2**  
**Plazo máximo de ejecución Contractual de la Red de Acceso del Proyecto**

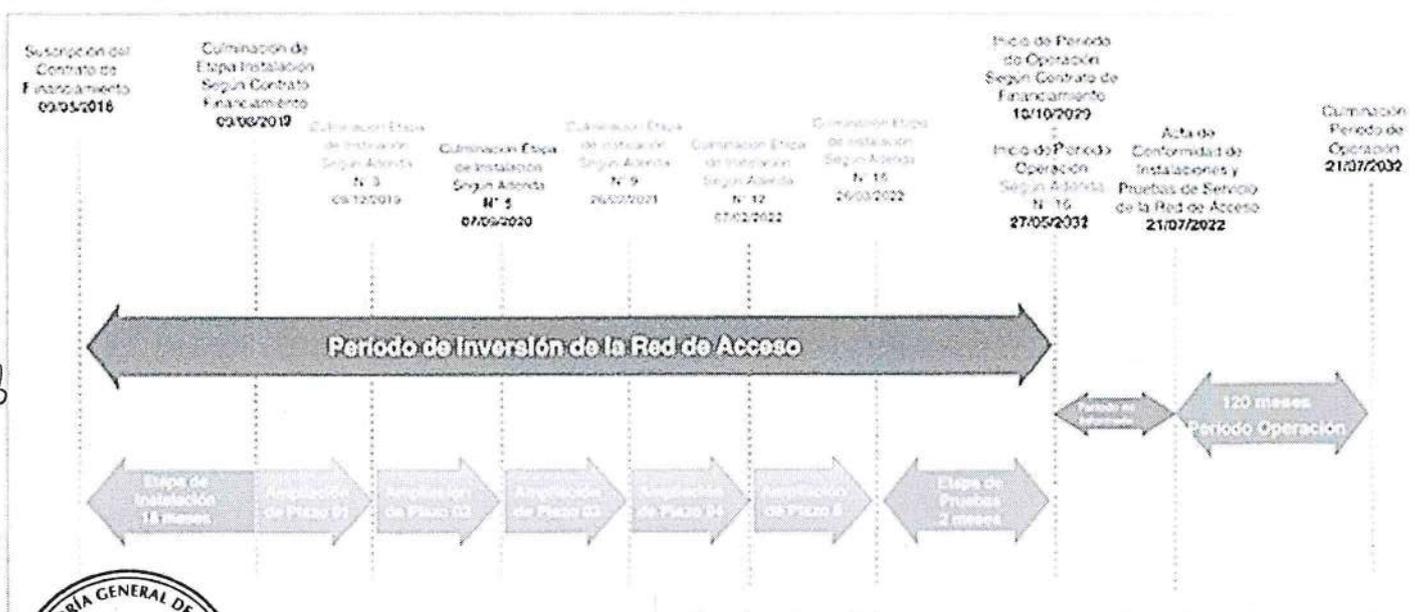


Fuente: Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SC.



<sup>12</sup> Decimosegunda Adenda del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

**Imagen n.º 3**  
**Plazo máximo de ejecución contractual de la Red de Transporte del Proyecto**

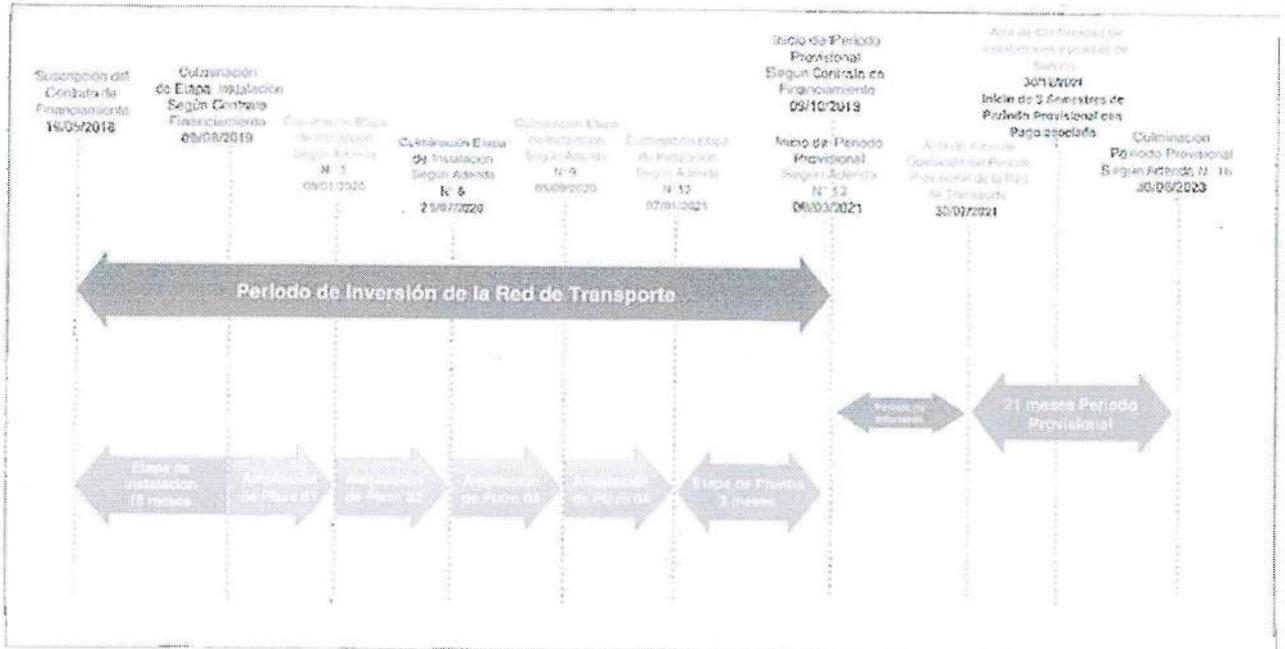

Fuente: Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SC.

Respecto a los plazos de ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Resumen E-446563-2023 que forma parte del informe n.º 5197-2023-MTC/24.09 de 11 de setiembre de 2023<sup>13</sup>, se advierte que al 30 de junio de 2023 culminó el período de operación provisional de la Red de Transporte, encontrándose aún pendiente la culminación del Hito Funcional 4 del Período de Inversión, relacionado a la transferencia de bienes de dicha red, al no haberse suscrito el Acta de Adjudicación de Bienes.

Mientras que, respecto a la Red de Acceso, a partir del 21 de julio de 2022 se dio inicio al Período de Operación, con un plazo de diez (10) años hasta el 22 de julio de 2032, habiendo concluido el primer semestre (Del 22.Jul.22 hasta el 21.Ene.23) y segundo semestre (Del 22.Ene.23 al 22.Jul.23), encontrándose en ejecución el tercer semestre (Del 23.Jul.23 al 23.Ene.23). Asimismo, respecto al Período de Inversión de la Red de Acceso, se encuentra pendiente de culminación el Hito Funcional 4, relacionado a la impartición de capacitaciones, el cual debe culminarse durante el tercer semestre de operación de dicha Red.

#### 4.5 De las Adendas al contrato por ampliación de plazo

De acuerdo al Informe de ampliaciones de plazo, adjunto al Informe n.º 5197-2023-MTC/24.09 de 11 de setiembre de 2023, alcanzado mediante el oficio n.º 1022-2023-MTC/24 de 12 de setiembre de 2023, se han suscrito diecisiete (17) Adendas, de las cuales cinco (5) de ellas corresponden a modificaciones (ampliaciones) de plazo para la etapa de inversión de la Red de Acceso y Red de Transporte, como se detalla a continuación:

<sup>13</sup> Alcanzado mediante el oficio n.º 1022-2023-MTC/24 de 12 de setiembre de 2023.

**Cuadro n.º 1**  
**Ampliaciones de Plazo en la etapa de inversión de la Red de Transporte y la Red de Acceso**

| ADENDA N° | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO DE INVERSIÓN RED TRANSPORTE | ETAPA DE INSTALACIÓN RED TRANSPORTE | ETAPA DE RECEPCIÓN RED TRANSPORTE (en meses) | PERIODO DE INVERSIÓN DE ACCESO | ETAPA DE INSTALACIÓN RED ACCESO | ETAPA DE RECEPCIÓN RED ACCESO (en meses) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 3         | Modificar el numeral 7.4 de la Cláusula Séptima, el numeral 9.5 de la Cláusula Novena y el numeral 24.3 de la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Financiamiento. Asimismo, se incorporó el "Procedimiento que regula la modificación de la Propuesta Técnica por cambio de marca, modelo de equipamiento o proveedor de infraestructura propuestos para la red de transporte y red de acceso" como Anexo n.º 13 al Contrato de Financiamiento del Proyecto | 09/10/2019                          | 09/01/2020                          | 2                                            | 09/10/2019                     | 09/12/2019                      | 2                                        |
| 5         | Modificar los numerales 2.12, 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento; el numeral 1.1 del Anexo n.º 8-A de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte; y el numeral 3.9 del Anexo N° 8-B del Proyecto                                                                                                                                                                          | 25/09/2020                          | 25/07/2020                          | 2                                            | 07/11/2020                     | 07/09/2020                      | 2                                        |
| 9         | Modificar los numerales 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento del proyecto y el numeral 1.1 del Anexo 8-A de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte y, el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones, Técnicas de la Red de Acceso                                                                                                                         | 05/11/2020                          | 05/09/2020                          | 2                                            | 26/04/2021                     | 26/02/2021                      | 2                                        |
| 12        | Modificar los numerales 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del citado Contrato; así como también el numeral 1.1 del Anexo 8-A de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte y el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso.                                                                                                                                  | 07/03/2021                          | 07/01/2021                          | 2                                            | 07/04/2022                     | 07/02/2022                      | 2                                        |
| 16        | Modificar los numerales 2.12 y 2.26 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta y el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases de los citados proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/03/2021                          | 07/01/2021                          | 2                                            | 26/05/2022                     | 26/03/2022                      | 2                                        |

Fuente: Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SC e Informe de ampliaciones de plazo, adjunto al Informe n.º 5197-2023-MTC/24.09 de 11 de setiembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe mencionar, que mediante la décima séptima adenda al contrato, se amplió el plazo del Período Provisional de la Red de Transporte a veintiún (21) meses, el mismo que culmina con el Acta de Entrega de Bienes.

#### 4.6 Financiamiento no reembolsable del Proyecto y su desembolso

El Contrato de Financiamiento del Proyecto asigna al Contratado, a título de Financiamiento No Reembolsable, el monto de veinticinco millones novecientos dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 44/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 25 902 859,44), distribuidos de la manera siguiente:

##### Proyecto Regional Tacna

- Dieciséis millones noventa mil ciento cincuenta y nueve con 57 /100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$16 090 159,57), para la instalación y operación de la Red de Acceso.
- Nueve millones ochocientos doce mil seiscientos noventa y nueve con 87/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 9 812 699,87), por la implementación de la Red de Transporte.

Los mismos que hacen un total de US\$ 25 902 859,44 para la ejecución del proyecto en la región de Tacna.



El desembolso del Financiamiento adjudicado para la ejecución del Proyecto se realiza de acuerdo con el cumplimiento de los Hitos Funcionales por parte del Contratado<sup>14</sup>, según la programación establecida (Ver Apéndice n.º 1) y la respectiva conformidad del Pronatel, el desembolso realizado hasta el mes de agosto 2023, se muestra a continuación:

**Cuadro n.º 2**  
**Detalle del desembolso del Financiamiento y Avance del Proyecto Regional Tacna**

| Tipo de Red       | Monto de Financiamiento          |                                 |                      | Monto de adelanto desembolsado (10% monto contractual)<br>US\$ | Desembolsos          |           |                                            |           |                      |            |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|
|                   | Periodo de inversión<br>US\$ (A) | Operación o provisional<br>US\$ | Total<br>US\$        |                                                                | Periodo de inversión |           | Periodo provisional / Periodo de Operación |           | Total                |            |
|                   |                                  |                                 |                      |                                                                | US\$ (B)             | %         | US\$ (C)                                   | %         | US\$ D=(B+C)         | % (D/A)    |
| Red de Acceso     | 10,780,406.91                    | 5,309,752.66                    | 16,090,159.57        | 1,609,015.96                                                   | 9 766 821,74         | 90.6      | 265,487.63 (*)                             | 5         | 10 032 309,37        | 63%        |
| Red de Transporte | 9,322,064.88                     | 490,634.99                      | 9,812,699.87         | 981,269.99                                                     | 8,340,794.89 (**)    | 89.5      | 490 634,99                                 | 100       | 8 831 429,88         | 90%        |
| <b>Total</b>      | <b>20,102,471.79</b>             | <b>5,800,387.65</b>             | <b>25,902,859.44</b> | <b>2,590,285.94</b>                                            | <b>18 107 616,63</b> | <b>91</b> | <b>756 122,62</b>                          | <b>13</b> | <b>18 863 739,25</b> | <b>73%</b> |

(\*) Corresponde al desembolso del primer semestre correspondiente al periodo de operación de la Red de Acceso al Proyecto Regional Tacna, es cual es el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2022 hasta el 21 de enero de 2023.

(\*\*) El porcentaje pendiente de desembolso corresponde al Hito Funcional n.º 4, referente a la Transferencia de los Bienes de la Red de Transporte, cuyo desembolso se realizará luego del Acta de Adjudicación de Bienes de la citada Red.

**Fuente:** Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SC e Informe n.º 5197-2023-MTC/24.09 de 11 de setiembre de 2023, alcanzado mediante el oficio n.º 1022-2023-MTC/24 de 12 de setiembre de 2023.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

De acuerdo con lo descrito en el cuadro anterior, los desembolsos realizados al mes de agosto 2023 corresponden a las actividades siguientes:

- Adelanto de US\$ 2,590,285.94, monto equivalente a la suma de 10% del valor de financiamiento de la Red de Acceso y 10% del valor de financiamiento de la Red de Transporte del Proyecto Regional Tacna.
- Red de Acceso: El desembolso de US\$ 10 032 309,37 monto equivalente al 63% del monto de Financiamiento de la Red de Acceso, correspondiente al cumplimiento de los siguientes Hitos Funcionales:
  - Hito Funcional 1: 100% de la implementación de Nodos.
  - Hito Funcional 2: 100% de la implementación de localidades beneficiarias.
  - Hito Funcional 3: 100% de la implementación de pruebas finales.
  - Hito Funcional 5: 5% del primer semestre por 20 semestres (1.65% c/u).

Cabe mencionar, que el monto pendiente de desembolsar del periodo de inversión de la Red de acceso, corresponden al Hito Funcional 4, referido a la impartición de capacitaciones, el cual debe culminarse al tercer semestre de operación de la Red de Acceso y por la retención referente a las actividades de sensibilización y difusión de acuerdo a la Décimo Séptima Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Tacna, de acuerdo a lo señalado en el Informe Resumen E-446563-2023, que forma parte del informe n.º 5197-2023-MTC/24.09 de 11 de setiembre de 2023, alcanzado mediante el oficio n.º 1022-2023-MTC/24 de 12 de setiembre de 2023.

- Red de Transporte: El desembolso de ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis con 69/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 8,674 426.69), monto equivalente al ochenta y ocho por ciento {88%} del monto de Financiamiento, correspondiente al cumplimiento de los siguientes Hitos Funcionales:
  - Hito Funcional 1: 100% de la implementación de Nodos.
  - Hito Funcional 2: 100% de la implementación del NOC y Centro de Mantenimiento.

<sup>14</sup> Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

- Hito Funcional 3: 100% de operatividad de la Red de Transporte.
- Hito Funcional 5: 68% de la implementación de Nodos.

#### 4.7 Amortización de Adelantos.

El Contratado ha solicitado un Adelanto<sup>15</sup> de dos millones quinientos noventa mil doscientos ochenta y cinco con 94/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,590,285.94), equivalente a:

- 10% del valor del Financiamiento de la Red de Acceso y,
- 10% del valor del Financiamiento de la Red de Transporte.

Los cuales fueron abonados por el Pronatel el 10 de julio de 2018, siendo amortizados en los dos (2) primeros desembolsos efectuados para la Red de Transporte y Acceso, a razón del 50% del monto de cada desembolso, como se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 3**  
**Detalle de la amortización del adelanto otorgado**

| Desembolso                                 | Amortización US\$   | Fecha      | Nº de C/P |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| Primer Desembolso de la Red de Transporte  | 490,634.99          | 04/10/2019 | 805       |
| Segundo Desembolso de la Red de Transporte | 490,634.99          | 06/11/2019 | 1072      |
| Primer Desembolso de la Red de Acceso      | 804,507.98          | 03/12/2020 | 3702      |
| Segundo Desembolso de la Red de Acceso     | 804,507.98          | 11/01/2021 | 221       |
| <b>Total, Amortizado por Adelanto</b>      | <b>2,590,285.94</b> |            |           |
| <b>Saldo para Amortizar</b>                | <b>0,00</b>         |            |           |

Fuente: Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SC.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

#### 4.8 Garantías

Para la suscripción del Contrato de Financiamiento del Proyecto, se establece como condición que el Contratado entregue una Garantía de Adelanto y una Garantía de Fiel Cumplimiento<sup>16</sup>, acorde con lo siguiente:

- **La Garantía de Adelanto:** asciende al monto de US\$ 5,444,584.01, monto equivalente a la suma del 10% del valor del Financiamiento de la Red de Acceso y del 10% del valor del Financiamiento de la Red de Transporte, del Contrato de Financiamiento del Proyecto Moquegua - Tacna.

En el cuadro inferior, se muestra el detalle de la garantía entregada por el Contratado por el proyecto regional de Tacna.

**Cuadro n.º 4**  
**Detalle de la Garantía de Adelanto**

| Proyecto | Monto de Financiamiento | Garantía (10%)    |                   |
|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Tacna    | \$ 25 902 859,44        |                   | \$ 2 590 285,94   |
|          |                         | Red de Acceso     | US\$ 1 609 015,96 |
|          |                         | Red de Transporte | US\$ 981 269,99   |

Fuente: Contrato de Financiamiento de Proyecto, cláusula quince "De las Adendas numeral 15.1".

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



<sup>15</sup> Formulario N° 1 del Anexo N° 5 del TUO de las Bases de la Licitación Pública Especial.

<sup>16</sup> Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

Sobre el particular, el Contrato de Financiamiento señala que la Garantía debe mantenerse vigente desde su entrega a Pronatel, hasta que se haya descontado el íntegro del adelanto de los desembolsos correspondientes, devolviéndose al Contratado una vez que se verifique los descuentos sobre dichos desembolsos. Asimismo, señala que el Pronatel podrá disponer su prórroga obligatoria, debiendo el Contratado renovarla por los plazos que se dispongan para dicho efecto<sup>17</sup>.

Cumpliendo con lo dispuesto anteriormente el contratado ha cumplido con entregar la Garantía de Adelanto n.º 3363-500523-02 (n.º 01070) de la aseguradora RIMAC SEGUROS con fecha de emisión 9 de octubre de 2020 y fecha de vencimiento 9 de abril de 2021, por el importe de \$ 5,444,584.01 con constancia n.º 08-2021; a la fecha, ésta Garantía ya fue devuelta por Pronatel el 16 de marzo de 2021, toda vez que los adelantos se han amortizado.

- **La Garantía de Fiel Cumplimiento;** será emitida por el monto de US\$ 5,444,584.01, equivalente a la suma del diez por ciento (10%) del financiamiento adjudicado, debiendo ser renovada anualmente a efectos de encontrarse vigente hasta el vencimiento del Contrato de Financiamiento, devolviéndose en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de realizado el último desembolso.

El detalle de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregada por el contratado, de acuerdo al proyecto regional de Tacna, se muestra a continuación:

**Cuadro n.º 5**  
**Detalle de la Garantía de Fiel Cumplimiento**

| PROYECTO | MONTO DE FINANCIAMIENTO US\$ | GARANTÍA (10%)    |                   |
|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                              | US\$ 2 590 285,94 |                   |
| TACNA    | US\$ 25 902 859,44           | Red de Acceso     | US\$ 1 609 015,96 |
|          |                              | Red de Transporte | US\$ 981 269,99   |
| -        | -                            | -                 | -                 |

Fuente: Contrato de Financiamiento de Proyecto

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente

De lo señalado anteriormente, y de la información alcanzada por la entidad, se advierte que el Contratado ha cumplido con entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento n.º 30297135-02 (Nº161418) de la aseguradora LA POSITIVA con fecha de emisión 31 de diciembre de 2022 y fecha de vencimiento 16 de setiembre de 2023.

En el caso, de que el Contratado tenga Observaciones pendientes de subsanar consignadas en el último informe de Supervisión de la Red de Acceso emitido en el Periodo de Operación, la Garantía de Fiel Cumplimiento será renovada siete (7) días calendario antes de su vencimiento por un periodo de sesenta (60) días, y así sucesivamente hasta que hayan sido subsanadas todas las observaciones.

- **Garantía por Saneamiento de Predios**

Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática a favor de PRONATEL, que deberá presentar el Contratado en caso de no lograr la inscripción de la totalidad de los títulos de propiedad ante la SUNARP de los terrenos que forman parte de los bienes de la Red de Transporte.

El Contratado debe encargarse de todos los trámites de compra e inscripción de terrenos que conforman los bienes de la Red de Transporte ante la SUNARP, entregando

<sup>17</sup> Cláusula décimo quinta del Contrato de Financiamiento del Proyecto.

mensualmente al FITEL dicha información, así como la documentación que la acredita fehacientemente, hasta la suscripción del Acta de Adjudicación de los bienes de la Red de Transporte.

En caso de no lograr la inscripción de la totalidad de los títulos de propiedad ante la SUNARP, el Contratado podrá solicitar, con la acreditación correspondiente, que PRONATEL amplíe dicho plazo hasta por cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte<sup>18</sup>, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

- a. Se tengan adquiridos el 100% de los predios para la construcción de los Nodos (Agregación Distribución y Conexión); y,
- b. Como mínimo, el 70% de los predios referidos en el literal a., deberán encontrarse debidamente inscritos en SUNARP a favor del MTC.

#### 4.9 Supervisión y control del Proyecto

Pronatel es el responsable de la supervisión y control del Proyecto en forma directa, a través de la Dirección de Supervisión de Proyectos (en adelante DSP), unidad orgánica que evalúa, supervisa y hace seguimiento del desarrollo y avances de las inversiones, actividades e intervenciones relacionadas con las telecomunicaciones, encontrándose entre ellas, las instalaciones y pruebas de la infraestructura, equipos y servicios previstos en el Contrato de Financiamiento.

#### V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la información y documentación vinculada al control realizado en el Hito de Control N° 10: "Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso, a noviembre del 2023", se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", las cuales se exponen a continuación:

1. **EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL PARA LA CULMINACIÓN DEL PERIODO PROVISIONAL DE LA RED DE TRANSPORTE, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA DÉCIMO TERCERA Y DÉCIMO SEXTA ADENDA AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO**

De acuerdo a lo previsto en el numeral 2.27 del Contrato de Financiamiento del Proyecto, el Período de Inversión de la Red de Transportes, que comprende la Etapa de Instalación y Etapa de Prueba, culmina con la suscripción del "Acta de Conformidad de Instalación y Prueba de Servicios de la Red de Transporte".

Mientras que, el numeral 2.29 del referido Contrato de Financiamiento, estableció que el Período Provisional de la Red de Transporte, para el uso exclusivo del Proyecto y para permitir la operación de la Red de Acceso, tendría una duración de dieciocho (18) meses que **debían iniciar a partir del día siguiente de la culminación del período de inversión de la Red de Transporte**, y culmina con la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte.

<sup>18</sup> Antes de la suscripción de dicha Acta el CONTRATADO deberá entregar a PRONATEL toda la documentación correspondiente a cada predio a ser transferido al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como, la correspondiente a todas las acciones realizadas en cada Nodo donde aún no se ha logrado obtener la titularidad del predio.

Posteriormente, las condiciones previstas para el inicio del Período Provisional de la Red de Transporte, fue modificado a través de la Cláusula Segunda de la Décimo Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto **suscrita el 30 de diciembre de 2021**, precisando lo siguiente:

*"(...)*  
**2.29 PERIODO PROVISIONAL:** Es el tiempo en que EL CONTRATADO operará y mantendrá, de ser el caso, la RED DE TRANSPORTE para el uso exclusivo del PROYECTO ADJUDICADO y para permitir la operación de la RED DE ACCESO. **Tendrá una duración máxima de veintiún (21) meses, que se inicia con la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PERIODO PROVISIONAL y culmina con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. (...)**". (Énfasis agregado)

Asimismo, en el numeral 6.2 de la cláusula Sexta: Vigencia del Contrato de Financiamiento de la Décimo Sexta Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto **suscrita el 20 de junio de 2022**, se estableció lo siguiente:

*"(...)* EL PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO será como máximo hasta el 26 de mayo de 2022 y **EL PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE será como máximo hasta el 07 de marzo de 2021**. Sin embargo, podrá ser prorrogado previa aprobación de FITEL y formalizado mediante adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. (...)". (Énfasis agregado)

Al respecto, el Acta de Inicio de Operación del período Provisional se suscribió el 30 de julio de 2021, según se consigna en el numeral 2.1 de la cláusula Segunda del "Acta de Conformidad de Instalación y Prueba de Servicios de la Red de Transporte", suscrita el 30 de diciembre de 2021, que indica:

*"(...)* que conforme al numeral 2.27 de la Cláusula Segunda del Contrato de Financiamiento de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", modificado mediante la Décimo Segunda Adenda del mencionado contrato, se establece que el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE culmina con la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PERIODO PROVISIONAL. Cabe mencionar que, **el ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PERIODO PROVISIONAL fue suscrita el 30 de julio de 2021**; estableciéndose que en dicha fecha finalizó el periodo de inversión de la red de transporte. (...)". (Énfasis agregado)

Por ende, el período Provisional de la Red de Transporte debió iniciar el 30 de julio de 2021, y culminar el 30 de abril de 2021, como se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 6**  
**Plazos máximos de culminación de la Red de Transporte según Contrato y Adendas n.º 13 y n.º 16<sup>19</sup>**

| TIPO DE RED       | PERIODO CONTRACTUAL   | PLAZO MÁXIMO SEGÚN ADENDAS | FECHA LIMITE SEGÚN ADENDAS |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| RED DE TRANSPORTE | Etapas de instalación | 20 meses                   | 07/01/2021 <sup>20</sup>   |

<sup>19</sup> Actualizado mediante el memorando n.º 8544-2023-MTC/24.09 de 23 de octubre de 2023.

<sup>20</sup> Según lo estipulado en la "CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES" de la Adenda n.º 16 suscrita el 20 de junio de 2022, que indica lo siguiente: **"(...) 2.12 ETAPA DE INSTALACIÓN:** Es el tiempo en el cual EL CONTRATADO despliega la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la RED DE ACCESO y RED DE TRANSPORTE, cumpliendo las disposiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El plazo máximo (...) para culminar esta etapa para la red de transporte será hasta el 07 de enero de 2021 (...)".

| TIPO DE RED | PERIODO CONTRACTUAL               | PLAZO MÁXIMO SEGÚN ADENDAS | FECHA LIMITE SEGÚN ADENDAS |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             | Periodo de Inversión              | 22 meses                   | 07/03/2021 <sup>21</sup>   |
|             | Periodo provisional <sup>22</sup> | 21 meses                   | 30/04/2023 <sup>23</sup>   |

Fuente: Adenda Décimo Tercera y Adenda Décimo Sexta al Contrato de Financiamiento.  
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

En ese orden de ideas, el Periodo Provisional de la Red de Transportes debió culminar el 30 de abril de 2023, y debió finalizar con la suscripción del "Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte"; sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe no se ha suscrito.

En tal sentido, los hechos expuestos, generan incertidumbre sobre la fecha real y concreta de la duración y culminación del Periodo Provisional, así como, atrasos en la culminación del proyecto.

Finalmente, lo advertido no se condice con el principio de enfoque de resultado, en virtud del cual, en el desarrollo de sus funciones, las entidades públicas adoptan las acciones que permitan la ejecución de la inversión privada dentro de los respectivos plazos.

Los hechos descritos han vulnerado la normatividad siguiente:

- Contrato de Financiamiento del Proyecto "Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", suscrito el 9 de mayo de 2018.

*"CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATO  
El CONTRATADO asume las siguientes obligaciones:*

*(...)*

*7.2 Cumplir los plazos y las metas contempladas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO y en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo N° 3 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO salvo los supuestos de prorrogas establecidas de conformidad con el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO (...)"*

- Décimo Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento no reembolsable de los proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", suscrita el 30 de diciembre de 2021.

*"CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA*

*(...)*

*2.3 Modificar el numeral 2.29 de la cláusula segunda, conforme a los siguiente: 2.29 periodo provisional: es el tiempo en que el contratado mantendrá, de ser el caso, la red de transporte para el uso exclusivo del proyecto adjudicado y para permitir la operación de la red de acceso. Tendrá una duración máxima de veintiún (21) meses, que se inicia con la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO*



<sup>21</sup> Según lo estipulado en la "CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO" de la adenda n.° 16, que indica lo siguiente: "(...) EL PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE será como máximo hasta el 07 de enero de 2021 (...)".

<sup>22</sup> Modificado por la Adenda Décimo Tercera, la cual indica que, el Periodo Provisional se inicia con la suscripción del Acta de Inicio de Operación del Periodo Provisional suscrita el 30 de julio de 2021 y culmina a los 21 meses, con la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte.

<sup>23</sup> Según lo estipulado en el numeral "2.3 Modificar el numeral 2.29 de la cláusula Segunda" de la Adenda Décimo Tercera suscrita el 30 de diciembre de 2021, que indica lo siguiente: "(...) 2.29 PERIODO PROVISIONAL: Es el tiempo en que el contratado operará y mantendrá, de ser el caso. La RED DE TRANSPORTE para el uso exclusivo del proyecto adjudicado y para permitir la operación de la RED DE ACCESO. Tendrá una duración máxima de veintiún (21) meses (...)".

*PROVISIONAL y culmina con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE (...)*

*“CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO*

*(...)*

*6.2 EL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO será como máximo hasta el 26 de mayo de 2022 y EL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE será como máximo hasta el 07 de marzo de 2021. Sin embargo, podrá ser prorrogado previa aprobación del FITEL y formalizado mediante adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO”.*

- **Decreto Legislativo n.º 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión privada mediante Asociaciones Público, Privadas y Proyectos en activos, del 21 de julio de 2018.**

*“TÍTULO I TÍTULO PRELIMINAR*

*Artículo 4. Principios*

*(...)*

*3. Enfoque de resultados: Las entidades públicas señaladas en el artículo 2, en el desarrollo de sus funciones, adoptan las acciones que permitan la ejecución de la inversión privada dentro de los respectivos plazos, evitan retrasos derivados de meros formalismos; así como, identifican, informan e implementan acciones orientadas a resolver la problemática que afecta los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo. Constituyen reglas para la aplicación de este principio en la toma de decisiones de las entidades públicas referidas en el artículo 2, las siguientes:*

- Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por la que permita la ejecución del proyecto en los plazos correspondientes, la que promueva la inversión, la que garantice la disponibilidad del servicio, la que permita alcanzar o mantener los niveles de servicio del proyecto, o la que resulte más conveniente en términos de costos, eficiencia o sostenibilidad.*
- En todas las fases del proyecto, se da celeridad a las actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en meros formalismos.*
- En el caso de controversias durante la ejecución del proyecto, cuando se cuente con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan determinar que es más conveniente, en términos de costo beneficio, optar por el trato directo, en lugar de acudir al arbitraje, se opta por resolver dichas controversias mediante trato directo.*

*(...)*

La situación expuesta, evidencia que no se ha culminado el Periodo Provisional de la Red de Transporte, incumpliendo lo establecido en la Adenda Décimo Tercera y Adenda Décimo Sexta al Contrato de Financiamiento, generando atrasos en la culminación del proyecto, y por ende no se cumpla los objetivos y fines previstos.



2. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS DE LA RED DE TRANSPORTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES, GENERA INCERTIDUMBRE EN LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES Y EN LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO.

El Contrato de Financiamiento del Proyecto, estableció en el numeral 2.6 Bienes de la Red de Transporte<sup>24</sup>, lo siguiente:

*“Son todos los bienes muebles e inmuebles que integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Estos bienes serán de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien suscribirá dicha acta en representación del MTC”.*

Mientras que, el Anexo N° 8-A del Texto Único Ordenado las Bases, referido a las Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte, estableció en el literal 3.1.1 del numeral 3 lo siguiente:

*“El CONTRATADO es responsable de adquirir el terreno para la construcción del Nodo, así como del saneamiento y registro del bien inmueble, conforme las condiciones y procedimientos establecidos en el Apéndice N° 5 del presente Anexo: “Procedimiento de Adquisición de Terrenos”.*

Asimismo, el apéndice n.° 5 “Procedimiento de Adquisición de Terrenos y/o Predios” del Anexo n.° 8-A de las Bases, referido a las Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte, estableció lo siguiente:

*“(…) El CONTRATADO debe encargarse de todos los trámites de compra e inscripción de terrenos que conforman los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, entregando al FITEL dicha información mensualmente, así como la documentación que la acredita fehacientemente la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO”.*

Por otro lado, de acuerdo a los apéndices n.°s 1-A, 1-B y 1-C del anexo n.° 8-A del Texto Único Ordenado de las Bases, se identificó que el proyecto para la región de Tacna, contempló la construcción e instalación de veintinueve (29) Nodos de la Red de Transporte y un (1) Centro de Mantenimiento, dentro de las cuatro (4) provincias de la región de Tacna.

En ese sentido, considerando que la Cláusula Segunda de la Décimo Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto, suscrita el 30 de diciembre de 2021, modificó el plazo de la ejecución del Período Provisional de la Red de Transporte a veintiún (21) meses, computados desde el 30 de julio de 2021, fecha en que se suscribió el Acta de Inicio de Operación del período Provisional, dicho Período **debió culminar el 30 de abril de 2023**, con la inscripción de la totalidad de los predios de la Red de Transporte ante SUNARP a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

<sup>24</sup> RED DE TRANSPORTE: Es la red de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, diseñada sobre la base del tendido de fibra óptica con esquema de redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, según lo previsto en el Numeral 7.4 del Artículo 7° de la Ley n.° 29904, Ley de Promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica.

En esa línea, la Comisión de Control mediante oficio n.° 001030-2023-CG/GRTA de 12 de setiembre de 2023, solicitó a Pronatel el informe detallado del estado situacional del proyecto, recibiendo respuesta con oficio n.° 1064-2023-MTC/24 de 29 de setiembre de 2023, a través del cual, se remitió la información solicitada permitiendo a la Comisión de Control corroborar que los predios donde se han construido los nodos correspondientes a la Red de Transporte, no alcanzaron el 100% de su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Registro de los Predios – SUNARP, como se muestra a continuación:

**Cuadro n.° 7**  
**Detalle del estado situacional de la inscripción de los Predios ante SUNARP a nombre del MTC**

| CÓDIGO     | DENOMINACIÓN   | TIPO                        | ESTADO DEL SITIO ACTUAL | N° PARTIDA | TITULO        |
|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| TA_C_0001  | TACNA          | CM DE LA RED DE TRANSPORTE  | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0001  | TACNA          | NOC DE LA RED DE TRANSPORTE | INSCRITO EN RRPP        | -          | -             |
| TA_T_0002  | ZOFRATACNA     | CONEXIÓN                    | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0003  | LA ESPERANZA   | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | -          | -             |
| TA_T_0004  | CALANA         | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0005  | CIUDAD NUEVA   | DISTRIBUCIÓN                | CONTINGENCIA            | -          | -             |
| TA_T_0006  | SAMA GRANDE    | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0007  | PACHIA         | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0008  | PALCA          | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20064607  | 2019-00633412 |
| TA_T_0009  | POCOLLAY       | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | 11119848   | 2019-01597875 |
| TA_T_0010  | LAS YARAS      | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0011  | ALFONSO UGARTE | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20027196  | 2019-02801506 |
| TA_T_0012  | LOS PALOS      | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20051155  | 2019-00287639 |
| TA_T_0013  | CANDARAVE      | AGREGACIÓN                  | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0014  | CAIRANI        | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0015  | ALTO CAMILACA  | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0016  | CURIBAYA       | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20044839  | 2019-00292125 |
| TA_T_0017  | HUANUARA       | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0018  | QUILLAHUANI    | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0019  | LOCUMBA        | AGREGACIÓN                  | INSCRITO EN RRPP        | -          | -             |
| TA_T_0020  | ILABAYA        | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0021  | ITE            | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20064071  | 2019-02707100 |
| OTA_T_0022 | TARATA         | AGREGACIÓN                  | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0023  | CHUCATAMANI    | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0024  | ESTIQUE        | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0025  | ESTIQUE-PAMPA  | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0026  | SITAJARA       | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20047530  | 2019-02801505 |
| TA_T_0027  | SUSAPAYA       | DISTRIBUCIÓN                | COMPRADO                | -          | -             |
| TA_T_0028  | TARUCACHI      | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | P20048807  | 2019-02759785 |
| TA_T_0029  | TICACO         | DISTRIBUCIÓN                | INSCRITO EN RRPP        | -          | -             |

Fuente: Oficio n.° 1064-2023-MTC/24.11 de 29 de setiembre de 2023.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Así pues, luego de la revisión selectiva respecto del saneamiento de la propiedad de los treinta (30) predios de la Red de Transporte del Proyecto en la región de Tacna, se verificó que, dieciocho (18) de ellos se encuentran pendientes de inscripción ante la Superintendencia Nacional de



Registros Públicos (SUNARP), a pesar de haber superado el plazo para la culminación del Período Previsional de la Red de Transporte (30 de abril de 2023), mientras que doce (12) de los predios descritos en el cuadro anterior lograron su inscripción ante SUNARP representando el 40% del total de predios.

Cabe mencionar, que la situación expuesta fue revelada en el Informe de Hito de Control n.° 026-2023-OCI/6403-SCC (Hito n.° 8) comunicado al Director Ejecutivo de PRONATEL, con memorándum n.° 473-2023-MTC/24.04 de 18 de julio de 2023, sin que a la fecha se hubiera corregido, habiendo vencido el plazo para el seguimiento a las acciones adoptadas por la Entidad, según lo dispuesto en el literal i) del numeral 6.1.8.2 de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM aprobado con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG<sup>25</sup>.

Los hechos descritos han vulnerado la normatividad siguiente:

- **Contrato de Financiamiento del Proyecto “Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”, suscrito el 9 de mayo de 2018.**

**“CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES**

*Toda referencia efectuada en este documento de Clausula, Numeral, Literal, Apéndice y Anexo, deberá entenderse efectuada a las cláusulas, Numerales, Literales, Apéndices y Anexos contenidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo indicación expresa en sentido distinto*

(...)

**2.6. BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE:** *Son todos los bienes muebles e inmuebles que integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a los establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Estos bienes serán de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripción del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien suscribirá dicha acta en representación del MTC.*

(...).”

**“CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO**

*El contratado asume las siguientes obligaciones*

(...)

**7.33.** *Transferir a favor del MTC la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.*

**7.34.** *Asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento físico legal dispuesto por las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN (...).”*

- **Décima Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento no reembolsable del proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna”, suscrita el 30 de diciembre de 2021.**

**“CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA**

<sup>25</sup> *“El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas en los informes de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Control Visita de Control o Informe de Control de Orientación de Oficio, es de cuarenta y cinco días (45) días calendarios desde la notificación del informe a la entidad o dependencia. El referido plazo, por única vez puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco días (45) días calendarios adicionales, a solicitud del titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del jefe de comisión u OCI a cargo de su seguimiento (...).”*

(...)

2.3 Modificar el numeral 2.29 de la cláusula segunda, conforme a los siguiente: 2.29 periodo provisional: es el tiempo en que el contratado mantendrá, de ser el caso, la red de transporte para el uso exclusivo del proyecto adjudicado y para permitir la operación de la red de acceso. Tendrá una duración máxima de veintiún (21) meses, que se inicia con la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO PROVISIONAL y culmina con la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE (...)"

- **Bases de la Licitación Pública Especial "Proceso de Promoción de la Inversión privada para la Ejecución de los Proyectos: Instalación de Banda ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", aprobada mediante la circular 11 del 1 de diciembre de 2017.**

"Apéndice n.º 5 Procedimiento de Adquisición de Terrenos y/o Predios

1. Adquisición vía compra – venta del Terreno y/o Predios

(...)

EL CONTRATADO debe encargarse de todos los tramites de compra e inscripción de terrenos que conforman los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP, entregado al FITEL dicha información mensualmente, así como la documentación que la acredita fehacientemente, hasta la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a los establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

(...).

4. Procedimiento excepcional en caso de no lograr la inscripción de la totalidad de los títulos de propiedad ante la SUNARP antes de la suscripción del Acta de Adjudicación de los Bienes de la Red de Transporte.

"En caso de no lograr la inscripción de la totalidad de los títulos de propiedad ante la SUNARP en la oportunidad indicada en el numeral 1 del presente apéndice, EL CONTRATADO podrá solicitar con la acreditación correspondiente, que el FITEL amplie dicho plazo hasta por cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

- a. Se tengan adquiridos y en posesión del CONTRATADO el 100% de los predios para la construcción de los Nodos (Agregación Distribución y Conexión); y,
- b. Como mínimo, el 70% de los predios referidos en el literal a., deberán encontrarse debidamente inscritos en SUNARP a favor del MTC (...)"

Lo antes mencionado, evidencia que a la fecha de cierre del presente informe, la inscripción de los predios adquiridos donde se ha construido los nodos de la Red de Transporte, no alcanzaron el 100% de su inscripción ante SUNARP, generando incertidumbre en la disposición de los bienes y en la culminación del Proyecto.

**3. DEFICIENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO DE NODOS DEL PROYECTO Y OBSTRUCCIÓN DE SU ÚNICO ACCESO, GENERA RIESGO A SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS INSTALADOS**

Como parte de las inspecciones físicas, efectuadas por la comisión de control el día 16 de noviembre de 2023 del presente año, se efectuó la visita de inspección a los Nodos de Transporte y Acceso de la Región, identificando lo siguiente:



**Nodo de Distribución TA-T-0029-TICACO de la Red de Transporte**

Durante la visita al nodo se advirtió que presenta deficiencias en la red de energía eléctrica y seguridad, conforme se encuentra detallado en el Acta de Visita de Inspección de 16 de noviembre de 2023, las mismas que se describen a continuación:

- **Red Eléctrica:** Se identificó que una luminaria en la Sala de Equipos no enciende, causando poca visibilidad en labores de mantenimiento que deben efectuarse periódicamente, como se muestra a continuación:

Imagen n.º 4

Luminaria averiada en sala de equipos en nodo TA-T-0029-TICACO



Fuente: Toma fotográfica realizada en la visita de inspección de 16 de noviembre de 2023.

Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

- **Generador de Energía:** Cuenta con un Grupo electrógeno de marca Gamma modelo GYLS-14i, el mismo que al momento de la visita contaba con un nivel de combustible de 38% del volumen total, lo cual pone en riesgo que, ante un corte de fluido eléctrico no se garantice la operatividad del nodo por 72 horas conforme a la Propuesta Técnica Definitiva, aspecto consignado en el Acta de Visita de Inspección, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro n.º 8

Extracto de las características del grupo electrógeno en Nodo TA-T-0029-TICACO recabadas en el Acta de Inspección

| 3 |   | 3 |                                                                                 | ENERGÍA ELÉCTRICA |          |              |       |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------|
| 3 | 3 | 1 | MEDIDOR DE LUZ EXTERNO (220 VAC.)                                               |                   |          | 1            | 228 V |
| 3 | 3 | 2 | GRUPO ELECTRÓGENO INSONORO 14KVA                                                | GAMMA             | GPLS-14i | 1            | 1     |
| 3 | 3 | 3 | TIEMPO DE ESPERA DE ENCENDIDO DEL GRUPO ELECTRÓGENO ANTE CORTE ELÉCTRICO        |                   |          | 30 s         | 30 s  |
| 3 | 3 | 4 | VOLTAJE PRODUCIDO POR EL GRUPO ELECTRÓGENO LUEGO DE 4 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO |                   |          | 220 v +/- 5% | 224V  |
| 3 | 3 | 5 | NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTRÓGENO                                      |                   |          | >30%         | 38%   |

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

Fuente: Acta de Visita de Inspección al Nodo TA-T-0029-TICACO de la red de Transporte.



- **Seguridad de ingreso:** Se evidenció un montículo de material de construcción frente a la única puerta de ingreso al nodo, causando inconvenientes en el ingreso a las instalaciones del mismo, como se muestra a continuación:

**Imagen n.º 5**  
**Obstrucción en el ingreso a nodo TA-T-0029-TICACO**




Fuente: Toma fotográfica realizada en la visita de inspección de 16 de noviembre de 2023.  
Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

**Nodo de Acceso TA-A-4013-TICACO de la Red de Acceso**

De la visita de inspección realizada al referido Nodo de Acceso, se pudo advertir que el único equipo contra incendios, extintor de fuego se encuentra con fecha de recarga vencida (octubre 2023); por lo cual, las estructuras, equipos y accesorios de Telecomunicaciones se encuentran vulnerables ante un amago de incendio, pues no se podría salvaguardar la integridad física del personal, ni de los equipos instalados. A continuación, se muestran imágenes que evidencian lo señalado:

**Imágenes n.ºs 6 y 7**

**Equipo contra incendios vencido en Nodo de la Red de Acceso TA-T-4013-TICACO**

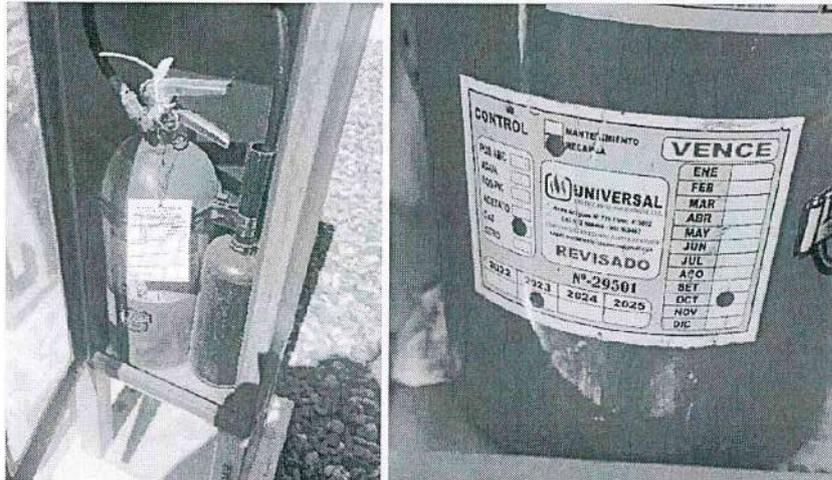

Fuente: Toma fotográfica realizada en la visita de inspección de 16 de noviembre de 2023.  
Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



Los hechos descritos limitan el cumplimiento de la normativa siguiente:

- Contrato de Financiamiento del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna”, suscrito el 9 de mayo del 2018.

**“CLAUSULA QUINTA: OBJETO**

5.1 El objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es regular la asignación del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO para la ejecución del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Tacna (...), con la obligación de que el CONTRATADO lo utilice por su cuenta y riesgo para:

d) El cumplimiento de la Oferta Técnica del CONTRATADO; y (...)”

**“CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO**

(...)

7.4 Cumplir con los compromisos asumidos en su propuesta técnica, Anexo N°2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO”.

- Propuesta Técnica definitiva (PTD) presentada por la empresa Orocom S.A.C. para la ejecución del proyecto regional Tacna, aprobada mediante oficio n.° 1402-2019-MTC/24 del 20 de septiembre del 2020.

**“ANEXO PARTE 4 – INFRAESTRUCTURA DE NOC, NODOS Y CM NODOS**

**1. NODOS DE DISTRIBUCIÓN**

Memorias Descriptiva y Cálculo – N. Distribución

1. MD y MC Instalaciones Eléctricas Distribución

(...)

2.3.1 Grupo Electrónico

(...)

El Grupo Electrónico será ubicado en la sala de fuerza, los cuales se encontrarán en todos los casos en condiciones de arrancar y tomar el 100% de la carga en forma inmediata.

Los grupos electrónicos por instalar son nuevos y son capaces de mantener el 100% de su capacidad nominal en forma continua, potencia prime, bajo régimen de servicio pesado, es decir, partidas y paradas frecuentes. Los grupos electrónicos son de la marca Gamma y están diseñados para este proyecto, se encuentra montado en un reservorio de combustible que a la vez es la base del equipo con una capacidad tal que permite una autonomía mínima de 72 horas sin atención.

(...)”

**“2. NODOS DE CONEXIÓN**

Memorias Descriptiva y Cálculo – N. Conexión

3. MD y MC Instalaciones Eléctricas Distribución

(...)

2.3.1 Grupo Electrónico

(...)

El Grupo Electrónico será ubicado en la sala de fuerza, los cuales se encontrarán en todos los casos en condiciones de arrancar y tomar el 100% de la carga en forma inmediata.



Los grupos electrógenos por instalar son nuevos y son capaces de mantener el 100% de su capacidad nominal en forma continua, potencia prime, bajo régimen de servicio pesado, es decir, partidas y paradas frecuentes. Los grupos electrógenos son de la marca Gamma y están diseñados para este proyecto, se encuentra montado en un reservorio de combustible que a la vez es la base del equipo con una capacidad tal que permite una autonomía mínima de 72 horas sin atención.  
(...)"

- Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1, Extintores Portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.

#### **"6. REQUISITOS GENERALES**

##### **6.1 Responsabilidad**

6.1.1 El propietario u ocupante de una instalación donde están situados los extintores tendrá a su cargo el cuidado y uso de estos en todo momento para lo cual contratará el servicio de mantenimiento y/o recarga y/o prueba hidrostática y que este sea realizado por empresas de mantenimiento y recarga competentes de acuerdo a lo indicado en 4.16 (...)"

- Ley n.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 de agosto de 2011.

##### **"Artículo 36°**

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea (...), los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos para la salud en el trabajo.  
(...)"

##### **Artículo 77°**

Protección de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros  
Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo".

- Decreto Supremo n.º 005-2012-TR, Reglamento de la Ley n.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, publicado el 25 de abril de 2012.

##### **"Artículo 82°. - El empleador está obligado a:**

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57° de la Ley medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50° de la Ley (...)"

La situación expuesta, afecta el adecuado desarrollo de los mantenimientos periódicos, además de no garantizar el normal funcionamiento del Nodo ante posibles cortes de energía, poniendo en riesgo la seguridad del personal y los equipos ante situaciones de siniestros, cuya atención oportuna puede verse afectada ante la obstrucción del único acceso a la infraestructura.



4. DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA EN INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA, PODRIA GENERAR POTENCIAL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, OCASIONANDO DAÑOS EN EL PERSONAL ABONADO, ASI COMO FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN.

Durante la visita de inspección física a los Nodos de Acceso y Transporte del Proyecto realizada del 13 al 17 de noviembre del presente, también se efectuó las visitas de inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias, entre ellas la Comisaria Rural Ticaco, según Consta en el Acta de Visita de Inspección a la Institución Abonada Obligatoria del 16 de noviembre del 2023, en la cual se pudo evidenciar en la lectura de resistividad del terreno, efectuada con el equipo Telurómetro proporcionado por la empresa Contratista, presenta una medida de 22.30 Ohmios.

No obstante, según lo indicado en el numeral III Sistemas de Puesta a Tierra – SPAT del Apéndice n.° 21 Consideraciones técnicas de los Nodos de la Red de Acceso del Anexo 8-B del Texto Único Ordenado de las Bases – Especificaciones técnicas de la Red de Acceso, establece que el SPAT no deberá superar los **5 Ohmios** para los equipos, torres y pararrayos, la situación descrita se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 8

Lectura de resistencia en Pozo a Tierra en IAO Comisaría PNP de Ticaco



Fuente: Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 16 de noviembre de 2023.

Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



De lo anteriormente indicado, se tiene que, ante la presencia de descargas eléctricas por cortocircuitos, se podría originar accidentes por electrocución para el personal abonado, personal técnico o provocar fallas durante la operación y funcionamiento en los equipos electromecánicos y equipos pertenecientes a la red de datos en la Institución Abonada Obligatoria verificada. Dicha visita evidencia falta de mantenimiento preventivo en los sistemas de puesta a tierra de las instalaciones pertenecientes a la red de acceso del proyecto.

Los hechos descritos vulneran la normatividad siguiente:

- **Código Nacional de Electricidad (utilización), aprobado con Resolución Ministerial n.º 037-2006-MEM/DM**

(...)

*Definiciones*

(...)

*Puesta a tierra: Camino conductivo permanente y continuo con capacidad suficiente para conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que le sea impuesta por diseño, de impedancia suficientemente baja para limitar la elevación de tensión sobre el terreno y facilitar la operación de los dispositivos de protección en el circuito (...)*

(...)

*Sistema de puesta a tierra: Comprende todos los conductores, conectores abrazaderas, placas de conexión a tierra o tuberías, y electrodos de puesta a tierra por medio de los cuales la instalación eléctrica es conectada a tierra.*

*060-002 Objetivo*

*(...) La puesta a tierra y el enlace equipotencial deben ser hechos de tal manera que sirvan para los siguientes propósitos:*

*(a) Proteger y cuidar la vida e integridad física de las personas de las consecuencias que puede ocasionar una descarga eléctrica, y evitar daños a la propiedad, enlazando a tierra las partes metálicas normalmente no energizadas de las instalaciones, equipos, artefactos, etc.; y*

*(b) Limitar las tensiones en los circuitos cuando queden expuestos a tensiones superiores a las que han sido diseñados; y*

*(c) En general, para limitar la tensión de fase a tierra a 250 V, o menos, en aquellos circuitos de corriente alterna que alimentan a sistemas de alambrado interior; y*

*(d) Limitar las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas en aquellos circuitos que están expuestos a estos fenómenos; y*

*(e) Facilitar la operación de equipos y sistemas eléctricos. (...)*

- **Contrato de Financiamiento del Proyecto "Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", suscrito el 9 de mayo de 2018.**

**"CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO**

*EL CONTRATADO asume las siguientes obligaciones:*

(...)

*7.3 Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS y sus apéndices".*

**"ANEXO N° 8-B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ACCESO**

(...)

**6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACCESO**

**6.2 Mantenimiento**

*6.2.4 Los mantenimientos preventivos están dirigidos a todos los Nodos involucrados para proveer los servicios indicados en el presente Anexo a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.*

(...)



Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MODULOS DE ACCESO a proporcionar por el CONTRATADO, también deberán incluirse en la programación del mantenimiento correctivo y preventivo, según corresponda (...)

Apéndice N° 21

Consideraciones técnicas de los Nodos de la RED DE ACCESO

III Sistemas de puesta a tierra – SPAT

(...)

- En los Nodos de la Red de Acceso, el SPAT no deberá superar los 5 Ohmios para los equipos, torres y pararrayos.
- Para el caso de la protección de equipos electrónicos; para el caso de los motores, tableros entre otros, el valor podrá incrementarse hasta diez (10) Ohmios”.

La situación expuesta, genera inseguridad en el sistema de protección ante descargas eléctricas, lo cual podría afectar la integridad física del personal abonado, personal técnico de mantenimiento y/o la funcionalidad de las redes de telecomunicaciones ante posibles fallas en los equipos instalados.

5. **CARENCIA DE SUPERVISIÓN ÍNTEGRA AL FUNCIONAMIENTO CONTINUÓ DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, NO PERMITE ADVERTIR LA INOPERATIVIDAD Y/O DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN DESMEDRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASÍ COMO, EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS SIN CUMPLIR LOS FINES PREVISTOS.**

Durante los días 13, 14, 16 y 17 de noviembre, se efectuó visitas de inspección a las Instituciones Obligatorias Abonadas, identificando que, en algunas Instituciones Educativas, el Proyecto no viene cumpliendo sus objetivos, al identificarse lo siguiente:

- **Visita de Inspección a la Institución Inicial n.º 326.**

En la localidad de Alto Camilaca de la Provincia de Candarave, se ubica la Institución Educativa Inicial n.º 326, la misma que forma parte de las instituciones beneficiadas con el Proyecto, en la cual se efectuó la instalación del Módulo de Acceso y Sistema Puesta a Tierra conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.

Sin embargo, según consta en el Acta de Visita a la Institución Educativa de 13 de noviembre de 2023, la Directora encargada manifestó:

*“(…) Desde marzo 2022, la IEI no cuenta con energía eléctrica, por lo cual no ha podido utilizar los equipos del Proyecto de Pronatel, ha realizado requerimientos de Instalación de Energía a la UGEL Candarave y a la Municipalidad de Camilaca, sin éxito a la fecha, por lo cual tiene guardados los equipos de PRONATEL y no han sido utilizados a la fecha. Asimismo, refiere que se encuentra encargada de la IEI desde marzo 2022 y no ha sido capacitada por PRONATEL a la fecha”.*


Situación que se puede advertir en las imágenes que se muestran a continuación:



**Imagen n.º 9**  
Carencia de medidor y conexión de suministro eléctrico



**Imagen n.º 10**  
Carencia de suministro eléctrico

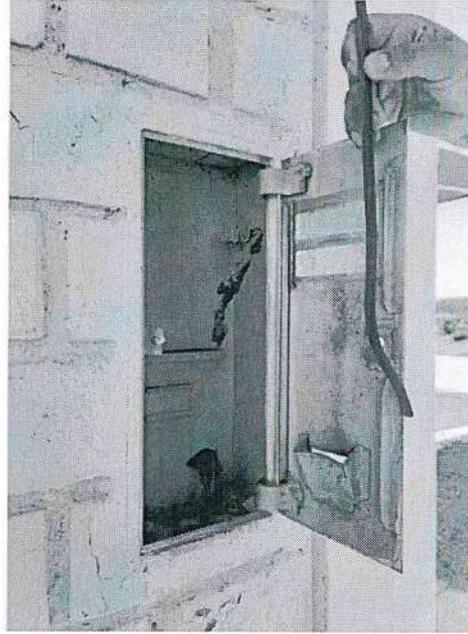

**Imagen n.º 11**  
Instalación de Pararrayos



**Imagen n.º 12**  
Instalación de pararrayos 31/07/2020



Fuente: Tomas fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 13 de noviembre de 2023.


Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



**Imagen n.º 13**  
Aula de la I.E.I. donde se instaló el módulo de Acceso




**Imagen n.º 14**  
Los equipos del proyecto se encuentran guardados en sus cajas

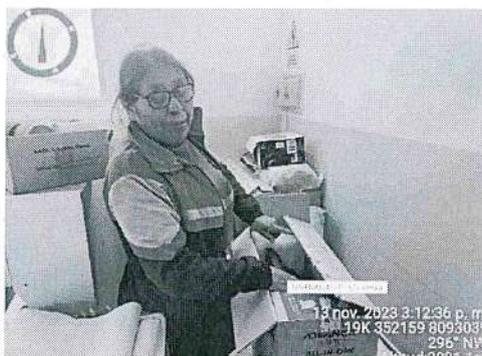

**Imagen n.º 15**  
Instalación de los puntos de red del proyecto



**Imagen n.º 16**  
Vista interna del gabinete de pared con equipos de red instalados en la IEI

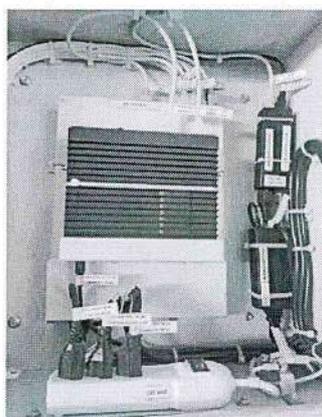

**Imagen n.º 17**  
Vista externa del gabinete de pared con equipos de red y su ubicación en el ambiente de la IEI



Fuente: Tomas fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 13 de noviembre de 2023.

Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

Asimismo, de las indagaciones efectuadas se tomó conocimiento que, como parte de la verificación del funcionamiento de los equipos por parte del proveedor, éste debe emplear un



grupo electrógeno propio, el mismo que es trasladado el día de la verificación y mantenimiento, siendo retirado el mismo día.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que en el año 2017, se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada de Proyectos a desarrollarse en las Regionales Moquegua, Tacna, Puno y Junín, mediante Acuerdo CD Proinversión n.° 8-2-2017-CPC de 23 de junio de 2017, en el cual se estableció como objetivo el implementare redes de acceso y de transporte de banda ancha para beneficiar a 845 localidades rurales.

En tal sentido, con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad del Proyecto, para garantizar su continuidad y aprovechamiento para el beneficio de la población, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Tacna, suscribieron el 1 de octubre de 2015, el Convenio de Cooperación Interinstitucional, Convenio n.° 025-2015/GOB.REG.TACNA estableciendo los compromisos de las partes, entre ellos:

"5.2 El **GR-TACNA** se compromete a:

(...)

5.2.5 Realizar una evaluación anual de los beneficios obtenidos por el PROYECTO a través del levantamiento de indicadores establecidos por el FITEL, información que servirá de insumo para la evaluación ex post del PROYECTO":

Sin embargo, pese al compromiso asumido en el referido convenio, ninguna de las partes habría advertido, que la Institución Educativa Inicial n.° 326, no contaba con energía eléctrica para el funcionamiento del Proyecto, al haber transcurrido más de dos (2) años, desde la instalación de los equipos del módulo de acceso, puesta tierra, para rayos, entre otros, como parte del proyecto.

Por lo tanto, pese a existir una necesidad que requiere se atienda el derecho igualitario a la atención de educación de los niños matriculados en la Institución Educativa Inicial n.° 326, bajo las mismas condiciones de sus pares, no se adoptaron acciones efectivas que garanticen el cumplimiento de los fines del referido proyecto y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

- **Visita de Inspección a la Institución Educativa n.° 42076 José Carlos Mariátegui.**

El 13 de noviembre de 2023, se realizó la visita de inspección a la Institución Educativa n.° 42076 José Carlos Mariátegui, ubicada en la localidad Alto Camilaca de la provincia de Candarave, al formar parte de las instituciones abonadas, y ante las consultas sobre el servicio de internet del Proyecto, efectuadas al Director de la institución educativa según consta en el Acta de Visita, se tomó conocimiento lo siguiente:

*"(...) No ha tenido servicio de internet en el mes de agosto, pese a las llamadas al proveedor OROCOM, recién se acercaron a realizar el mantenimiento correctivo, (...) de igual manera refiere que el servicio es lento y la cobertura de la antena wifi interior solo tiene alcance de aproximadamente 3 metros de radio, siendo utilizada solamente por un aula del Centro Educativo, además la velocidad no es la adecuada para la I.E.." (Énfasis agregado).*

- **Visita de Inspección a la Institución Educativa Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar**

En el distrito de La Yarada Los Palos, se ubica la Institución Educativa Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar, formando parte de las instituciones abonadas obligatorias, en cuya infraestructura se instaló el Módulo de Acceso, Sistema Puesta Tierra e instalación de pararrayos, conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.



No obstante ello, según consta en el Acta de Visita a la Institución Educativa de 17 de noviembre de 2023, la Directora a cargo de dicha institución, manifestó: "(...) los equipos son utilizados en minoría en un salón de clases del 5to año de secundaria, asimismo manifiesta que solicitó en el mes de agosto al técnico del contratista OROCOM se traslade los equipos a la sala de cómputo de la IE para ser utilizado por mayor cantidad de alumnos, asimismo indica que el servicio es lento y requiere mayor velocidad".


Al respecto, como parte de la visita se identificó que en el aula en la cual se instaló el módulo de acceso, se encuentra asignado al desarrollo de clases de los alumnos de quinto año "A" de secundaria, toda vez, que la infraestructura de la institución educativa es insuficiente para destinar dicha aula para el uso exclusivo del Proyecto, asimismo, se identificó que en dicho ambiente se encuentran tres (3) equipos informáticos, habiendo traslado a la sala de cómputo y a secretaría los otros dos (2) restantes, los mismos que no pueden acceder a la conexión de internet al encontrarse ubicados a una distancia mayor al radio de alcance del proyecto, como se muestra a continuación:

**Imagen n.º 18**

Aula asignada para la instalación del módulo de acceso, donde actualmente realizan el dictado de clases para los alumnos del Quinto año "A" de secundaria

**Imagen n.º 19**

Aula asignada para la instalación del módulo de acceso, en la cual se encuentran tres (3) de los cinco (5) equipos asignados.

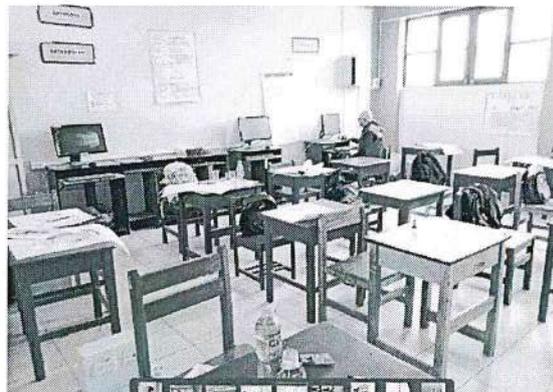


Fuente: Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 17 de noviembre de 2023.

Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



**Imagen n.º 20**  
Para rayos instalado como parte del equipamiento del módulo de Acceso

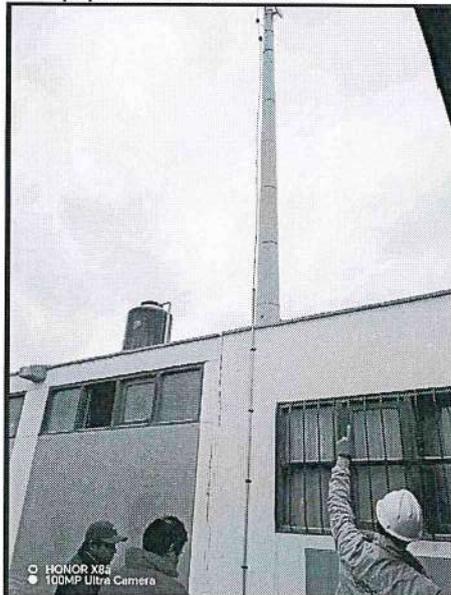

**Imagen n.º 21**  
Ambiente asignado a la sala de cómputo, al cual fueron trasladados dos (2) equipos de cómputo del proyecto



**Fuente:** Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 17 de noviembre de 2023.

**Elaboración:** Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

● **Visita de Inspección a la Institución Educativa Alfonso Ugarte n.º 42044 – Los Palos**

En el distrito de La Yarada Los Palos, se ubica la Institución Educativa Alfonso Ugarte n.º 42044, formando parte de las instituciones abonadas obligatorias, en cuya infraestructura se instaló el Módulo de Acceso, Sistema Puesta Tierra e instalación de pararrayos, conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.

No obstante, ello, según consta en el Acta de Visita a la Institución Educativa de 17 de noviembre de 2023, el Director a cargo de dicha institución, manifestó:

- “- Ante incumplimientos en el pago del internet por parte del Gobierno Regional de Tacna, durante aproximadamente seis (6) meses, no contaron la provisión de internet del proyecto, luego de ello se regularizó y volvieron a contar con el servicio.
- Ante la baja velocidad de 10M insuficiente para la cantidad de alumnos, la APAFA contrató un servicio de internet privado, que funciona en el centro de cómputo, al cual fueron trasladados los cinco (05) equipos (Computadoras, teclado y mouse) los cuales vienen siendo utilizados por los alumnos, quedando las instalaciones del proyecto en otro salón de clases sin equipos por resultar insuficiente. Se tramitó ante el GRT sin recibir respuesta”, la situación expuesta se muestra a continuación:

Al respecto, como parte de la visita se identificó que en el aula en la cual se instaló el módulo de acceso, se encuentra asignado al desarrollo de clases, toda vez que, la infraestructura de la institución educativa es insuficiente para destinar dicha aula para el uso exclusivo del proyecto, Asimismo, se identificó que en dicho ambiente se aprecia la instalación del módulo de acceso; sin embargo, no se ubica en dicho ambiente los monitores, mouse y teclados de los cinco (5) equipos asignados, al haber sido trasladados a la sala de cómputo, la misma que




cuenta con internet de un proveedor privado contratado por los padres de familia, a fin de dar cobertura a un mayor número de alumnos y garantizar la accesibilidad a las herramientas de internet, como se muestra a continuación:

Imagen n.º 22

Equipos de red del proyecto se ubican en un salón de clases sin uso adecuado de la Institución Educativa

Nótese el gabinete del módulo de acceso, canaletas y demás infraestructura instalada para el funcionamiento del Proyecto

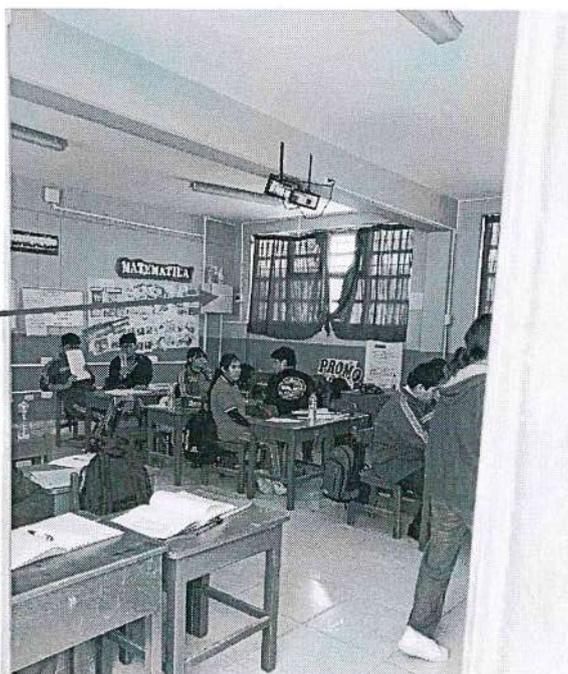

Fuente: Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 17 de noviembre de 2023.  
Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.


- **Visita de Inspección a la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui.**

En la localidad "Las Vilcas" del distrito de Ite, de la provincia de Jorge Basadre, se ubica la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui, formando parte de las instituciones abonadas obligatorias, en cuya infraestructura se instaló el Módulo de Acceso, Sistema Puesta Tierra e instalación de para rayo, conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.

No obstante, ello, según consta en el Acta de Visita a la Institución Educativa de 14 de noviembre de 2023, el Director a cargo de dicha institución, manifestó: "(...) *asumió funciones desde el mes de Febrero 2023, desde esa fecha no tenía internet de Pronatel a pesar de las llamadas al proveedor OROCOM, en junio 2023 solicitó a La Municipalidad se le brinde internet de otro proveedor, en el mes de agosto 2023 se apersonó personal de OROCOM a restablecer el servicio de internet, en dicha fecha el Director solicitó reubicación de los equipos de OROCOM debido a que el ambiente de instalación inicial estaba siendo ocupado con pizarras interactivas de la Municipalidad, los equipos de OROCOM han sido trasladados a otro ambiente pero no se ha atendido la reconexión de equipos de red, por lo cual no es posible verificar su operatividad a la fecha*" (Énfasis agregado), la situación expuesta se muestra a continuación:



**Imagen n.º 23**  
Nótese el equipamiento del módulo de acceso en el aula asignada para el proyecto

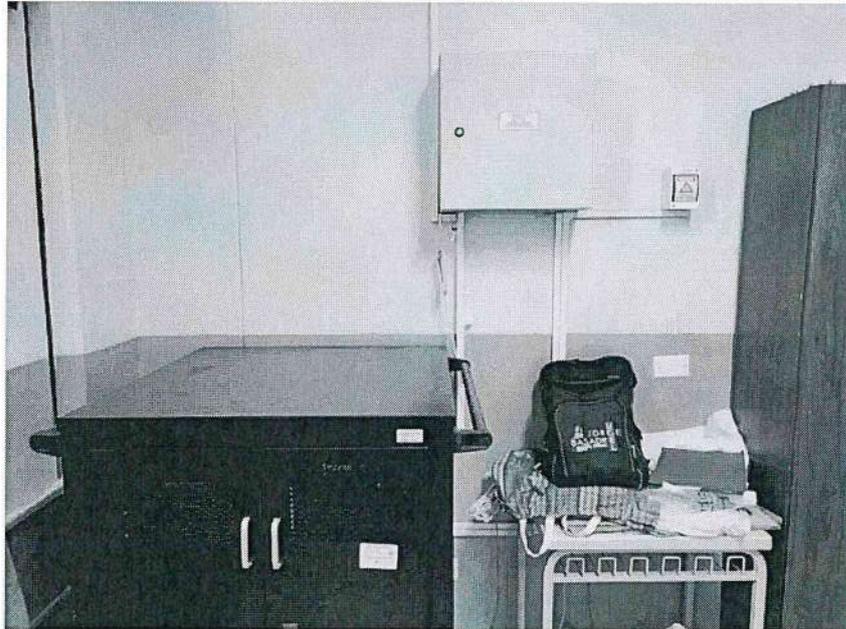

Fuente: Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 14 de noviembre de 2023.  
Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

**Imagen n.º 24**  
Pararrayos instalado como parte del equipamiento del módulo de Acceso



Fuente: Toma fotográfica realizada en la Visita de Inspección a las Instituciones Abonadas Obligatorias de 14 de noviembre de 2023.  
Elaboración: Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.



Bajo los párrafos expuestos, la comisión de control concurrente identificó que en cuatro (4) Instituciones Educativas en las cuales se instaló el equipamiento necesario para el funcionamiento del Módulo de Acceso, ante la falta de provisión de energía eléctrica, y el cambio del aula asignada para la instalación de dicho módulo, no permite el normal funcionamiento del proyecto y por ende que se cumpla con la finalidad del mismo, sumado a que la velocidad de internet asignada para cinco (5) equipos resulta insuficiente ante la cantidad de alumnos y aplicativos multimedia utilizados por cada institución educativa.

Por otro lado, respecto a las fallas en la provisión del servicio de internet, se debe mencionar que el Convenio de Cooperación Interinstitucional, Convenio n.° 025-2015/GOB.REG.TACNA estableció en la cláusula quinta, los compromisos de las partes, siendo uno de ellos para el caso del FITEL ahora PRONATEL, el de: "Verificar que el GR-TACNA cumpla con la entrega del pago de los servicios que brinde el operador por la operación del PROYECTO"; sin embargo, conforme a la información recabada en las visitas de inspección, durante varios meses las instituciones abonadas obligatorias no contaron con el servicio de internet por falta de pago del servicio.

Los hechos descritos han vulnerado la normatividad siguiente:

- **Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Ley n.° 29904 de 24 de abril de 2015.**

*"Artículo 1. Objeto de la Ley*

*El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento".*

*"Artículo 2. Promoción de la Banda Ancha*

*El Estado promueve la Banda Ancha y su aprovechamiento por parte de toda persona, como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión, opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente".*

- **Plan de Promoción de la Inversión Privada de Proyectos a desarrollarse en las Regiones Moquegua, Tacna, Puno y Junín, aprobado por Acuerdo CD Proinversión n.° 8-2-2017-CPC de 23 de junio de 2017.**

*"3.2. Objetivo de los Proyectos Regionales*

*Los proyectos (...) Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna (...), tienen por objetivo incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de dichas regiones, a través de la ampliación de redes de transporte de banda ancha para alcanzar a las capitales de distrito, así como implementar redes de acceso para beneficiar a 845 localidades rurales y de preferente interés social de dichas regiones".*

Los hechos anteriormente descritos, afectan el cumplimiento de los objetivos y sostenibilidad en el tiempo del proyecto, en desmedro de la comunidad educativa, al no acceder a las herramientas tecnológicas bajo las mismas condiciones de sus pares, así como, el deterioro de los equipos instalados sin cumplir los fines previstos.



## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 10: "Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso del Proyecto en la región de Tacna, a noviembre del 2023", se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 2** del presente informe.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario del Programa Nacional de Telecomunicaciones.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de control, la Comisión de Control no se emitió el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

## VIII. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el **Apéndice n.º 3** del presente informe.

## IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control al Hito de Control n.º 10: "Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso del Proyecto en la región de Tacna, a noviembre del 2023", se han advertido cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control n.º 10: "Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso del Proyecto en la región de Tacna, a noviembre del 2023", con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Servicio de Control Concurrente, adjuntando la documentación de sustento respectiva.



Tacna, 28 de noviembre de 2023



**Eyleen Scarleth Arias Hinojosa**  
Supervisor  
Comisión de Control



**Fernando Eduardo Cohaila Villagra**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control



**Arturo Alejandro Zea Manrique**  
Gerente Regional de Control de Tacna  
Contraloría General de la República del Perú

**APÉNDICE N° 1**

**FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EN LA REGIÓN DE TACNA**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Registro                                                    | 26/5/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                        |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |
| Nivel de Gobierno                                                    | Gobierno Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                        |
| Entidad                                                              | Ministerio de Transportes y Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                        |
| Unidad ejecutora                                                     | Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                        |
| Alcance del Proyecto                                                 | <b>Región</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Provincias</b>                                                                         | <b>Distritos</b>                                                       |
|                                                                      | Tacna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tacna                                                                                     | Tacna, Calana, Inclán, Pachía, Palca, Sama, La Yarada los Palos.       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Candarave                                                                                 | Candarave, Camilaca                                                    |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jorge Basadre                                                                             | Locumba, Ilabaya, Ite                                                  |
|                                                                      | Tarata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tarata, Héroes Albarracín, Estique, Estique Pampa, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco. |                                                                        |
| <b>2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO REGIÓN TACNA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |
| Código Unificado N°                                                  | 2258787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                        |
| Código SNIP                                                          | 315140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |
| Nombre del Proyecto                                                  | "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                        |
| Monto de Inversión Actualizado                                       | S/ 73 137 212,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Viable                                                                              | S/ 73 137 212,00                                                       |
| Informe de Viabilidad                                                | Informe Técnico N° 414-2015-MTC/09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha Informe de Viabilidad                                                               | 17/4/2015                                                              |
| Doc. Aprobación Viabilidad                                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Último Registro en la Fase de Ejecución                                          | 14/1/2022                                                              |
| <b>3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |
| Responsable del Proceso                                              | Agencia de Promoción de la Inversión Privada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                        |
| Procedimiento de Selección                                           | Concurso Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Adjudicación                                                                     | 18/12/2017                                                             |
| Tipo de Financiamiento                                               | No Rembolsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Firma de Contrato                                                                | 09/05/2018                                                             |
| Financiamiento Adjudicado (dólares americanos por todo concepto)     | US\$ 28 542 980,68 (Moquegua)<br>US\$ 25 902 589,44 (Tacna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modalidad de Ejecución                                                                    | La transferencia del total o de una parte de sus acciones y/o activos. |
| Contratista Adjudicado                                               | OROCOM S.A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                        |
| Normativa aplicable del proceso:                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto Legislativo n.° 674, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.</li> <li>- Decreto legislativo N° 1012, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de Asociaciones Público – Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la Inversión Privada.</li> </ul> |                                                                                           |                                                                        |
| <b>4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |
| Código INFOBRAS (Tacna)                                              | 140493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                        |
| Denominación del Contrato                                            | Contrato de Financiamiento del Proyecto: "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua e Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                        |
| Etapas de Ejecución                                                  | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                        |
| Plazo del Período de Inversión Contractual                           | 17 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plazo de Período de Operación y mantenimiento contractual                                 | 120 meses                                                              |
| Plazo del período de inversión ampliado                              | 46 meses y 26 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de inicio contractual                                                               | 09/05/2018                                                             |
| Fecha de término del período de inversión según contrato             | 09/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Término del Período de Inversión Real                                            | 07/04/2022                                                             |
| Red de Transporte                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                        |

|                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Período de Inversión fecha de inicio real                                                                                                | 09/05/2018                 | Fecha término del Periodo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021 |
| Período de Operación Provisional                                                                                                         | 31/01/2021                 | Fecha término del Periodo de Operación Provisional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/06/2023 |
| Puesta en Operación                                                                                                                      | 30/12/2021                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Red de Acceso</b>                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Período de Inversión fecha de inicio real                                                                                                | 10/05/2018                 | Fecha término del Periodo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/07/2022 |
| Período de Operación (120 meses) fecha de inicio real                                                                                    | 22/07/2022                 | Fecha término del Periodo de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22/07/2032 |
| <b>5. PROPUESTA TÉCNICA DEFINITIVA</b>                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Documento de Aprobación                                                                                                                  | Oficio N° 1402-2019-MTC/24 | Fecha de Aprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20/09/2020 |
| <b>6. DESEMBOLSOS (Proyecto Moquegua / Tacna)</b>                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Motivo</b>                                                                                                                            | <b>Monto US\$</b>          | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 10% por Adelante del Financiamiento de la Red de Acceso.                                                                                 | 3 651 228,52               | Julio 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 10% por Adelante del Financiamiento de la Red Transporte                                                                                 | 1 793 355,50               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Cumplimiento del 100% implementación de Nodos de la Red de Transporte                                                                    | 9 734 826,22               | Julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento Construcción e implementación del NOC y Centro de Mantenimiento de la Red de Transporte.                                    | 1 793 355,49               | Diciembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Cumplimiento del 90% Operatividad de la Red de Transporte.                                                                               | 3 228 039,89               | Julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 100% Operatividad de la Red de Transporte                                                                               | 358 671,10                 | Enero 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 75% implementación de Nodos de la Red Acceso                                                                            | 8 215 264,17               | Mayo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Cumplimiento del 100% implementación de Nodos de la Red Acceso                                                                           | 2 738 421,39               | Marzo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 25% localidades e instituciones Abonadas Obligatorias                                                                   | 2 282 017,82               | Mayo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Cumplimiento del 50% Localidades e instituciones Abonadas Obligatorias                                                                   | 2 282 017,82               | Junio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 75% Localidades e Instituciones Abonadas Obligatorias                                                                   | 2 282 017,82               | Agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Cumplimiento del 100% Localidades Instituciones Abonadas Obligatorias                                                                    | 2 282 017,82               | Mayo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Acta de conformidad de instalaciones y pruebas de servicios de Acceso, Red de Acceso                                                     | 826 838,22                 | Julio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 100% del número total de Nodos ópticos y el backbone de fibra óptica asociada estos Nodos. Adenda 10, Red de Transporte | 950 767,99<br>128 629,00   | Agosto 2021<br>Agosto 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Aprobación del correcto funcionamiento y provisión de servicios de la Red de Transporte Regional 1° Semestre 1.7%                        | 166 815,90                 | Enero 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Aprobación del correcto funcionamiento y provisión de servicios de la Red de Transporte Regional. 2° Semestre 1.7%                       | 166 815,90                 | Marzo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cumplimiento del 1° Semestre. Periodo de Operación, Red de Acceso                                                                        | 265 487,63                 | Abril 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Aprobación del correcto funcionamiento y provisión de servicios de la Red de Transporte Regional. 3° Semestre 1.7%                       | 157 003,19                 | Agosto 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>7. ADENDAS.</b>                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Número</b>                                                                                                                            | <b>Fecha</b>               | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Primera Adenda                                                                                                                           | 20/12/2018                 | Se modifica el numeral 7.4 de la cláusula séptima "Obligaciones del Contratado", el numeral 9.5 de la cláusula novena "Derechos del Contratado" y el numeral 24.3 de la Cláusula Vigésimo Cuarta "Otras Disposiciones" del Contrato de Financiamiento.<br><br>Asimismo, se incorpora el "Procedimiento que regula la modificación de la Propuesta Técnica por cambio de marca, modelo de equipamiento o proveedor de infraestructura propuestos para la Red de Transporte y Red de Acceso", como Anexo N° 13 DEL Contrato de Financiamiento. |            |
| Segunda Adenda                                                                                                                           | 29/04/2019                 | Se modifica el literal b y c de los numerales 1.2 y 1.1 respectivamente, del Apéndice 14-A del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso "Lineamientos de Ejecución de las Actividades de Sensibilización" del T.U.O. de las Bases del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercera Adenda        | 27/09/2019 | Se modifican los numerales 2.12, 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento, ampliándose la etapa de instalación de la Red de Transporte y la Red de Acceso en veinte (20) meses y diecinueve (19) meses, respectivamente. Asimismo, el período de Inversión de la Red de Transporte y la Red de Acceso se ampliaron a veintidós (22) meses y veintiún (21) meses, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cuarta Adenda         | 05/11/2019 | Se modifica y/o actualiza las Localidades Beneficiarias e Instituciones Abonadas Obligatorias, contempladas en el Anexo N° 1 del Contrato de Financiamiento y del Apéndice N° 1 Listado de las Localidades Beneficiarias e Instituciones Abonadas Obligatorias del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, sin irrogar mayor financiamiento, ni gasto adicional para el PRONATEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quinta Adenda         | 23/10/2020 | Se modifican los numerales 2.12, 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento, así como el numeral 1.1 del Anexo 8-B de las bases, especificaciones técnicas de la Red de Acceso, de acuerdo a lo siguiente: el plazo máximo para culminar la Etapa de Instalación para la Red de Acceso será el 7 de septiembre de 2020 y para culminar esta etapa para la Red de Transporte será hasta el 25 de julio de 2020.<br>Asimismo, el período de inversión de la Red de Transporte tendrá como duración máxima hasta el 25 de septiembre de 2020, y el Período de Inversión de la Red de Acceso, hasta el 7 de noviembre de 2020.                                                                                              |
| Sexta Adenda          | 05/11/2020 | Se modifican los numerales 1.5, 2.2, 2.2.6, 2.4, 2.6, el Apéndice 3 "Contenido Mínimo de la Propuesta Técnica General, Propuesta Técnica Definitiva y Expediente Técnico" y el Apéndice 1-D "Diagrama de la Red de Transporte, nodos de Infraestructura de Soporte", asimismo, se modifica el Apéndice N° 1-A "Listado de los nodos de la Red de Transporte" para la región Tacna, del Anexo 8-A de las Bases de los proyectos "Instalación de Banda ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Moquegua" y proyecto "Instalación de Banda ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".                                                                                                                                    |
| Séptima Adenda        | 28/12/2020 | Realizar las acciones de adquisición y/o saneamiento respecto de los predios en el marco del segundo supuesto del numeral 4.1 y numeral 4.3 del numeral 4° del Decreto de Urgencia N° 041-2019. Incluir los numerales 2.36 y 2.37 de la Cláusula Segunda del Contrato de Financiamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Octava Adenda         | 13/04/2021 | Se modifican el numeral 4.2.8 y el Apéndice n.° 21 del Anexo n.° 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Novena Adenda         | 12/05/2021 | Se modifican los numerales 2.12, 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento, así como el numeral 1.1 del Anexo 8-A de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte; y el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, de acuerdo a lo siguiente; el plazo máximo para culminar la Etapa de Instalación para la Red de Acceso será el 26 de febrero de 2021 y para culminar esta etapa para la Red de Transporte será hasta el 5 de septiembre de 2020.<br>Asimismo, el período de Inversión de la Red de Acceso tendrá como duración máxima hasta el 26 de abril de 2021, y el período de inversión de la Red de Transporte, hasta el 5 de noviembre de 2020. |
| Décima Adenda         | 23/07/2021 | Se realizaron modificaciones a fin de excluir temporalmente al Nodo de Transporte correspondiente a la Localidad de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna, región de Tacna. Asimismo, se modificó el plazo para la ejecución de la capacitación local y en fábrica de la Red de Transporte, así como se realizaron precisiones respecto al Expediente Técnico de dicha red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Décimo Primera Adenda | 27/07/2021 | Se procedió a modificar, a efectos de viabilizar el inicio del Período Provisional de la Red de Transporte de los Proyectos Regionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Décimo Segunda Adenda | 30/12/2021 | Se modificaron los numerales 2.12, 2.26 y 2.27 de la Cláusula Segunda y el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Financiamiento, así como el numeral 1.1 del Anexo 8-A de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Transporte; y el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, de acuerdo a lo siguiente: el plazo máximo para culminar la Etapa de Instalación para la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            | Red de Acceso será el 7 de enero de 2022 y para culminar la etapa de instalación para la Red de Transporte será hasta el 7 de febrero de 2022. Asimismo, el Periodo de Inversión de la Red de Acceso tendrá como duración máxima hasta el 7 de abril de 2022, y el Periodo de Inversión de la Red de Transporte, hasta el 7 de marzo de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Décimo Tercera Adenda | 30/12/2021 | Se realizaron modificaciones de los numerales 2.3, 2.29 y 11.1.8 del Anexo 8-A, el Contratado se compromete a levantar las observaciones (hasta el 31 de enero de 2022) que no afectan la funcionalidad de la Red de Transporte de los Proyectos Regionales Moquegua y Tacna, asimismo la presentación del Expediente Técnico en un plazo no mayor a 45 días calendario, para lo cual cuenta con una carta fianza del 10% del valor del desembolso restante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Décimo Cuarta Adenda  | 30/12/2021 | Se realizó modificación del numeral 14.1.1 de la Cláusula Décimo Cuarta; respecto al esquema de desembolsos del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO, que permite el desembolso del 5.6% al cumplimiento del 93% de los Nodos de Acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Décimo Quinta Adenda  | 25/05/2022 | Se modificó el Apéndice n.º 1, listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de las Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, Anexo 8-B de las Bases; y el Anexo n.º 1 LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del citado contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Décimo Sexta Adenda   | 20/06/2022 | Modifica los numerales 2.12, 2.26 y 6.2 del Contrato de Financiamiento y, el numeral 3.9 del Anexo 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, con el siguiente tenor: Respecto a la Red de Acceso: se amplía la Etapa de Instalación hasta el 26 de marzo de 2022 y el Periodo de Inversión hasta el 26 de mayo de 2022. Respecto a la Red de Transporte: se amplía la Etapa de Instalación hasta el 07 de enero de 2021 y el Periodo de Inversión hasta el 07 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Décimo Séptima Adenda | 30/06/2022 | Se modificaron los numerales 17.4 y 17.5 de la Cláusula Decimo Séptima del Contrato de Financiamiento y los numerales 5.2.3 y 7.6.4.8 del Anexo N° 8-B de las Bases, Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, respecto a la supervisión y control de la sensibilización y difusión, elaboración de contenidos y capacitación, a fin de que EL CONTRATADO extienda la invitación de asistencia a los actores clave de las localidades beneficiarias (representantes de organizaciones sociales, junta de regantes, personal de la IAO, entre otros); adicionalmente establece que SI FITEL aprueba la modificación de la metodología de ejecución de las actividades de sensibilización, brindara su conformidad a dichas modificaciones.<br><br>Asimismo, se modifican los subnumerales 2.2 y 2.3 del numeral 2 y numeral 4 del Apéndice N° 14-B Lineamientos de ejecución de las actividades de difusión del Anexo 8-B de las Bases del Contrato de Financiamiento, respecto a la ejecución del mantenimiento y cierre de las actividades de sensibilización, pudiendo ejecutarse como máximo hasta el octavo mes desde el inicio del PERIODO DE OPERACIÓN. De igual manera se revaloriza el monto de las actividades de difusión y sensibilización. |

**8. INFORMACIÓN DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS**

**Ampliaciones de Plazo – Aprobadas en el Periodo de Inversión**

| N° | Documento de Aprobación | Fecha de aprobación | Duración Máxima de Periodo de Inversión |                    | Fecha Término Red. ACCESO Red. TRANSP. |
|----|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|    |                         |                     | Red de Acceso                           | Red de Transporte  |                                        |
| 1  | Tercera Adenda          | 27/9/2019           | 21 meses                                | 22 meses           | RA: 9/2/2020<br>RT: 9/3/2020           |
| 2  | Quinta Adenda           | 23/10/2020          | 29 meses y 26 días                      | 28 meses y 16 días | RA: 7/11/2020<br>RT: 25/9/2020         |
| 3  | Novena Adenda           | 12/5/2021           | 35 meses y 17 días                      | 29 meses y 24 días | RA: 26/4/2021<br>RT: 5/11/2020         |
| 4  | Décimo Segunda Adenda   | 30/12/2021          | 46 meses y 26 días                      | 36 meses y 26 días | RA: 7/4/2022<br>RT: 7/3/2021           |
| 5  | Décimo sexta Adenda     | 20/06/2022          | 48 meses                                |                    | RA: 26/5/2022                          |

**Penalizaciones Aprobadas**

| N°           | Documento de Aprobación    | Fecha de aprobación | Causal                                                                                    | Monto S/          |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Oficio N° 1383-2018-MTC/24 | 20/9/2018           | Presentación del cronograma de actividades fuera de plazo Red de Transporte               | 21 000,00         |
| 2            | Oficio N° 0140-2019-MTC/24 | 7/2/2019            | Presentación de 10 reportes y 1 actualizaciones de cronograma fuera de plazo establecido. | 109 200,00        |
| 3            | Oficio N° 964-2019-MTC/24  | 2/7/2019            | Propuesta Técnica Definitiva                                                              | 84 000,00         |
| 4            | Oficio N° 1303-2018-MTC/24 | 5/9/2018            | Estudios y cálculos para cable de F.O.                                                    | 20 750,00         |
| 5            | Oficio N° 1291-2018-MTC/24 | 28/8/2018           | Remisión del cronograma de actividades fuera del plazo establecido.                       | 20 750,00         |
| 6            | Oficio N° 622-2020-MTC/24  | 15/4/2020           | Incumplimiento de la Propuesta Técnica Actualizada                                        | 43 000,00         |
| 7            | Oficio N° 0129-2019-MTC/24 | 22/2/2019           | Estudio de Campo de la Red de Acceso                                                      | 42 000,00         |
| <b>Total</b> |                            |                     |                                                                                           | <b>340 700,00</b> |

**9. INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO**

|                                                              |                                                |                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Avance Físico Programado Acumulado (Implementación de Nodos) | Red de Transporte: 100%<br>Red de Acceso: 100% | Avance Financiero Programado Acumulado 2022. | Red de Transporte: 100%<br>Red de Acceso: 100% |
| Avance Físico Ejecutado Acumulado (Implementación de Nodos)  | Red de Transporte: 90%<br>Red de Acceso: 80%   | Avance Financiero Ejecutado Acumulado        | Red de Transporte: 86%<br>Red de Acceso: 64%   |

**10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Supervisión del Servicio | Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

**Fuente:** Contrato de Financiamiento, Adendas Suscritas, TUO de las Bases de la Licitación Pública Especial, Aplicativos Informáticos de la Web (SSI, INFOBRAS, entre otros medios). Dicha información será corroborada, actualizada y complementada con la información que se recopile de la Entidad.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del Control Concurrente.

**APÉNDICE N° 2**

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 10: "PARÁMETROS TÉCNICOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACCESO, A NOVIEMBRE DEL 2023" DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA"**

1. EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL PARA LA CULMINACIÓN DEL PERIODO PROVISIONAL DE LA RED DE TRANSPORTE, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA DÉCIMO TERCERA Y DECIMO SEXTA ADENDA AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO

| N° | Documento                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Contrato de Financiamiento del Proyecto                                                                      |
| 2  | Décimo Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento de 30 de diciembre de 2021.                              |
| 3  | Décimo Sexta Adenda al Contrato de Financiamiento de 20 de junio de 2022.                                    |
| 4  | Acta de Conformidad de Instalación y Prueba de Servicios de la Red de Transporte de 30 de diciembre de 2021. |

2. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS DE LA RED DE TRANSPORTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES, GENERA INCERTIDUMBRE EN LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES Y EN LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO

| N° | Documento                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Contrato de Financiamiento del Proyecto.                                                |
| 2  | Texto Único Ordenado de las Bases.                                                      |
| 3  | Apéndices n.ºs 1-A, A-B, A-C y 5 y Anexo n.º 8-A del Texto Único Ordenado de las Bases. |
| 4  | Décimo Tercera Adenda al Contrato de Financiamiento de 30 de diciembre de 2021.         |
| 5  | Oficio n.º 001030-2023-CG/GRTA de 12 de setiembre de 2023                               |
| 6  | Oficio n.º 1064-2023-MTC/24 de 29 de setiembre de 2023.                                 |
| 7  | Informe de Hito de Control n.º 026-2023-OCI/6403-SCC (Hito n.º 8)                       |
| 8  | Memorándum n.º 473-2023-MTC/24.04 de 18 de julio de 2023                                |

3. DEFICIENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO DE NODOS DEL PROYECTO Y OBSTRUCCIÓN DE SU ÚNICO ACCESO, GENERA RIESGO A SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS INSTALADOS

| N° | Documento                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Inspección a Nodo de Red de Transporte TA-T-0029-TICACO de 16 de noviembre de 2023 |
| 2  | Acta de Visita de Inspección a Nodo de Red de Acceso TA-A-4013-TICACO de 16 de noviembre de 2023     |

4. DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA EN INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, PODRÍA GENERAR POTENCIAL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, OCASIONANDO DAÑOS EN EL PERSONAL ABONADO, ASÍ COMO FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN.

| N° | Documento                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Inspección a Institución Abonada Obligatoria (Dependencia Policial) Comisaria Rural Ticaco de 16 de noviembre de 2023. |
| 2  | Anexo 8-B del Texto Único Ordenado de las Bases.                                                                                         |

5. **CARENCIA DE SUPERVISIÓN ÍNTEGRA AL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, NO PERMITE ADVERTIR LA INOPERATIVIDAD Y/O DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EN DESMEDRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASÍ COMO, EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS SIN CUMPLIR LOS FINES PREVISTOS.**

| N° | Documento                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Inspección a Institución Educativa – Institución Educativa Inicial n° 326 Alto Camilaca del 13 de noviembre de 2023                   |
| 2  | Acta de Visita de Inspección a Institución Educativa – Institución Educativa n.° 42076 José Carlos Mariátegui Alto Camilaca del 13 de noviembre de 2023 |
| 3  | Acta de Visita de Inspección a Institución Educativa – Institución Educativa Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar Pueblo Libre del 17 de noviembre de 2023    |
| 4  | Acta de Visita de Inspección a Institución Educativa – Institución Educativa Alfonso Ugarte 42044 Los Palos del 17 de noviembre de 2023                 |
| 5  | Acta de Visita de Inspección a Institución Educativa – Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui Ite del 14 de noviembre de 2023          |



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN BÁSICA

|                                                   |            |             |         |            |         |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| FECHA                                             | 16/11/2023 | HORA INICIO | 11:08   | HORA FINAL | 12:35   |
| DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE               |            |             |         |            |         |
| TA - T - 0022 - TARATA                            |            |             |         |            |         |
| TIPO DE NODO (DISTRIBUCION, CONEXIÓN, AGREGACION) |            |             |         |            |         |
| (DISTRIBUCIÓN) AGREGACIÓN                         |            |             |         |            |         |
| UBICACIÓN DEL NODO DE LA RED DE TRANSPORTE        |            |             |         |            |         |
| PROVINCIA                                         | TARATA     | DISTRITO    | TACNA   |            |         |
| LOCALIDAD                                         | TARATA     | LATITUD     | 17.4709 | LONGITUD   | 70.0294 |
| DIRECCIÓN                                         |            | ALTURA      | 3147    |            |         |

PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL)

|                                           |                           |           |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE                             | EDME RUIZ AIMITUMA        |           |          |
| CARGO                                     | ING. SUPERVISOR DIOP      | D.N.I. N° | 40655360 |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) |                           |           |          |
| REPRESENTANTE                             | FERNANCO COHAILA VILLAGRA |           |          |
| CARGO                                     | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 41285572 |
| REPRESENTANTE                             | JANETH FALCON LOPEZ       |           |          |
| CARGO                                     | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 04440208 |

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LOS ASPECTOS QUE SON MATERIA DE LA VERIFICACIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN SE DESARROLLAN EN LOS FORMATOS N°s 01 Y 02 ADJUNTOS A LA PRESENTE "ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN", LOS CUALES SON DE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada:

FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República

FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

FIRMA

Nombres y apellidos:

JANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO

TA - T - 0022 - TARATA

| N° PARTIDA | TÍTULO CONTRACTUAL SOBRE EL TERRENO                                                     | TÍTULO INSCRITO | ANCHO (MTS) | LARGO (MTS) | LATITUD | LONGITUD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|
|            | NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN AL MOMENTO DE LA VISITA, SERÁ PROPORCIONADA POSTERIORMENTE |                 |             |             |         |          |

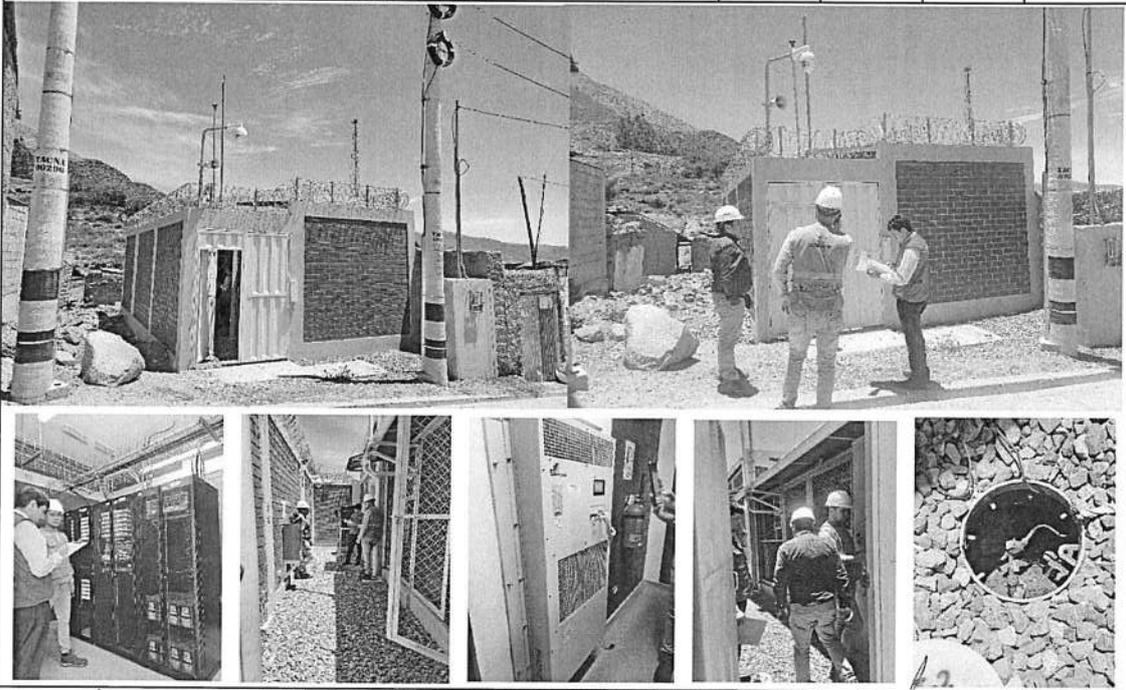

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.


Por la entidad visitada:

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: EDME RUIZ AIMITUMA  
DNI: 40655360  
Cargo: ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República:

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: FERNANDO COHAILA VILLAGRA  
DNI: 41285572  
Cargo: AUDITOR

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: WILMER PINTO  
DNI: 003104735 - CE  
Cargo: SUPERVISOR TI - OYM

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: JANETH FALCON LOPEZ  
DNI: 04440208  
Cargo: AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE

TA - T - 0022 - TARATA

LA SIGUIENTE VERIFICACION SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM                          | CONCEPTO                   | PROPUESTA TÉCNICA                    |                                                                                                                                           |               | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |             |    |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----|
|                               |                            | MARCA                                | MODELO                                                                                                                                    | VALOR         |                 |              |                 |             |    |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b> |                            |                                      |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 1                             | 1                          | SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES          |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 1                             | 1                          | 1                                    | NODO CONSTRUIDO EN TERRENO ALTO CON BAJA PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN O SOBRE MUELLES CUANDO SE ENCUENTRA EN ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES |               |                 | 1            | SI              | SI          |    |
| 1                             | 2                          | AMBIENTES                            |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 1                             | 2                          | 1                                    | SALA DE EQUIPOS                                                                                                                           |               |                 | 1            | SI              | SI          |    |
| 1                             | 2                          | 2                                    | GRUPO ELECTRÓGENO                                                                                                                         |               |                 | 1            | SI              | SI          |    |
| 1                             | 2                          | 3                                    | BAÑO                                                                                                                                      |               |                 | 1            | 0               | -           |    |
| 2                             | <b>SEGURIDAD EXTERIOR</b>  |                                      |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 2                             | 1                          | CERCO PERIMÉTRICO                    |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 2                             | 1                          | 1                                    | CERCO PERIMÉTRICO                                                                                                                         |               |                 | ≥ 2.4 m      | 1               | SI          |    |
| 2                             | 1                          | 2                                    | CONCERTINA                                                                                                                                |               |                 | ≥ 0.5 m      | 1               | SI          |    |
| 2                             | 2                          | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL NODO |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 2                             | 2                          | 1                                    | PUERTA DE ACCESO AL NODO SERÁ METÁLICA                                                                                                    |               |                 | 1            | 1               | SI          |    |
| 2                             | 2                          | 2                                    | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA Y ELÉCTRICA                                                                                                    |               |                 | 1            | 1               | SI          |    |
| 2                             | 2                          | 3                                    | LECTOR BIOMÉTRICO /TECLADO                                                                                                                |               |                 | 1            | 1               | SI          |    |
| 2                             | 2                          | 4                                    | APERTURA DE PUERTA DESDE EL NOC                                                                                                           |               |                 | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | <b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b> |                                      |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 3                             | 1                          | ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED          |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 3                             | 1                          | 1                                    | GABINETES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES ODF/DDF                                                                                             | TECHNIASES    | QU / RV 427070F | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 1                          | 2                                    | GABINETES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                                                                                    | TECHNIASES    | QU / RV 427070F | 2            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 1                          | 3                                    | RACK DE ENERGIA                                                                                                                           | TECHNIASES    | QU / RV 427070F | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 1                          | 4                                    | BANDEJAS ODF PARA FIBRA ÓPTICA DE 48 HILOS                                                                                                | NET SOLUTIONS |                 | 6            | 1               | 18 bandejas |    |
| 3                             | 1                          | 5                                    | BANDEJAS DDF PARA FIBRA ÓPTICA DE 48 HILOS                                                                                                | NET SOLUTIONS |                 | 12           | 1               |             |    |
| 3                             | 1                          | 6                                    | BANDEJAS ODF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS                                                     |               |                 |              |                 | 1           |    |
| 3                             | 1                          | 7                                    | BANDEJAS DDF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS                                                     |               |                 |              |                 | 1           |    |
| 3                             | 2                          | CLIMATIZACIÓN                        |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 3                             | 2                          | 1                                    | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN                                                                                                           | EIVICOOL      | EF70HDIC1E      | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 2                          | 2                                    | TEMPERATURA DEL AMBIENTE                                                                                                                  |               |                 | 220          | 10*~26°         | 1.0         | SI |
| 3                             | 2                          | 3                                    | HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE                                                                                                             |               |                 |              | 40%~70%         | 60.0%       | SI |
| 3                             | 3                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                    |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 3                             | 3                          | 1                                    | MEDIDOR DE LUZ EXTERNO (220 VAC.)                                                                                                         |               |                 | 1            | 2228            | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 2                                    | GRUPO ELECTRÓGENO INSONORO <b>14KVA</b>                                                                                                   | GAMMA         | GPLS-14I        | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 3                                    | TIEMPO DE ESPERA DE ENCENDIDO DEL GRUPO ELECTRÓGENO ANTE CORTE ELÉCTRICO                                                                  |               |                 | 30           | v               | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 4                                    | VOLTAJE PRODUCIDO POR EL GRUPO ELECTRÓGENO LUEGO DE 4 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                           |               |                 | 220 v +/- 5% | 224V            | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 5                                    | NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTRÓGENO                                                                                                |               |                 | >30%         | 98%             | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 6                                    | TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL AUTOMÁTICO                                                                                             |               |                 | 1            | 1               | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 7                                    | RECTIFICADOR /CARGADOR                                                                                                                    | ELTEK         | FLATPACK2 48V   | 1            | 2               | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 8                                    | BANCO DE BATERÍAS                                                                                                                         | FIAMM         | 125HG100        | 2            | 2               | SI          |    |
| 3                             | 3                          | 9                                    | CARGA DE BANCO DE BATERÍAS -48v /-57.6 v                                                                                                  |               |                 |              | 53V             | SI          |    |
| 3                             | 4                          | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)    |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |
| 3                             | 4                          | 1                                    | CUENTA CON CERTIFICADO DE SISTEMA DE TIERRAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS                                                                    | 3PT           |                 | < 5 Ohm      | 1.59            | 1.75        |    |
| 3                             | 4                          | 2                                    | CUENTA CON DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RAYOS (inspeccion visual)                                                                          |               |                 | 1            | 1               |             |    |
| 3                             | 5                          | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA           |                                                                                                                                           |               |                 |              |                 |             |    |

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACION DEL NODO DE TRANSPORTE

TA - T - 0022 - TARATA

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTES DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM  | CONCEPTO                                                     | PROPUESTA TÉCNICA |        |                 | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
|       |                                                              | MARCA             | MODELO | VALOR           |                 |              |                 |    |
| 3 5 1 | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE EQUIPOS              |                   | ZHV    | ZBIG-5231U-N4T  | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 5 2 | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE FUERZAS              |                   | ZHV    | ZBIG-5231U-N4T  | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 5 3 | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR DEL PATIO DEL NODO              |                   | ZHV    | ZHIG-2361U-EN1T | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 5 4 | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR AL INGRESO AL NODO              |                   | ZHV    | ZHIG-2361U-EN1T | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 5 5 | GRABADOR DE VIDEO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3 TB    |                   | ZHV    | ZXNVM-N4104U-E  | 1               | 1 TB         | NO              | SI |
| 3 5 6 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN DÍAS) LOCALMENTE             |                   |        |                 | 30              |              | SI              | SI |
| 3 5 7 | SEÑAL DE VIDEO ES MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC      |                   |        |                 |                 |              | SI              | SI |
| 3 6   | SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE                                |                   |        |                 |                 |              |                 |    |
| 3 6 1 | CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE                                |                   | ZHV    | FSU ZHV IG200   | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 6 2 | SENSOR MAGNETICO (SALA EQUIPOS / SALA DE FUERZA)             |                   |        |                 | 2               | 2            | SI              | SI |
| 3 6 3 | SENSOR DE ANIEGO SALA DE EQUIPOS                             |                   |        |                 | 2               | 2            | SI              | SI |
| 3 6 4 | SENSOR DE MOVIMIENTO 90° (PATIO)                             |                   |        |                 | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 6 5 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° (SALA DE EQUIPOS / SALA DE FUERZA) |                   |        |                 | 2               | 2            | SI              | SI |
| 3 6 6 | SIRENA ESTROBOSCOPICA / PUSH BUTTON                          |                   |        |                 | 1               | 1            | SI              | SI |
| 3 6 7 | ALARMA MONITOREADA Y ALMACENADA LOCALMENTE                   |                   |        |                 |                 | NO           | SI              | SI |
| 3 6 8 | ALARMA MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC                 |                   |        |                 |                 | SI           | SI              | SI |
| 3 7   | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINTORES DE INCENDIOS               |                   |        |                 |                 |              |                 |    |
| 3 7 1 | DETECTORES EN SALA DE EQUIPOS (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)       |                   |        |                 | 3               | 3            | SI              | -  |
| 3 7 2 | DETECTORES EN SALA DE FUERZA (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)        |                   |        |                 | 3               | 3            | SI              | -  |
| 3 7 3 | EXTINTOR CO2 EN SALA DE EQUIPOS (VIGENTE)                    |                   |        |                 | 1               | 1            | SI              | -  |
| 3 7 4 | EXTINTOR CO2 EN PATIO (VIGENTE)                              |                   |        |                 | 1               | 1            | SI              | -  |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

| OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ÍTEM                          | DETALLE DE OBSERVACIÓN (O) / COMENTARIO (C) |
|                               |                                             |

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARACTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SENAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

FIRMA

Nombres y apellidos:

EDMÉ RUIZ AINITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República

FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAIA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

FIRMA

Nombres y apellidos:

JANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

|              |            |                    |       |                   |       |
|--------------|------------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>FECHA</b> | 16/11/2023 | <b>HORA INICIO</b> | 13:03 | <b>HORA FINAL</b> | 13:56 |
|--------------|------------|--------------------|-------|-------------------|-------|

**DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE**

T-TA-0029-TICACO

**TIPO DE NODO (DISTRIBUCION, CONEXIÓN, AGREGACION)**

DISTRIBUCIÓN

**UBICACIÓN DEL NODO DE LA RED DE TRANSPORTE**

|                  |        |                 |         |                 |         |               |      |
|------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|------|
| <b>PROVINCIA</b> | TARATA | <b>DISTRITO</b> | TICACO  |                 |         |               |      |
| <b>LOCALIDAD</b> | TICACO | <b>LATITUD</b>  | 17.4511 | <b>LONGITUD</b> | 70.0456 | <b>ALTURA</b> | 3264 |
| <b>DIRECCIÓN</b> |        |                 |         |                 |         |               |      |

**PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL)**

|                      |                      |  |                  |          |
|----------------------|----------------------|--|------------------|----------|
| <b>REPRESENTANTE</b> | EDME RUIZ AIMITUMA   |  | <b>D.N.I. N°</b> | 40655360 |
| <b>CARGO</b>         | ING. SUPERVISOR DIOP |  |                  |          |

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)**

|                      |                           |  |                  |          |
|----------------------|---------------------------|--|------------------|----------|
| <b>REPRESENTANTE</b> | FERNANCO COHAILA VILLAGRA |  | <b>D.N.I. N°</b> | 41285572 |
| <b>CARGO</b>         | AUDITOR                   |  |                  |          |
| <b>REPRESENTANTE</b> | JANETH FALCON LOPEZ       |  | <b>D.N.I. N°</b> | 04440208 |
| <b>CARGO</b>         | AUDITOR                   |  |                  |          |

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

En el ingreso del Nodo se observa un montículo de tierra la cual entorpece el acceso al Nodo.  
En la sala de equipos se apreció que una luminaria fluorescente se encuentra quemada, no enciende.

LOS ASPECTOS QUE SON MATERIA DE LA VERIFICACIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN SE DESARROLLAN EN LOS FORMATOS N°s 01 Y 02 ADJUNTOS A LA PRESENTE "ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN", LOS CUALES SON DE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

Por la Contraloría General de la República




|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>FIRMA</b>                |                      |
| <b>Nombres y apellidos:</b> | EDME RUIZ AIMITUMA   |
| <b>DNI:</b>                 | 40655360             |
| <b>Cargo:</b>               | ING. SUPERVISOR DIOP |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>FIRMA</b>                |                           |
| <b>Nombres y apellidos:</b> | FERNANDO COHAILA VILLAGRA |
| <b>DNI:</b>                 | 41285572                  |
| <b>Cargo:</b>               | AUDITOR                   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>FIRMA</b>                |                     |
| <b>Nombres y apellidos:</b> | WILMER PINTO        |
| <b>DNI:</b>                 | 003104735 - CE      |
| <b>Cargo:</b>               | SUPERVISOR TI - OYM |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>FIRMA</b>                |                     |
| <b>Nombres y apellidos:</b> | JANETH FALCON LOPEZ |
| <b>DNI:</b>                 | 04440208            |
| <b>Cargo:</b>               | AUDITOR             |

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**


**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISTA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE**

**DENOMINACIÓN DEL NODO**

T-TA-0029-TICACO

| N° PARTIDA | TÍTULO CONTRACTUAL SOBRE EL TERRENO                                                                                       | TÍTULO INSCRITO | ANCHO (MTS) | LARGO (MTS) | LATITUD | LONGITUD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|
|            | NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL PREDIO INSCRITO EN EL MOMENTO DE LA VISITA, LA INFORMACION SERA REQUERIDA POSTERIORMENTE |                 |             |             |         |          |

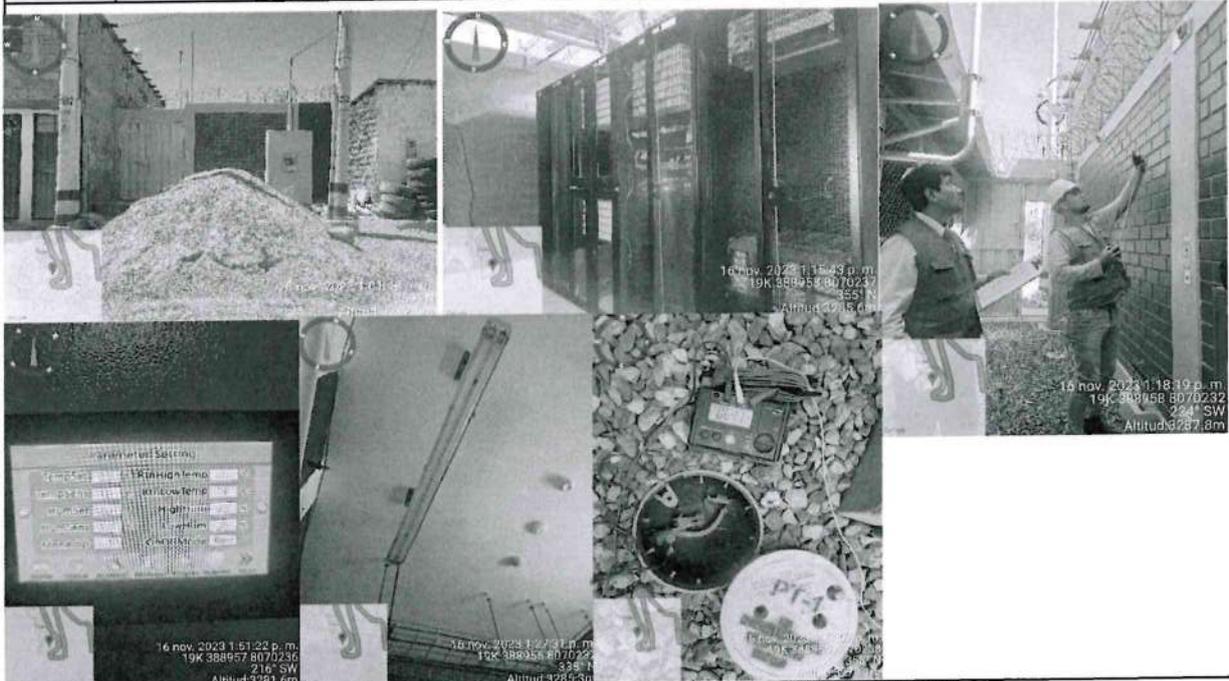

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

Por la Contraloría General de la República

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos: **EDME RUIZ AIMITUMA**

DNI: **40655360**

Cargo: **ING. SUPERVISOR DIOP**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos: **FERNANDO COHAILA VILLAGRA**

DNI: **41285572**

Cargo: **AUDITOR**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos: **WILMER PINTO**

DNI: **003104735 - CE**

Cargo: **SUPERVISOR TI - OYM**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos: **JANETH FALCON LOPEZ**

DNI: **04440208**

Cargo: **AUDITOR**

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE

T-TA-0029-TICACO

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM                          | CONCEPTO                           | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                         |                                                                                       |                 | VALOR EN VISITA |              |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                               |                                    | MARCA                                                                                                                                     | MODELO                                                                                | VALOR           |                 |              |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b> |                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |                 |                 |              |
| 1                             | <b>SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES</b> |                                                                                                                                           |                                                                                       |                 |                 |              |
| 1                             | 1                                  | NODO CONSTRUIDO EN TERRENO ALTO CON BAJA PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN O SOBRE MUELLES CUANDO SE ENCUENTRA EN ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES |                                                                                       |                 |                 |              |
| 1                             | 2                                  | <b>AMBIENTES</b>                                                                                                                          |                                                                                       |                 |                 |              |
| 1                             | 2                                  | 1                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| 1                             | 2                                  | 2                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| 1                             | 2                                  | 3                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| <b>SEGURIDAD EXTERIOR</b>     |                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |                 |                 |              |
| 2                             | 1                                  | <b>CERCO PERIMÉTRICO</b>                                                                                                                  |                                                                                       |                 |                 |              |
| 2                             | 1                                  | 1                                                                                                                                         |                                                                                       | ≥ 2.4 m         | 2.4 m           |              |
| 2                             | 1                                  | 2                                                                                                                                         |                                                                                       | ≥ 0.5 m         | 0.55 m          |              |
| 2                             | 2                                  | <b>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL NODO</b>                                                                                               |                                                                                       |                 |                 |              |
| 2                             | 2                                  | 1                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| 2                             | 2                                  | 2                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| 2                             | 2                                  | 3                                                                                                                                         |                                                                                       | 1               | 1               |              |
| 2                             | 2                                  | 4                                                                                                                                         |                                                                                       |                 | 1               |              |
| <b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>    |                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 1                                  | <b>ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED</b>                                                                                                        |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 1                                  | 1                                                                                                                                         | TECHNIASES                                                                            | QU / RV 427070F | 1               |              |
| 3                             | 1                                  | 2                                                                                                                                         | TECHNIASES                                                                            | QU / RV 427070F | 2               |              |
| 3                             | 1                                  | 3                                                                                                                                         | TECHNIASES                                                                            | QU / RV 427070F | 1               |              |
| 3                             | 1                                  | 4                                                                                                                                         | NET SOLUTIONS                                                                         |                 | 6               |              |
| 3                             | 1                                  | 5                                                                                                                                         | NET SOLUTIONS                                                                         |                 | 12              |              |
| 3                             | 1                                  | 6                                                                                                                                         | BANDEJAS ODF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS |                 |                 | 1            |
| 3                             | 1                                  | 7                                                                                                                                         | BANDEJAS DDF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS |                 |                 | 1            |
| 3                             | 2                                  | <b>CLIMATIZACIÓN</b>                                                                                                                      |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 2                                  | 1                                                                                                                                         | ENVICOOL                                                                              | EF70HDNC1E      | 1               |              |
| 3                             | 2                                  | 2                                                                                                                                         |                                                                                       | 220             | 10°~26°         |              |
| 3                             | 2                                  | 3                                                                                                                                         |                                                                                       |                 | 40%~70%         |              |
| 3                             | 3                                  | <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                                                                                                                  |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 3                                  | 1                                                                                                                                         | MEDIDOR DE LUZ EXTERNO (220 VAC.)                                                     |                 |                 | 228 VAC      |
| 3                             | 3                                  | 2                                                                                                                                         | GAMMA                                                                                 | GPLS-14i        | 1               |              |
| 3                             | 3                                  | 3                                                                                                                                         | TIEMPO DE ESPERA DE ENCENDIDO DEL GRUPO ELECTRÓGENO ANTE CORTE ELÉCTRICO              |                 |                 | 30           |
| 3                             | 3                                  | 4                                                                                                                                         | VOLTAJE PRODUCIDO POR EL GRUPO ELECTRÓGENO LUEGO DE 4 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO       |                 |                 | 220 v +/- 5% |
| 3                             | 3                                  | 5                                                                                                                                         | NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTRÓGENO                                            |                 |                 | >30%         |
| 3                             | 3                                  | 6                                                                                                                                         | TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL AUTOMÁTICO                                         |                 |                 | 1            |
| 3                             | 3                                  | 7                                                                                                                                         | ELTEK                                                                                 | FLATPACK2 48V   | 1               |              |
| 3                             | 3                                  | 8                                                                                                                                         | FIAMM                                                                                 | 12SMG100        | 2               |              |
| 3                             | 3                                  | 9                                                                                                                                         | CARGA DE BANCO DE BATERÍAS -48v +/-57.6 v                                             |                 |                 | 53V          |
| 3                             | 4                                  | <b>SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)</b>                                                                                                  |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 4                                  | 1                                                                                                                                         | CUENTA CON CERTIFICADO DE SISTEMA DE TIERRAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS                |                 | 3PT             |              |
| 3                             | 4                                  | 2                                                                                                                                         | CUENTA CON DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RAYOS (Inspeccion visual)                      |                 |                 | < 5 Ohm      |
| 3                             | 5                                  | <b>SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA</b>                                                                                                         |                                                                                       |                 |                 |              |
| 3                             | 5                                  | 1                                                                                                                                         | ZNV                                                                                   | ZBIG-5231U-N4T  | 1               |              |

*Handwritten signature/initials*

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE**

**DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE**

T-TA-0029-TICACO

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM       | CONCEPTO                                                     | PROPUESTA TÉCNICA |        |                 | VALOR EN VISITA |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|------|
|            |                                                              | MARCA             | MODELO | VALOR           |                 |      |
| 3 5 2      | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE FUERZAS              |                   | ZNV    | ZBIG-5231U-N4T  | 1               | 1    |
| 3 5 3      | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR DEL PATIO DEL NODO              |                   | ZNV    | ZHIG-2361U-EN1T | 1               | 1    |
| 3 5 4      | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR AL INGRESO AL NODO              |                   | ZNV    | ZHIG-2361U-EN1T | 1               | 1    |
| 3 5 5      | GRABADOR DE VIDEO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3 TB    |                   | ZNV    | ZXNM-N4104U-E   | 1               | 1 TB |
| 3 5 6      | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN DÍAS) LOCALMENTE             |                   |        |                 | 30              | ✓    |
| 3 5 7      | SEÑAL DE VIDEO ES MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC      |                   |        |                 |                 | ✓    |
| <b>3 6</b> | <b>SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE</b>                         |                   |        |                 |                 |      |
| 3 6 1      | CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE                                |                   | ZNV    | FSU ZNV IG200   | 1               | 1    |
| 3 6 2      | SENSOR MAGNETICO (SALA EQUIPOS / SALA DE FUERZA)             |                   |        |                 | 2               | 2    |
| 3 6 3      | SENSOR DE ANIEGO SALA DE EQUIPOS                             |                   |        |                 | 2               | 2    |
| 3 6 4      | SENSOR DE MOVIMIENTO 90° (PATIO)                             |                   |        |                 | 1               | 1    |
| 3 6 5      | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° (SALA DE EQUIPOS / SALA DE FUERZA) |                   |        |                 | 2               | 2    |
| 3 6 6      | SIRENA ESTROBOSCOPICA / PUSH BUTTON                          |                   |        |                 | 1               | 1    |
| 3 6 7      | ALARMAS MONITOREADA Y ALMACENADA LOCALMENTE                  |                   |        |                 |                 | NO   |
| 3 6 8      | ALARMAS MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC                |                   |        |                 |                 | SI   |
| <b>3 7</b> | <b>SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINTORES DE INCENDIOS</b>        |                   |        |                 |                 |      |
| 3 7 1      | DETECTORES EN SALA DE EQUIPOS (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)       |                   |        |                 | 3               | 3    |
| 3 7 2      | DETECTORES EN SALA DE FUERZA (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)        |                   |        |                 | 3               | 3    |
| 3 7 3      | EXTINTOR CO2 EN SALA DE EQUIPOS (VIGENTE)                    |                   |        |                 | 1               | 1    |
| 3 7 4      | EXTINTOR CO2 EN PATIO (VIGENTE)                              |                   |        |                 | 1               | 1    |
| <b>4</b>   | <b>NIVELES DE SERVICIO</b>                                   |                   |        |                 |                 |      |
| <b>4 1</b> | <b>DISPONIBILIDAD DE LA RED</b>                              |                   |        |                 |                 |      |
| 4 1 1      | LATENCIA                                                     |                   |        |                 | <30ms           | -    |
| 4 1 2      | PÉRDIDA DE PAQUETES                                          |                   |        |                 | <0.3%           | -    |
| 4 1 3      | JITTER MÁXIMO                                                |                   |        |                 | <20ms           | -    |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

| ÍTEM | DETALLE DE OBSERVACIÓN (O) / COMENTARIO (C) |
|------|---------------------------------------------|
|------|---------------------------------------------|

NO SE PUDO COMPROBAR LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE DATOS, DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATISTA OROCOM MANIFESTO QUE DE ACUERDO A SU PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EQUIPOS DE LA RED DE DATOS, SE DEBE SOLICITAR UN PERMISO AL PERSONAL DEL NOC DE OROCOM CON POR LO MENORS 15 DIAS DE ANTICIPACION.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARACTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SENAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

Por la Contraloría General de la República

FIRMA  
Nombres y apellidos: EDME RUIZ AIMITUMA  
DNI: 40655360  
Cargo: ING. SUPERVISOR DIOP

FIRMA  
Nombres y apellidos: FERNANDO COHAILA VILLAGRA  
DNI: 41285572  
Cargo: AUDITOR



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE

T-TA-0029-TICACO

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |        |       | VALOR EN VISITA |
|------|----------|-------------------|--------|-------|-----------------|
|      |          | MARCA             | MODELO | VALOR |                 |

FIRMA

Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

FIRMA

Nombres y apellidos:

JANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE ACCESO

INFORMACIÓN BÁSICA

|                                                   |            |             |          |            |          |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------|----------|
| FECHA                                             | 16/11/2023 | HORA INICIO | 14:04    | HORA FINAL | 14:39    |
| DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE               |            |             |          |            |          |
| TA-A-4013-TICACO                                  |            |             |          |            |          |
| TIPO DE NODO (DISTRIBUCION, CONEXIÓN, AGREGACION) |            |             |          |            |          |
| ACCESO /TERMINAL                                  |            |             |          |            |          |
| UBICACIÓN DEL NODO DE LA RED DE TRANSPORTE        |            |             |          |            |          |
| PROVINCIA                                         | TARATA     | DISTRITO    | TICACO   |            |          |
| LOCALIDAD                                         | TICACO     | LATITUD     | -70.0457 | LONGITUD   | -17.4511 |
| DIRECCIÓN                                         |            | ALTURA      | 3350 M   |            |          |

PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL)

|                                           |                           |           |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE                             | EDME RUIZ AIMITUMA        |           |          |
| CARGO                                     | ING. SUPERVISOR DIOP      | D.N.I. N° | 40655360 |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) |                           |           |          |
| REPRESENTANTE                             | FERNANCO COHAILA VILLAGRA |           |          |
| CARGO                                     | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 41285572 |
| REPRESENTANTE                             | JANETH FALCON LOPEZ       |           |          |
| CARGO                                     | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 04440208 |

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS


LOS ASPECTOS QUE SON MATERIA DE LA VERIFICACIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN SE DESARROLLAN EN LOS FORMATOS N°s 01 Y 02 ADJUNTOS A LA PRESENTE "ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN", LOS CUALES SON DE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.


Por la entidad visitada

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: EDME RUIZ AIMITUMA  
DNI: 40655360  
Cargo: ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: FERNANDO COHAILA VILLAGRA  
DNI: 41285572  
Cargo: AUDITOR

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: WILMER PINTO  
DNI: 003104735 - CE  
Cargo: SUPERVISOR TI - OYM

  
FIRMA  
Nombres y apellidos: JANETH FALCON LOPEZ  
DNI: 04440208  
Cargo: AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE ACCESO

DENOMINACIÓN DEL NODO

TA-A-4013-TICACO

| N° PARTIDA | TÍTULO CONTRACTUAL SOBRE EL TERRENO                                                     | TÍTULO INSCRITO | ANCHO (MTS) | LARGO (MTS) | LATITUD | LONGITUD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|
|            | NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN AL MOMENTO DE LA VISITA, SERÁ PROPORCIONADA POSTERIORMENTE |                 |             |             |         |          |



LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

  
FIRMA

Nombres y apellidos:


WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

JANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE ACCESO

T-TA-A-40 TA-A-4013-TICACO

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM  | CONCEPTO                                                                                                                                  | PROPUESTA TÉCNICA |                |         | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO    | OPERATIVO SI/NO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                           | MARCA             | MODELO         | VALOR   |                 |                 |                 |
| 1     | OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                    |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 1 1   | SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES                                                                                                               |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 1 1 1 | NODO CONSTRUÍDO EN TERRENO ALTO CON BAJA PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN O SOBRE MUELLES CUANDO SE ENCUENTRA EN ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES |                   |                |         | 1               | SI              | SI              |
| 2     | SEGURIDAD EXTERIOR                                                                                                                        |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 2 1   | CERCO PERIMÉTRICO                                                                                                                         |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 2 1 1 | CERCO PERIMÉTRICO                                                                                                                         |                   |                | ≥ 2.4 m | 2.60            | SI              | SI              |
| 2 1 2 | CONCERTINA                                                                                                                                |                   |                | ≥ 0.5 m | 0.51            | SI              | SI              |
| 2 2   | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL NODO                                                                                                      |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 2 2 1 | PUERTA DE ACCESO AL NODO SERÁ METÁLICA                                                                                                    |                   |                | 1       | 1               |                 |                 |
| 2 2 2 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA Y ELÉCTRICA                                                                                                    |                   |                | 1       | 1               |                 |                 |
| 2 2 3 | LECTOR BIOMÉTRICO /TECLADO                                                                                                                |                   |                | 1       | X               | Solo biométrico |                 |
| 2 2 4 | APERTURA DE PUERTA DESDE EL HOC                                                                                                           |                   |                |         | 1               |                 |                 |
| 3     | EQUIPAMIENTO BÁSICO                                                                                                                       |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 1   | CLIMATIZACIÓN                                                                                                                             |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 1 1 | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN                                                                                                           | ENVICOOL          | EF70HD1C1E     | 1       |                 |                 |                 |
| 3 1 2 | TEMPERATURA DEL AMBIENTE                                                                                                                  |                   |                | 220     | 10°~26°         | 24.2            | SI              |
| 3 1 3 | HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE                                                                                                             |                   |                |         | 40%~70%         | No mide         |                 |
| 3 3   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                         |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 3 1 | MEDIDOR DE LUZ EXTERNO (220 VAC.)                                                                                                         |                   |                | 1       |                 | 229             | SI SI           |
| 3 3 7 | RECTIFICADOR /CARGADOR                                                                                                                    | ELTEK             | FLATPACK2 48V  | 1       |                 | 2               | SI SI           |
| 3 3 8 | BANCO DE BATERÍAS                                                                                                                         | FIAMM             | 125MG100       | 2       |                 | 1               | SI SI           |
| 3 3 9 | CARGA DE BANCO DE BATERÍAS -48v /-57.6 v                                                                                                  |                   |                |         |                 | 53.7            | SI SI           |
| 3 4   | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)                                                                                                         |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 4 1 | CUENTA CON CERTIFICADO DE SISTEMA DE TIERRAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS                                                                    | 3PT               |                | < 5 Ohm |                 | 3.00            | 1.89            |
| 3 4 2 | CUENTA CON DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RAYOS (inspeccion visual)                                                                          |                   |                | 1       |                 | 1               | SI              |
| 3 5   | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA                                                                                                                |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 5 1 | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE EQUIPOS                                                                                           | ZHV               | ZBIG-5231U-H4T | 1       |                 | 1               | SI SI           |
| 3 5 6 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN DÍAS) LOCALMENTE                                                                                          |                   |                | 30      |                 |                 | SI SI           |
| 3 5 7 | SEÑAL DE VIDEO ES MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC                                                                                   |                   |                |         |                 |                 | SI SI           |
| 3 6   | SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE                                                                                                             |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 6 1 | CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE                                                                                                             | ZHV               | FSU ZHV IG200  | 1       |                 | 1               |                 |
| 3 6 3 | SENSOR DE ANIEGO SALA DE EQUIPOS                                                                                                          |                   |                | 2       |                 | 1               | SHELTER         |
| 3 6 4 | SENSOR DE MOVIMIENTO 90° (PATIO)                                                                                                          |                   |                | 1       |                 | 1               |                 |
| 3 6 6 | SIRENA ESTROBOSCOPICA / PUSH BUTTON                                                                                                       |                   |                | 1       |                 | 1               |                 |
| 3 7   | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINTORES DE INCENDIOS                                                                                            |                   |                |         |                 |                 |                 |
| 3 7 1 | DETECTORES EN SALA DE EQUIPOS (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)                                                                                    |                   |                | 1       |                 | 1 (HUMO)        | SI SI           |
| 3 7 2 | DETECTORES EN SALA DE FUERZA (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)                                                                                     |                   |                | 1       |                 | 1 (ANIEGO)      | SI SI           |
| 3 7 4 | EXTINTOR CO2 EN PATIO (VIGENTE)                                                                                                           |                   |                | 1       |                 | 1 VENCIDO       | NO NO           |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

| ÍTEM | DETALLE DE OBSERVACIÓN (O) / COMENTARIO (C)                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tiene (01) gabinete de telefónica del Perú, pero el contratista indica que contrato está vencido por lo cual debe ser retirado. Además tiene un extintor vencido a octubre de 2023 |

LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARACTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SENAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

Por la Contraloría General de la República



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACION DEL NODO DE ACCESO

T-TA-A-40 TA-A-4013-TICACO

LA SIGUIENTE VERIFICACION SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM                 | CONCEPTO              | PROPUESTA TÉCNICA |        |                      | VALOR EN VISITA           | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
|                      |                       | MARCA             | MODELO | VALOR                |                           |              |                 |
| FIRMA                |                       |                   |        | FIRMA                |                           |              |                 |
| Nombres y apellidos: | EDMUNDO RUIZ ALMITOMA |                   |        | Nombres y apellidos: | FERNANDO COCHA LA VILAGRA |              |                 |
| DNI:                 | 40655360              |                   |        | DNI:                 | 41285572                  |              |                 |
| Cargo:               | ING. SUPERVISOR DIOP  |                   |        | Cargo:               | AUDITOR                   |              |                 |
| FIRMA                |                       |                   |        | FIRMA                |                           |              |                 |
| Nombres y apellidos: | WILMER PINTO          |                   |        | Nombres y apellidos: | JANETH FALCON LOPEZ       |              |                 |
| DNI:                 | 003104735 - CE        |                   |        | DNI:                 | 04440208                  |              |                 |
| Cargo:               | SUPERVISOR TI - OYM   |                   |        | Cargo:               | AUDITOR                   |              |                 |

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**


**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

|                                                                                                                                        |                           |                    |                     |                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|
| <b>FECHA</b>                                                                                                                           | 17/11/2023                | <b>HORA INICIO</b> | 10:54               | <b>HORA FINAL</b> | 11:35   |
| <b>DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE</b>                                                                                             |                           |                    |                     |                   |         |
| TA_T_0012_LOS_PALOS                                                                                                                    |                           |                    |                     |                   |         |
| <b>TIPO DE NODO (DISTRIBUCION, CONEXIÓN, AGREGACION)</b>                                                                               |                           |                    |                     |                   |         |
| NODO DE DISTRIBUCION DE LA RED DE TRANSPORTE                                                                                           |                           |                    |                     |                   |         |
| <b>UBICACIÓN DEL NODO DE LA RED DE TRANSPORTE</b>                                                                                      |                           |                    |                     |                   |         |
| <b>PROVINCIA</b>                                                                                                                       | TACNA                     | <b>DISTRITO</b>    | LA YARADA LOS PALOS |                   |         |
| <b>LOCALIDAD</b>                                                                                                                       | LOS PALOS                 | <b>LATITUD</b>     | 70.4413             | <b>LONGITUD</b>   | 18.2889 |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                                                                                                       |                           | <b>ALTURA</b>      | 30 msnm             |                   |         |
| <b>PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL)</b>                                                                              |                           |                    |                     |                   |         |
| <b>REPRESENTANTE</b>                                                                                                                   | EDME RUIZ AIMITUMA        |                    |                     |                   |         |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                           | ING. SUPERVISOR DIOP      | <b>D.N.I. N°</b>   | 40655360            |                   |         |
| <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)</b>                                                                                       |                           |                    |                     |                   |         |
| <b>REPRESENTANTE</b>                                                                                                                   | EYLEEN ARIAS HINOJOSA     |                    |                     |                   |         |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                           | AUDITOR                   | <b>D.N.I. N°</b>   | 41455426            |                   |         |
| <b>REPRESENTANTE</b>                                                                                                                   | FERNANDO COHAILA VILLAGRA |                    |                     |                   |         |
| <b>CARGO</b>                                                                                                                           | AUDITOR                   | <b>D.N.I. N°</b>   | 41285572            |                   |         |
| <b>OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS</b>                                                                                                   |                           |                    |                     |                   |         |
| SE INICIA LA PRESENTE VISITA CON PERSONAL DE PRONATEL Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ING WILMER PINTO SUPERVISOR TI - OYM DEL CONTRATISTA OROCOM |                           |                    |                     |                   |         |

LOS ASPECTOS QUE SON MATERIA DE LA VERIFICACIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN SE DESARROLLAN EN LOS FORMATOS N°s 01 Y 02 ADJUNTOS A LA PRESENTE "ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN", LOS CUALES SON DE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

Por la Contraloría General de la República



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:




FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**



**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE**

**DENOMINACIÓN DEL NODO**

TA\_T\_0012\_LOS\_PALOS

| Nº PARTIDA | TÍTULO CONTRACTUAL SOBRE EL TERRENO                                                                                 | TÍTULO INSCRITO | ANCHO (MTS) | LARGO (MTS) | LATITUD | LONGITUD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|
| -          | EL REPRESENTANTE DE PRONATEL INDICA QUE NO TIEN LA INFORMACION RESPECTO AL TITULO PERO SERA REMITIDA POSTERIORMENTE |                 | -           | -           | 70.4413 | 18.2889  |

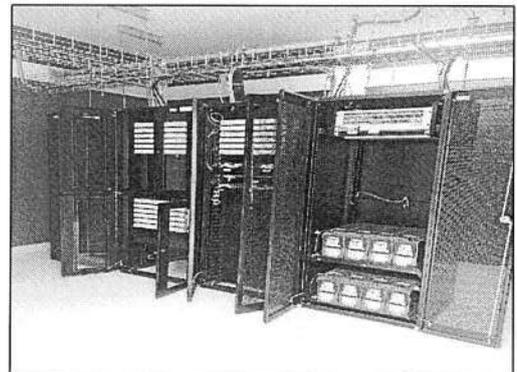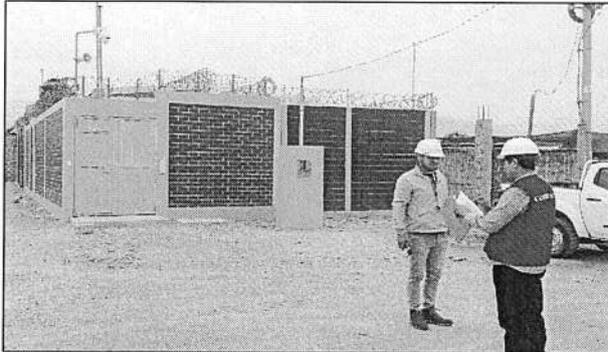

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos:

EYLEEN ARIAS HINOJOSA

DNI:

41455426

Cargo:

AUDITOR

Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM                                            | CONCEPTO                                                                                                                                  | PROPUESTA TÉCNICA |                 |               | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                                 |                                                                                                                                           | MARCA             | MODELO          | VALOR         |                 |              |                 |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b>                   |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| <b>1 1 SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES</b>          |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 1 1 1                                           | NODO CONSTRUÍDO EN TERRENO ALTO CON BAJA PROBABILIDAD DE INUNDACIÓN O SOBRE MUELLES CUANDO SE ENCUENTRA EN ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES |                   |                 |               | 1               | SI           | SI              |
| <b>1 2 AMBIENTES</b>                            |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 1 2 1                                           | SALA DE EQUIPOS                                                                                                                           |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 2                                           | GRUPO ELECTRÓGENO                                                                                                                         |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 3                                           | BAÑO                                                                                                                                      |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| <b>2 SEGURIDAD EXTERIOR</b>                     |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| <b>2 1 CERCO PERIMÉTRICO</b>                    |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 2 1 1                                           | CERCO PERIMÉTRICO                                                                                                                         |                   |                 | ≥ 2.4 m       | 2.90            | SI           |                 |
| 2 1 2                                           | CONCERTINA                                                                                                                                |                   |                 | ≥ 0.5 m       | 0.55            | SI           |                 |
| <b>2 2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL NODO</b> |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 2 2 1                                           | PUERTA DE ACCESO AL NODO SERÁ METÁLICA                                                                                                    |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 2 2 2                                           | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA Y ELÉCTRICA                                                                                                    |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 2 2 3                                           | LECTOR BIOMÉTRICO /TECLADO                                                                                                                |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 2 2 4                                           | APERTURA DE PUERTA DESDE EL NOC                                                                                                           |                   |                 |               |                 | SI           |                 |
| <b>3 EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>                    |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| <b>3 1 ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED</b>          |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 1 1                                           | GABINETES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES ODF/DDF                                                                                             | TECHNIASES        | QU / RV 427070F | 1             | 1               | SI           |                 |
| 3 1 2                                           | GABINETES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                                                                                    | TECHNIASES        | QU / RV 427070F | 2             | 2               | SI           |                 |
| 3 1 3                                           | RACK DE ENERGÍA                                                                                                                           | TECHNIASES        | QU / RV 427070F | 1             | 1               | SI           |                 |
| 3 1 4                                           | BANDEJAS ODF PARA FIBRA ÓPTICA DE 48 HILOS                                                                                                | NET SOLUTIONS     |                 | 6             | 6               | SI           |                 |
| 3 1 5                                           | BANDEJAS DDF PARA FIBRA ÓPTICA DE 48 HILOS                                                                                                | NET SOLUTIONS     |                 | 12            | 12              | SI           |                 |
| 3 1 6                                           | BANDEJAS ODF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS                                                     |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 1 7                                           | BANDEJAS DDF CONECTADAS Y CON MULTIFIBRA, PATCH CORDS DE FIBRA Y ETIQUETADO COMPLETOS                                                     |                   |                 |               |                 |              |                 |
| <b>3 2 CLIMATIZACIÓN</b>                        |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 2 1                                           | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN                                                                                                           | ENVICOOL          | EF70HDC1E       | 1             | 1               | SI           |                 |
| 3 2 2                                           | TEMPERATURA DEL AMBIENTE                                                                                                                  |                   |                 | 10°~26°       | 22°             | SI           |                 |
| 3 2 3                                           | HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE                                                                                                             |                   |                 | 40%~70%       | 60.0%           | SI           |                 |
| <b>3 3 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                    |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 3 1                                           | MEDIDOR DE LUZ EXTERNO (220 VAC.)                                                                                                         |                   |                 | 1             | 230V            | SI           | SI              |
| 3 3 2                                           | GRUPO ELECTRÓGENO INSONORO 10KVA                                                                                                          | GAMMA             | GPL5-10i        | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 3 3                                           | TIEMPO DE ESPERA DE ENCENDIDO DEL GRUPO ELECTRÓGENO ANTE CORTE ELÉCTRICO                                                                  |                   |                 | 30            | 30              | SI           |                 |
| 3 3 4                                           | VOLTAJE PRODUCIDO POR EL GRUPO ELECTRÓGENO LUEGO DE 4 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                           |                   |                 | 220 v +/- 5%  | 225V            | SI           |                 |
| 3 3 5                                           | NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTRÓGENO                                                                                                |                   |                 | >30%          | 89%             | SI           |                 |
| 3 3 6                                           | TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL AUTOMÁTICO                                                                                             |                   |                 | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 3 7                                           | RECTIFICADOR /CARGADOR                                                                                                                    | ELTEK             | FLATPACK2 48V   | 2             | 2               | SI           | SI              |
| 3 3 8                                           | BANCO DE BATERÍAS                                                                                                                         | FIAMM             | 12SMG100        | 2             | 2               | SI           | SI              |
| 3 3 9                                           | CARGA DE BANCO DE BATERÍAS -48v /-57.6 v                                                                                                  |                   |                 |               | 53.7/53.7       | SI           | SI              |
| <b>3 4 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)</b>    |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 4 1                                           | CUENTA CON CERTIFICADO DE SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS ELECTRONICOS                                                                     |                   |                 | < 5 Ohm       | 0.58 Ω / 1.13 Ω | -            |                 |
| 3 4 2                                           | CUENTA CON DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RAYOS (inspeccion visual)                                                                          |                   |                 | 1             | 1               |              |                 |
| <b>3 5 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA</b>           |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 5 1                                           | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE EQUIPOS                                                                                           |                   | ZNV             | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 5 2                                           | CÁMARA DE VIDEO PTZ INTERIOR EN SALA DE FUERZAS                                                                                           |                   | ZNV             | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 5 3                                           | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR DEL PATIO DEL NODO                                                                                           |                   | ZNV             | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 5 4                                           | CÁMARA DE VIDEO PTZ EXTERIOR AL INGRESO AL NODO                                                                                           |                   | ZNV             | 1             | 1               | SI           | SI              |
| 3 5 5                                           | GRABADOR DE VIDEO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3 TB                                                                                 |                   | ZNV             | 1             | 1 TB            | NO           | SI              |
| 3 5 6                                           | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN DÍAS) LOCALMENTE                                                                                          |                   |                 | 30            |                 |              |                 |
| 3 5 7                                           | SEÑAL DE VIDEO ES MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC                                                                                   |                   |                 |               |                 |              |                 |
| <b>3 6 SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE</b>        |                                                                                                                                           |                   |                 |               |                 |              |                 |
| 3 6 1                                           | CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE                                                                                                             |                   | ZNV             | FSU ZNV IG200 | 1               | 1            | SI              |
| 3 6 2                                           | SENSOR MAGNETICO (SALA EQUIPOS / SALA DE FUERZA)                                                                                          |                   |                 |               | 2               | 2            | SI              |
| 3 6 3                                           | SENSOR DE ANIEGO SALA DE EQUIPOS                                                                                                          |                   |                 |               | 2               | 2            | SI              |
| 3 6 4                                           | SENSOR DE MOVIMIENTO 90° (PATIO)                                                                                                          |                   |                 |               | 1               | 1            | SI              |

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

DENOMINACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM  | CONCEPTO                                                     | PROPUESTA TÉCNICA |        |       | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
|       |                                                              | MARCA             | MODELO | VALOR |                 |              |                 |
| 3 6 5 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° (SALA DE EQUIPOS / SALA DE FUERZA) |                   |        | 2     | 2               |              | SI              |
| 3 6 6 | SIRENA ESTROBOSCÓPICA / PUSH BUTTON                          |                   |        | 1     | 1               |              | SI              |
| 3 6 7 | ALARMAS MONITOREADA Y ALMACENADA LOCALMENTE                  |                   |        |       |                 |              |                 |
| 3 6 8 | ALARMAS MONITOREADA Y ALMACENADA DESDE EL NOC                |                   |        |       |                 |              |                 |
| 3 7   | <b>SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINTORES DE INCENDIOS</b>        |                   |        |       |                 |              |                 |
| 3 7 1 | DETECTORES EN SALA DE EQUIPOS (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)       |                   |        | 3     | 3               |              | SI              |
| 3 7 2 | DETECTORES EN SALA DE FUERZA (HUMO-TEMPERATURA-FLAMA)        |                   |        | 3     | 3               |              | SI              |
| 3 7 3 | EXTINTOR CO2 EN SALA DE EQUIPOS (VIGENTE)                    |                   |        | 1     | 1               |              | SI              |
| 3 7 4 | EXTINTOR CO2 EN PATIO (VIGENTE)                              |                   |        | 1     | 1               |              | SI              |
| 4     | <b>NIVELES DE SERVICIO</b>                                   |                   |        |       |                 |              |                 |
| 4 1   | <b>DISPONIBILIDAD DE LA RED</b>                              |                   |        |       |                 |              |                 |
| 4 1 1 | LATENCIA                                                     |                   |        | <30ms |                 |              |                 |
| 4 1 2 | PÉRDIDA DE PAQUETES                                          |                   |        | <0.3% |                 |              |                 |
| 4 1 3 | JITTER MÁXIMO                                                |                   |        | <20ms |                 |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

ÍTEM

DETALLE DE OBSERVACIÓN (O) / COMENTARIO (C)

ÍTEM 4.1.1, ÍTEM 4.1.2, ÍTEM 4.1.3 - NO SE HAN REALIZADO LAS PRUEBAS DEBIDO A QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATISTA OROCOM, INDICA QUE SE DEBE SOLICITAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A OPERACIONES DE OROCOM LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS CON QUINCE (15) DIAS DE ANTICIPACION.  
 ÍTEM 3.5.5 - LA CAPACIDAD DEL DISCO DURO DEL DVR DE LAS CAMARAS SOLO TIENE 1TB EN EL EQUIPO UBICADO EN EL NODO, EL SUPERVISOR DEL CONTRATISTA DE OROCOM INDICA QUE EL EQUIPO UBICADO EN EL NODO TIENE MAYOR CAPACIDAD.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARACTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA


DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República



FIRMA

Nombres y apellidos:

EYLEEN ARIAS HINOJOSA

DNI:

41455426

Cargo:

AUDITOR

FIRMA



Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

FIRMA



Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A CENTRO DE MANTENIMIENTO**

**DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO**

|                              |                    |       |                   |       |
|------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>FECHA:</b> 17 / 11 / 2023 | <b>HORA INICIO</b> | 13:22 | <b>HORA FINAL</b> | 14:15 |
|------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

| ÍTEM                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                     | PROPUESTA TÉCNICA |        |        | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
|                               |                                                                                                                                                                              | MARCA             | MODELO | VALOR  |                 |              |                 |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b> |                                                                                                                                                                              |                   |        |        |                 |              |                 |
| <b>1</b>                      | <b>UBICACIÓN</b>                                                                                                                                                             |                   |        |        |                 |              |                 |
| 1 1 1                         | UBICADO DENTRO DE LA ZONA URBANA A NO MÁS DE CINCO KMS DE LA PLAZA PRINCIPAL                                                                                                 |                   |        |        | 9.22 KM         |              |                 |
| <b>1 2</b>                    | <b>SERVICIOS Y/O REQUERIMIENTOS</b>                                                                                                                                          |                   |        |        |                 |              |                 |
| 1 2 1                         | AGUA                                                                                                                                                                         |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 2                         | ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                 |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 3                         | DESAGUE                                                                                                                                                                      |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 4                         | ACCESO LIBRE A TRANSITO VEHICULAR                                                                                                                                            |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 5                         | CONEXIÓN DE RED                                                                                                                                                              |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 6                         | AREA MINIMA DE 120 M2, TOTALMENTE CERCADO                                                                                                                                    |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 7                         | PORTÓN METÁLICO, FACIL INGRESO DE CAMIONETA                                                                                                                                  |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 8                         | OFICINA DE AL MENOS 10 METROS CUADRADOS                                                                                                                                      |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 1 2 9                         | ALMACEN DE ALMENOS 40 METROS CUADRADOS                                                                                                                                       |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| <b>2</b>                      | <b>SEGURIDAD EXTERIOR</b>                                                                                                                                                    |                   |        |        |                 |              |                 |
| <b>2 1</b>                    | <b>CERCO PERIMÉTRICO</b>                                                                                                                                                     |                   |        |        |                 |              |                 |
| 2 1 1                         | CERCO PERIMÉTRICO                                                                                                                                                            |                   |        |        | ≥ 3 m           | 1.00         | 3.1             |
| <b>3</b>                      | <b>CAMIONETA PICK UP</b>                                                                                                                                                     |                   |        |        |                 |              |                 |
| <b>3 1</b>                    | <b>ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED</b>                                                                                                                                           |                   |        |        |                 |              |                 |
| 3 1 1                         | CAMIONETA PICK UP                                                                                                                                                            | si                |        | Placa: | BL N - 915      | SI           | SI              |
| <b>3 2</b>                    | <b>COMPONENTES</b>                                                                                                                                                           |                   |        |        |                 |              |                 |
| 3 2 1                         | Doble cabina                                                                                                                                                                 |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 2                         | Transmisión mecánica, 4x4 doble tracción todo terreno                                                                                                                        |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 3                         | Turbo diésel intercooler                                                                                                                                                     |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 4                         | Luces con circulina                                                                                                                                                          |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 5                         | Luz pirata con faros neblineros                                                                                                                                              |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 6                         | Jaula metálica de seguridad antivolcadura                                                                                                                                    |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 7                         | Airbag (piloto y copiloto)                                                                                                                                                   |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 8                         | Aros de 17"                                                                                                                                                                  |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 9                         | Seguros pertinentes                                                                                                                                                          |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| 3 2 10                        | Set de accesorios de seguridad, extinguidor, llave de ruedas, gata hidráulica, triangulo de seguridad, botiquín de primeros auxilios y llanta de repuesto.                   |                   |        |        | 1               | SI           | SI              |
| <b>4</b>                      | <b>CENTRO DE MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                               |                   |        |        |                 |              |                 |
| <b>4 1</b>                    | <b>EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE CENTRO DE MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                        |                   |        |        |                 |              |                 |
| 4 1 1                         | Tarjetas de transmisión de fibra óptica de las mismas características utilizadas en el Nodo Core.                                                                            |                   |        |        | 2               | -            | -               |
| 4 1 2                         | Equipos enrutadores con las mismas características del instalado en los Nodos de Agregación.                                                                                 |                   |        |        | 2               | -            | -               |
| 4 1 3                         | Equipos enrutadores con las mismas características del instalado en los Nodos de Distribución.                                                                               |                   |        |        | 3               | -            | -               |
| 4 1 4                         | Servidor con las mismas características del instalado en el NOC para la gestión de datos.                                                                                    |                   |        |        | 1               | 1            | SI              |
| 4 1 5                         | Banco de batería con las mismas características técnicas utilizadas en la Sala de Equipos del NOC.                                                                           |                   |        |        | 1               | 1            | SI              |
| 4 1 6                         | Bancos de baterías con las mismas características técnicas utilizadas en los Nodos ópticos.                                                                                  |                   |        |        | 2               | 2            | SI              |
| 4 1 7                         | Empalmadora por fusión que alineen las fibras ópticas en base a sus núcleos, que incluya cortadora automática y sonda de exploración para determinar limpieza de conectores. |                   |        |        | 1               | 1            | SI              |
| 4 1 8                         | Carrete de cable de fibra óptica por cada uno de los dos tipo de vanos más utilizados en el tendido de la red de transporte.                                                 |                   |        |        | 1               | 1            | SI              |
| 4 1 9                         | Postes de concreto armado centrifugado o de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de las mismas características técnicas utilizado en la red de transporte.               |                   |        |        | 5               | 5            | SI              |
| 4 1 10                        | Gabinets suficientes y adecuados para almacenar los equipos enrutadores, servidores e instrumentos de medición y herramientas.                                               |                   |        |        | 1               | 1            | SI              |
| <b>4 2</b>                    | <b>Instrumentos de medición OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)</b>                                                                                                     |                   |        |        |                 |              |                 |

**CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL**

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA**

**ACTA DE VISITA DE INSPECCION A CENTRO DE MANTENIMIENTO**

**DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO**

**FECHA:** 17 / 11 / 2023

**HORA INICIO**

13:22

**HORA FINAL**

14:15

LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN SE REALIZA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRONATEL Y SE COMPLEMENTA CON LO MANIFESTADO POR EL CONTRATADO Y LO OBSERVADO POR EL EQUIPO DE CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA VISITA DE CONTROL.

|   |   |   |                                                                                               |  |   |    |    |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|----|
| 4 | 2 | 1 | Rango dinámico mínimo 40 dB.                                                                  |  | 1 | SI | SI |
| 4 | 2 | 2 | Reporte de medición tanto en entorno gráfico como traza reflectométrica.                      |  | - |    |    |
| 4 | 2 | 3 | Módulo de medición para FO monomodo G652.D.                                                   |  | - |    |    |
| 4 | 2 | 4 | Capacidad de medición mínima en la Banda O y C.                                               |  | - |    |    |
| 4 | 2 | 5 | Capacidad para analizar resultados en ambas direcciones y mostrar un promedio como resultado. |  | - |    |    |
| 4 | 2 | 6 | Bobina de lanzamiento                                                                         |  | - |    |    |
| 4 | 2 | 7 | patchcords                                                                                    |  | - |    |    |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

**ÍTEM**

**DETALLE DE OBSERVACIÓN (O) / COMENTARIO (C)**

ITEM 4.1.1, ITEM 4.1.2, ITEM 4.1.3 . EL SUPERVISOR DEL CONTRATISTA OROCOM INDICA QUE SE DEBE REQUERIR LA INFORMACION PRECISANDO LA MARCA Y MODELO DEL REPUESTO REQUERIDO Y SOLICITAR LA INFORMACION A PRONATEL Y OROCOM PARA SU VERIFICACION.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARACTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República



FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

WILMÉR PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM

FIRMA

Nombres y apellidos:

Eyleen Scarleth Arias Hinojosa

DNI:

41475426

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

|       |            |             |       |            |       |
|-------|------------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 13/10/2013 | HORA INICIO | 12:50 | HORA FINAL | 14:30 |
|-------|------------|-------------|-------|------------|-------|

1.1. PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL) DIRECTOR - IE

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| REPRESENTANTE | BERNARDO AQUINO VILLANUEVA |
| CARGO         | DIRECTOR DE IE             |

1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

|               |                           |           |          |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHAIZA VILLAGRA |           |          |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 41285572 |
| REPRESENTANTE | JANETH FALCON LOPEZ       |           |          |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 04440208 |

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)

COLEGIO N° 42076 JOSE CARLOS MARIA TEGUI

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

|           |               |          |               |
|-----------|---------------|----------|---------------|
| PROVINCIA | CANDARAVE     | DISTRITO | ALTO CAMILACA |
| LOCALIDAD | ALTO CAMILACA | LATITUD  | -17.242737    |
|           |               | LONGITUD | -70.389       |
|           |               | ALTURA   | 3888.8        |

3.2 CONECTIVIDAD

|                                                                  |   |            |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------|---|------------|----|---------|----|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)                                  |   |            |    |         |    |
| CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |   |            |    |         |    |
| AGOSTO                                                           | 0 | SEPTIEMBRE | 30 | OCTUBRE | 30 |

LATENCIA DE RED (MS)

PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |   |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                |                 |   |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 1               |                | ✓               |   |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | 1               |                | ✓               |   |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 1               |                | ✓               |   |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCED | AH 2700         | HTJT1905021335 | 1               | ✓ |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCED | AH 2700         | HTJT1905021406 | 1               | ✓ |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCED | AH 2700         | HTS1905021432  | 1               | ✓ |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCED | AH 2700         | HTS1905023670  | 1               | ✓ |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCED | AH 2700         | HTS1905021337  | 1               | ✓ |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                |                 |   |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                |                 |   |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor    | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |          |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 7.5 Mbps |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 9.7 Mbps |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |          |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 30 ms    |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |          |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                | 1        |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |          |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |          |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |          |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL DIRECTOR DE LA IEE REFIERE QUE NO HA TENIDO SERVICIO DE INTERNET EN EL MES DE AGOSTO, Pese a las llamadas al proveedor OROCON, RECIENTE SE ACERCARON A REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ADJUNTA ACTA DE VISITA, DE IGUAL MANERA REFIERE QUE EL SERVICIO ES BUENO Y LA COBERTURA DE LA ANTENA WIFI INTERIOR SOLO TIENE ALCANCE DE APROXIMADAMENTE 3M DE RADIO, SIENDO UTILIZADA SOLAMENTE POR UN AULA DEL CENTRO EDUCATIVO. ADEMAS LA VELOCIDAD NO ES LA ADECUADA PARA LA IEE.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

BERNARDO AQUINO VILLANUEVA

DNI:

01338545

Cargo:

DIRECTOR DE I.E. 42076 "J.C.M."

Por la Contraloría General de la República

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COAILA VILLAGRA

DNI:

41285372

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|       |          |             |             |            |       |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| FECHA | 13/11/23 | HORA INICIO | 15:00 Horas | HORA FINAL | 15:59 |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|-------|

1.1. PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL) I E I

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE | SILVIA MARRAM ULLACA            |
| CARGO         | DIRECTORA ENCARGADA DE LA I E I |

1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

|               |                           |           |           |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHALCA VILLAGRA | D.N.I. N° | 4.1285572 |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 04440208  |
| REPRESENTANTE | JANETH FALCON LOPEZ       | D.N.I. N° |           |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° |           |

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)

IE INICIAL N° 326

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

|           |                |          |                |
|-----------|----------------|----------|----------------|
| PROVINCIA | CANDARAVE      | DISTRITO | ALTO CACHILACA |
| LOCALIDAD | ALTO CACHILACA | LATITUD  | 70.3905        |
| DIRECCIÓN |                | LONGITUD | 17.2908        |
|           |                | ALTURA   | 3870.          |

3.2 CONECTIVIDAD

VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)

CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO

|        |   |            |   |         |   |
|--------|---|------------|---|---------|---|
| AGOSTO | 0 | SEPTIEMBRE | 0 | OCTUBRE | 0 |
|--------|---|------------|---|---------|---|

LATENCIA DE RED (MS)

PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                |                 |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 41583612        | 1              |                 |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | W8V00WNP33P     | 1              |                 |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 190604-94560027 | 1              |                 |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905021452 | 1               |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905021777 | 1               |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905021388 | 1               |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905021434 | 1               |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905021372 | 1               |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |          |                 | 1              |                 |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                |                 |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |       |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |       |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |       |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |       |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               |       |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |       |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |       |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |       |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |       |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |       |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LA DIRECTORA ENCARGADA MANIFIESTA QUE DESDE MARZO 2022, LA IEEI NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA, POR LO CUAL NO HA PODIDO UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL PROYECTO PRONATEL, HA REALIZADO REQUERIMIENTOS DE INSTALACION DE ENERGIA A LA UGEL CANPARAVE Y A LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA, SIN EXITO A LA FECHA, POR LO CUAL TIENE GUARDADOS LOS EQUIPOS DE PRONATEL Y NO HAN SIDO UTILIZADOS A LA FECHA. ASIMISMO REFIERE QUE SE ENCUENTRA ENCARGADA DE LA IEEI DESDE MARZO 2022 Y NO HA SIDO CAPACITADA POR PRONATEL A LA FECHA.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



Nombres y apellidos:

SILVIA MAMANI VILLACA

DNI:

00482880

Cargo:

DIRECTORA ENCARGADA

Por la Contraloría General de la República

FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COAHUIL VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA

(Establecimiento de salud/Dependencia Policial)

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|       |          |             |       |            |       |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 13/11/23 | HORA INICIO | 16:15 | HORA FINAL | 16:50 |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|

1.1. PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL) CENTRO DE SALUD

REPRESENTANTE KELLY ANIELY MACHACA TITO  
CARGO OBSTETRA SERON

1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

REPRESENTANTE FERNANDO CONHILA ULLAGRA  
CARGO AUDITOR D.N.I. N° 41285572  
REPRESENTANTE JANETH FALCON LOPEZ  
CARGO AUDITOR D.N.I. N° 04440208

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (CENTRO DE SALUD, COMISARIA)

(CE) PUESTO DE SALUD CAHILACA

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA

PROVINCIA CANDARAVE DISTRITO CAHILACA  
LOCALIDAD ALD CAHILACA LATITUD LONGITUD ALTURA  
DIRECCIÓN AV TACNA S/N - CAHILACA

3.2 CONECTIVIDAD

VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS) 8.3 Mbps  
CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO NO SE PUEDE PRECISAR DADO QUE TIENEN 2 OPERADORES  
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

LATENCIA DE RED (MS)  
PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCES)

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO     | OPERATIVO SI/NO |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                  |                 |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                  |                 |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                  |                 |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          | 1               |                  |                 |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 1               |                  |                 |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | 1               |                  |                 |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 1               |                  |                 |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO        | ADVANCED | AH2700          | HTST.19050.10313 | ✓               |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                  |                 |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                  |                 |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | L575            | WBAI.1541845     | ✓               |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                  |                 |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                  |                 |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA | MEDICIONES | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4          | 1                                    | 15                                 |             |               |
| 3       | 4          | 2                                    |                                    |             |               |

| 3                                                            | 4 | 3  | MEDIDA 3 (72%)                                                              |           |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED |   |    |                                                                             |           |              |                 |
| ÍTEM                                                         |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor     | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
| 3                                                            | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | (8.3) 9.4 |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 8.3       |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 28 ms     |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |           |              |                 |
| 3                                                            | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |           |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

EL ENCARGADO MANIFIESTA QUE TIENE 02 PROVEEDORES DE INTERNET, POR LO CUAL CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET CONTINUO, NO PUEDE PRECISAR SI EL INTERNET DE PRONATEL HA SIDO ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS MESES, REFIERE QUE EL ALCANCE DE LA ANTENA WIFI DE PRONATEL SOLO TIENE 5 MTS. APROX. DE ALCANCE Y NO SE PUEDE HACER USO DEL INTERNET WIFI EN TODO EL CENTRO DE SALUD, SOLO EN UN (1) AMBIENTE PERTENECIENTE A FARMACIA.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

  
FIRMA



Nombres y apellidos:

Kelly Snely Madroca Tito

DNI:

70514416

Cargo:

obstetra

Por la Contraloría General de la República

  
FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COCHAIZA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

FIRMA

Nombres y apellidos:

SANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|                                                |                             |             |       |            |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|------------|----------|
| FECHA                                          | 14/11/23                    | HORA INICIO | 10:30 | HORA FINAL |          |
| 1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO                   |                             |             |       |            |          |
| REPRESENTANTE                                  | ELENA MARIA HUARIDO HUMPURE |             |       | D.N.I. N°  | 00984156 |
| CARGO                                          | DIRECTORA DE LA IE PRIMARIO |             |       |            |          |
| 1.2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) |                             |             |       |            |          |
| REPRESENTANTE                                  | FERNANDO COHAICA VILLAGRA   |             |       | D.N.I. N°  | 91285572 |
| CARGO                                          | AUDITOR                     |             |       |            |          |
| REPRESENTANTE                                  | JANETH FALCON LOPEZ         |             |       | D.N.I. N°  | 04440208 |
| CARGO                                          | AUDITORA                    |             |       |            |          |

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)

OLGA GROHMANN DE BASADKE

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

|           |                                  |          |            |          |           |
|-----------|----------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| PROVINCIA | JORGE BASADKE                    | DISTRITO | ITE        |          |           |
| LOCALIDAD | PAMPA BAZA                       | LATITUD  | 17.8716618 | LONGITUD | 71.054794 |
| DIRECCIÓN | AV. OLGA GROHMANN DE BASADKE S/N |          |            | ALTURA   |           |

3.2 CONECTIVIDAD

|                                                                  |   |            |   |         |   |
|------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---------|---|
| VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (MBPS)                                  |   |            |   |         |   |
| CANTIDAD DE DÍAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |   |            |   |         |   |
| AGOSTO                                                           | - | SEPTIEMBRE | - | OCTUBRE | - |
| LATENCIA DE RED (MS)                                             |   |            |   |         |   |
| PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)                        |   |            |   |         |   |

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |    |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                |                 |    |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          | 51935C8858      | 1              |                 |    |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | Y1583237        | 1              |                 |    |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | W8VJ00X7DC1F    | 1              |                 |    |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 190604-9456002  | 1              |                 |    |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCED | AH2700          | HTJT1905030519 | 1               | SI |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCED | AH2700          | HTJT1905030311 | 1               | SI |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCED | AH2700          | HTJT1905020083 | 1               | SI |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCED | AH2700          | HTJT1905030675 | 1               | SI |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCED | AH2700          | HTJT1905030665 | 1               | SI |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EP60N    | L575            | W9AY17109      | 1               | SI |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                |                 |    |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor      | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |            |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 1.9 Mbps   |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 7.7 Mbps   |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  | 5mts aprox |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 29 ms      |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |            |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |            |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |            |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |            |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |            |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LA DIRECTORA DE LA IE MANIFIESTA QUE EN EL MES DE FEBRERO 2023, SE CORTÓ EL SERVICIO DE INTERNET DE PRONATEL, A PESAR DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO DE OROCOCH NO SE RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE INTERNET, EN EL MES DE FEBRERO REQUIRIÓ EL SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE ITE, EN EL MES DE MAYO SE LE INSTALO UN SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL UTILIZA A LA FECHA, ADEMAS REFIERE QUE DURANTE EL AÑO SE RESTABLECIO EL SERVICIO DE PRONATEL EL CUAL ES LENTO, ADEMAS SU SEÑAL WIFI SOLO TIENE ALCANCE DE 5MTS APROX Y LA IMPRESORA PROPOKCIOWPA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada

  
**Prof. Elena María Huarino Humpire**  
**DIRECTORA**  
**LE OLGA GROHMANN DE BASADRE**

FIRMA

Nombres y apellidos:

Elena María Huarino Humpire.

DNI:

00484156

Cargo:

Directora.

Por la Contraloría General de la República

  
**Feoaneth Colicita Villaga**

FIRMA

Nombres y apellidos:

Feoaneth Colicita Villaga

DNI:

41285572

Cargo:

Auditor

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:



FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|       |          |             |       |            |       |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 11/11/23 | HORA INICIO | 11:50 | HORA FINAL | 12:34 |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|

1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO

|               |                          |           |          |
|---------------|--------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | RITA MARON QUESPE        | D.N.I. N° | 40485466 |
| CARGO         | DIRECTORA JARDIN INICIAL |           |          |

1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

|               |                           |           |          |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHALCA VILLAGRA | D.N.I. N° | 41285572 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |
| REPRESENTANTE | JANETH FALCON LOPEZ       | D.N.I. N° | 54440208 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |

2. DENOMINACION DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 383 SAN BIDRO LABRADOR

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA

|           |                      |          |            |
|-----------|----------------------|----------|------------|
| PROVINCIA | JORGE BASADRE        | DISTRITO | ITE        |
| LOCALIDAD | PAMPA BAJA           | LATITUD  | 17.8860894 |
| DIRECCIÓN | PAMPA BASA 17. C L-5 | LONGITUD | 70.977101  |
|           |                      | ALTURA   | 75.5 msnm  |

3.2 CONECTIVIDAD

|                                                                  |            |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)                                  |            |         |
| CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |            |         |
| AGOSTO                                                           | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| LATENCIA DE RED (MS)                                             |            |         |
| PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)                        |            |         |

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                |                 |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCED | AH2700          | HTST1905030822 | 1 SI            |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCED | AH2700          | HTST1905031405 | 1 SI            |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCED | AH2700          | HTST1905031223 | 1 SI            |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCED | AH2700          | HTST1905021077 | 1 SI            |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCED | AH2700          | HTST1105031387 | 1 SI            |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | L875            | W9AY155744     | 1 SI            |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                |                 |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                |                 |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor    | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |          |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 6.6 Mbps |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 2.1 Mbps |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |          |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 29 ms    |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |          |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |          |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |          |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |          |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |          |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LA DIRECTORA DE LA IEI REFIERE QUE SE ENCUENTRA DESDE EL MES DE MARZO 2023 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, EN DICHA FECHA NO CONTABA CON SERVICIO DE INTERNET, A PESAR DE CONTINUAS LLAMADAS AL CONTRATISTA OROCOM NO FUE ATENDIDA POR VARIOS MESES, EN EL MES DE JUNIO REQUIRO EL SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD SIENDO ATENDIDA EN EL MISMO MES A TRAVES DE OTRO OPERADOR. EL DIA 31 DE AGOSTO 2023 RECIBO LLEGA EL SERVICIO TECNICO DE OROCOM A RESTABLECER EL INTERNET DE OROCOM, A LA FECHA CUENTA CON INTERNET DE PRONATEL Y BITEL, SIN EMBARGO LA DIRECTORA MANIFIESTA QUE EL INTERNET DE PRONATEL ES LENTO, MAS AUN CUANDO UTILIZA LOS CINCO EQUIPOS ASIGNADOS AL MISMO TIEMPO Y EL WIFI SOLO TIENE ALIANCE DE 5MTS.

LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



Por la entidad visitada

FIRMA

Nombres y apellidos:

RITA MARON QUISPE

DNI:

40485466

Cargo:

Directora (e)

Por la Contraloría General de la República

FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAICA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

|       |          |             |       |            |       |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 14/11/23 | HORA INICIO | 13:21 | HORA FINAL | 14:11 |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|

**1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO**

|               |                         |           |          |
|---------------|-------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | JORGE LUIS TITO VICENTE | D.N.I. N° | 00305692 |
| CARGO         | DIRECTOR                |           |          |

**1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)**

|               |                           |           |          |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHAILA VILLAGRA | D.N.I. N° | 41285572 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |
| REPRESENTANTE | JANETH FALCON LOPEZ       | D.N.I. N° | 04440208 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |

**2. DENOMINACIÓN DEL NODO**

**3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)**

COLEGIO SECUNDARIO JOSE CARLOS MARIATEGUI

**3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA**

|           |                   |          |              |
|-----------|-------------------|----------|--------------|
| PROVINCIA | JORGE BASADRE     | DISTRITO | ITE          |
| LOCALIDAD | LAS ULLCAS        | LATITUD  | 17.8582192   |
| DIRECCIÓN | AV. PRINCIPAL S/N | LONGITUD | 70.977958    |
|           |                   | ALTURA   | 229.8 metros |

**3.2 CONECTIVIDAD**

|                                                                  |            |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)                                  |            |         |
| CANTIDAD DE DÍAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |            |         |
| AGOSTO                                                           | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |

**LATENCIA DE RED (MS)**

**PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)**

**3.3. MÓDULO DE ACCESO:**

| ÍTEM                | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO    | OPERATIVO SI/NO |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                 |                 |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |          |                   |                          |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 5                 | UPS                      | POWER    | TITAN 1KG2      | 190604-94560084 | 1               |
| 3                   | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCED | AH2700          | HT571905030985  | 1               |
|                     |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCED | AH2700          | HT571905031319  | 1               |
|                     |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCED | AH2700          | HT571905024048  | 1               |
|                     |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCED | AH2700          | HT571905031080  | 1               |
|                     |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCED | AH2700          | HT571905030841  | 1               |
| 3                   | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | L575            | W9HY155188      | 1               |
| 3                   | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                 |                 |
| 3                   | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                 |                 |



3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |       |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |       |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |       |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |       |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               |       |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |       |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |       |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |       |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |       |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |       |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

EL DIRECTOR DE LA IE MANIFIESTA QUE ASUMIÓ FUNCIONES DESDE EL MES DE FEBRERO 2023, DESDE ESA FECHA NO TENIA INTERNET DE PRONETEL A PESAR DE LAS LLAMADAS AL PROVEEDOR OROCON, EN JUNIO 2023 SOLICITO A LA MUNICIPALIDAD SE CE BRINDE INTERNET DE OTRO PROVEEDOR, EN EL MES DE AGOSTO 2023 SE APERSONÓ PERSONAL DE OROCON A RESTABLECER EL SERVICIO DE INTERNET, EN DICHA FECHA EL DIRECTOR SOLICITO REUBICACION DE LOS EQUIPOS DE OROCON DEBIDO A QUE EL AMBIENTE DE INSTALACION INICIAL ESTABA SIENDO OCUPADO CON PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, LOS EQUIPOS DE OROCON HAN SIDO TRASLADADOS A OTRO AMBIENTE PERO NO SE HA ATENDIDO LA RECONEXION DE EQUIPOS DE RED POR LO CUAL NO ES POSIBLE VERIFICAR SU OPERATIVIDAD A LA FECHA.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



*[Handwritten signature]*

FIRMA

Nombres y apellidos:

JORGE LUIS TITO VICENTE

DNI:

00505692

Cargo:

DIRECTOR

Por la Contraloría General de la República

*[Handwritten signature]*

FIRMA

Nombres y apellidos:

FERNANDO COHAICA ULLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA

(Establecimiento de salud/Dependencia Policial)

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

|       |          |             |       |            |       |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 14/10/20 | HORA INICIO | 17:19 | HORA FINAL | 18:09 |
|-------|----------|-------------|-------|------------|-------|

**1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO**

|               |                      |           |          |
|---------------|----------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | MARTHA RAMOS RAMIREZ | D.N.I. N° | 40914369 |
| CARGO         | MEDICO ASISTENCIAL   |           |          |

**1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)**

|               |                           |           |          |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHAICA VILLAGRA | D.N.I. N° | 41285572 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |
| REPRESENTANTE | SANETH FALCON LOPEZ       | D.N.I. N° | 04940208 |
| CARGO         | AUDITOR                   |           |          |

**2. DENOMINACIÓN DEL NODO**

**3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (CENTRO DE SALUD, COMISARIA)**

CENTRO DE SALUD ILABAYA

**3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA**

|           |                            |          |              |
|-----------|----------------------------|----------|--------------|
| PROVINCIA | JORGE BASADRE              | DISTRITO | ILABAYA      |
| LOCALIDAD | ILABAYA                    | LATITUD  | 17.4206939   |
|           |                            | LONGITUD | 70.5136506   |
| DIRECCIÓN | CALLE GENERAL IGLESIAS S/N | ALTURA   | 1430 m.s.n.m |

**3.2 CONECTIVIDAD**

|                                                                  |    |            |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|----|---------|----|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)                                  |    |            |    |         |    |
| CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |    |            |    |         |    |
| AGOSTO                                                           | 30 | SEPTIEMBRE | 30 | OCTUBRE | 30 |
| LATENCIA DE RED (MS)                                             |    |            |    |         |    |
| PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCES)                         |    |            |    |         |    |

**3.3. MÓDULO DE ACCESO:**

| ITEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO    | OPERATIVO SI/NO |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |                 |                 |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 71583674        | 1               |                 |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | W8 VDOOVKL90P   | 1               | SI              |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 190604-9456004  | 1               |                 |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO        | ADVANCED | AH2700          | AJTT19050101061 | SI              |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | L575            | W9AY161447      | 1               |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 |                 |                 |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 |                 |                 |

**3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**

| MUESTRA | MEDICIONES | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4          | 1                                    |                                    |             |               |
|         |            |                                      | 15                                 |             |               |
| 3       | 4          | 2                                    |                                    |             |               |



| 3                                                            |   |    | 4                                                                           |  |  | 3          |  |  | MEDIDA 3 (72%) |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| 3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED |   |    |                                                                             |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| ÍTEM                                                         |   |    | CONCEPTO                                                                    |  |  | Valor      |  |  | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |  |
|                                                              |   |    |                                                                             |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |  |  | 9.4 MBPS   |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) |  |  | 2.0 MBPS   |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               |  |  | 28 ms/68ms |  |  |                | SI              |  |
| 3                                                            | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |  |  |            |  |  |                |                 |  |
| 3                                                            | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |  |  |            |  |  |                |                 |  |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

LA ENCARGADA DEL C.S. REFIERE QUE EL SERVICIO DE INTERNET DE PROXATEL ES BUENO Y LA COBERTURA DEL WIFI INDOOR ES SOLO 3 ó 4 METROS APROXIMADAMENTE.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



Por la entidad visitada

*[Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos:  
MARTHA RAMOS RAMÍREZ

DNI:  
40914369

Cargo:  
MEDICO ASISTENCIAL

FIRMA

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

Por la Contraloría General de la República

*[Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos:  
FERNANDO COHALA ULLAGRA

DNI:  
41285572

Cargo:  
AUDITOR

FIRMA

Nombres y apellidos:  
JANETH FALCON LOPEZ

DNI:  
04440208

Cargo:  
AUDITOR

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|       |            |             |       |            |       |
|-------|------------|-------------|-------|------------|-------|
| FECHA | 16/11/2023 | HORA INICIO | 14:50 | HORA FINAL | 15:25 |
|-------|------------|-------------|-------|------------|-------|

1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO

|               |                       |           |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|--|
| REPRESENTANTE | WILMER VASQUEZ CHAUPE |           |          |  |
| CARGO         | COMISARIO ENCARGADO   | D.N.I. N° | 30563902 |  |

1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

|               |                           |           |          |  |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|--|
| REPRESENTANTE | FERNANDO COHAILA VILLAGRA |           |          |  |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 41285572 |  |
| REPRESENTANTE | JANETH FALCON LÓPEZ       |           |          |  |
| CARGO         | AUDITOR                   | D.N.I. N° | 04440208 |  |

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (CENTRO DE SALUD, COMISARIA)

COMISARÍA RURAL TICACO

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

|           |                                      |          |        |          |      |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------|----------|------|
| PROVINCIA | TARATA                               | DISTRITO | TICACO |          |      |
| LOCALIDAD | TICACO                               | LATITUD  | 17.45  | LONGITUD |      |
| DIRECCIÓN | CARRETERA TARATA CANDARAVE S/N KM.97 |          |        | ALTURA   | 3287 |

3.2 CONECTIVIDAD

|                                                                  |      |            |     |         |     |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|---------|-----|
| VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)                                  | 8 MB |            |     |         |     |
| CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO |      |            |     |         |     |
| AGOSTO                                                           | N/A  | SEPTIEMBRE | N/A | OCTUBRE | N/A |
| LATENCIA DE RED (MS)                                             |      |            |     |         |     |
| PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCES)                         |      |            |     |         |     |

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE |                 |              |                 |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |              |                 |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |              |                 |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO        | ADVANCED | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          | 1               | SI           | SI              |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          | 1               | SI           | SI              |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   |                                    | 19.1        | MEM. 100      |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      |                                    |             |               |

| 3                                                                   | 4 | 3  | MEDIDA 3 (72%)                                                              |                |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED</b> |   |    |                                                                             |                |              |                 |
| ÍTEM                                                                |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor          | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
| 3                                                                   | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            | (10 MB) / 8 MB | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 12.6 Mbps      | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 7.38 Mbps      | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  | 15 m/Cambio    | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 8.10 md        | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 | 1.77           | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                | √              | SI           | SI              |
| 3                                                                   | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |                |              |                 |
| 3                                                                   | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |                |              |                 |
| 3                                                                   | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |                |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

| OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL COMISARIO ENCARGADO REFIERE QUELLEVA EN EL PUESTO 1 SEMANA POR LO CUAL NO PUEDE PRECISAR SI HUBO SEÑAL LOS 3 ÚLTIMOS MESES |

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada



FIRMA

Nombres y apellidos:

EDME RUIZ AIMITUMA

DNI:

40655360

Cargo:

ING. SUPERVISOR DIOP

Por la Contraloría General de la República



FIRMA

Nombres y apellidos:


FERNANDO COAILA VILLAGRA

DNI:

41285572

Cargo:

AUDITOR



FIRMA

Nombres y apellidos:

WILMER PINTO

DNI:

003104735 - CE

Cargo:

SUPERVISOR TI - OYM



FIRMA

Nombres y apellidos:

JANETH FALCON LOPEZ

DNI:

04440208

Cargo:

AUDITOR

CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|                                                |                          |             |       |            |          |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|------------|----------|
| FECHA                                          | 12/11/23                 | HORA INICIO | 09:38 | HORA FINAL | 10:17    |
| 1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO                   |                          |             |       |            |          |
| REPRESENTANTE                                  | LILY VELASCO HAMANI      |             |       |            |          |
| CARGO                                          | DIRECTORA (E)            |             |       | D.N.I. N°  | 00662389 |
| 1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) |                          |             |       |            |          |
| REPRESENTANTE                                  | EYLBEN ARIAS HINOJOSA    |             |       |            |          |
| CARGO                                          | AUDITOR                  |             |       | D.N.I. N°  | 41455426 |
| REPRESENTANTE                                  | FERNANDO COHALCA ULLAGRA |             |       |            |          |
| CARGO                                          | AUDITOR                  |             |       | D.N.I. N°  | 41285572 |

2. DENOMINACIÓN DEL NODO

TA-A-4037-IE01

3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)

JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR

3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA

|           |                           |          |                       |          |            |
|-----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|------------|
| PROVINCIA | TACNA                     | DISTRITO | LA YARADA - LOS PALOS |          |            |
| LOCALIDAD | PUEBLO LIBRE              | LATITUD  | 18.17539993           | LONGITUD | 70.5047189 |
| DIRECCIÓN | CARRETERA COSTANERA km 25 |          | ALTURA                | 74       |            |

3.2 CONECTIVIDAD

VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)

CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO

|        |    |            |    |         |    |
|--------|----|------------|----|---------|----|
| AGOSTO | 30 | SEPTIEMBRE | 30 | OCTUBRE | 30 |
|--------|----|------------|----|---------|----|

LATENCIA DE RED (MS)

PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)

3.3. MÓDULO DE ACCESO:

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |                 | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |    |    |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----|----|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | N° SERIE        |                 |              |                 |    |    |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |                 |                 |              |                 |    |    |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |                 |                 |              |                 |    |    |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCED AH2700 | HTJT1905022150  | 1            | Si              | Si |    |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCED AH2700 | HTJT1905031152  | 1            | Si              | Si |    |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCED AH2700 | HTJT1905021317  | 1            | Si              | Si |    |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCED AH2700 | HTJT1905031129  | 1            | Si              | Si |    |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCED AH2700 | HTJT1905031183  | 1            | Si              | Si |    |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |                 | 5               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |                 | 5               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON           | LS75            | W9AY155696   | 1               | Si | Si |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |                 | 1               | Si           | Si              |    |    |

3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15                                   | 7.8                                | 1.7 Ω       |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor     | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            | 10MB      | Si           | Si              |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 8.78 Mbps | Si           | Si              |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | 10.6 Mbps | Si           | Si              |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  | -         | -            | -               |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | 7.8 ms    | Si           |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 | 15.8 ms   | Si           |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                | ok ✓      | Si           |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 | -         | -            | -               |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                | -         | -            | -               |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           | -         | -            | -               |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

LA DIRECTORA DE LA IE REFIERE QUE LOS EQUIPOS SON UTILIZADOS EN MINORIA EN UN SALON DE CLASES DEL 5TO AÑO SECUNDARIA, ASIMISMO MANIFIESTA QUE SOLITO EN EL MES DE AGOSTO AL TÉCNICO DEL CONTRATISTA OROCOH SE TRASLADÓ LOS EQUIPOS A LA SALA DE COMPUTO DE LA IE PARA SER UTILIZADO POR MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS, ASIMISMO INDICA QUE EL SERVICIO ES LENTO Y REQUIERE MAYOR VELOCIDAD. DE IGUAL MANERA REFIERE QUE NO HA RECIBIDO CAPACITACION DEL CONTRATISTA

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad:



*[Signature]*  
Prof. Lily Ruth Velasco Mamani  
DIRECTORA (e)

Nombres y apellidos: \_\_\_\_\_  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Por la Contraloría General de la República

*[Signature]*  
FIRMA

Nombres y apellidos: FERNANDO COHALLA VILLAGRA  
DNI: 41285572  
Cargo: AUDITOR



FIRMA

Nombres y apellidos:


Wilmer José Pinto Córdova

DNI:

003104735

Cargo:

Supervisor Campo T1 O&M



FIRMA

Nombres y apellidos:

Edme Ruiz Almitoma

DNI:

40655260

Cargo:

Supervisor Pranatel - Diop



CONTROL CONCURRENTE AL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA

ACTA DE VISITA DE INSPECCION A INSTITUCION EDUCATIVA

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

II.EE ALFONSO UGARTE 42044 - LOS PALOS

FECHA 17/11/23 HORA INICIO 12:00 p.m. HORA FINAL

**1.1. REPRESENTANTE DE LA IAO**

REPRESENTANTE GUIDO HERNAN VELASQUEZ BAILÓN  
CARGO DIRECTOR I.E. D.N.I. Nº 01209370

**1.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)**

REPRESENTANTE FERNANDO COHAILA VILLAGRA  
CARGO AUDITOR D.N.I. Nº 41285572  
REPRESENTANTE EYLEEN SCARLETH ARIAS HINOJOSA  
CARGO AUDITOR D.N.I. Nº 41455426

**2. DENOMINACIÓN DEL NODO**

**3. TIPO Y NOMBRE DE INSTITUCION BENEFICIARIA (INSTITUCION EDUCATIVA)**

II.EE ALFONSO UGARTE 42044 - LOS PALOS

**3.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA**

PROVINCIA TACNA DISTRITO LA YAROMA LOS PALOS  
LOCALIDAD LATITUD 18.2918764092 LONGITUD 70.4335672035  
DIRECCIÓN CARRETERA SANTA ROSA 9/N ALTURA 38 m.

**3.2 CONECTIVIDAD**

VELOCIDAD DE TRANSMISION (MBPS)  
CANTIDAD DE DIAS QUE CONTO CON CONECTIVIDAD DE ACUERDO A ABONADO  
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  
LATENCIA DE RED (MS)  
PERDIDA DE PAQUETES (MEDIDO EN EL ACCESS)

**3.3. MÓDULO DE ACCESO:**

| ÍTEM         | CONCEPTO | PROPUESTA TÉCNICA |                          |          | VALOR EN VISITA | CUMPLE SI/NO   | OPERATIVO SI/NO |    |
|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----|
|              |          | MARCA             | MODELO                   | Nº SERIE |                 |                |                 |    |
| EQUIPAMIENTO |          |                   |                          |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 1                 | CPE                      |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 2                 | OCU-CPE                  |          |                 |                |                 |    |
| 3            | 3        | 3                 | SWITCH DE COMUNICACIONES |          | 21783649        | 1              | Si              |    |
| 3            | 3        | 4                 | ACCESS POINT INDOOR      |          | WBVDCOTU964K    | 1              | Si              |    |
| 3            | 3        | 5                 | UPS                      | POWEST   | 19060494560092  | 1              | Si              |    |
| 3            | 3        | 6                 | EQUIPO DE COMPUTO (1)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905031355 | 1               | Si |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (2)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905020109 | 1               | Si |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (3)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905031015 | 1               | Si |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (4)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905031146 | 1               | Si |
|              |          |                   | EQUIPO DE COMPUTO (5)    | ADVANCE  | AH 2700         | HTJT1905030974 | 1               | Si |
| 3            | 3        | 7                 | MOUSE                    |          |                 | 5              | Si              |    |
| 3            | 3        | 8                 | TECLADO                  |          |                 | 5              | Si              |    |
| 3            | 3        | 9                 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | EPSON    | L575            | W9AY155693     | 1               | Si |
| 3            | 3        | 10                | ROUTER                   |          |                 | NS193518750    | 1               | Si |
| 3            | 3        | 11                | GABINETE DE PARED        |          |                 | 108-01005      | 1               | Si |



3.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA *Pt. Para Rayos 7.93 Ω*

| MUESTRA |   |   | MEDICIONES     | DISTANCIA 1 (Electrodo de corriente) | DISTANCIA 2 (Electrodo de tension) | Valor Medio | Observaciones |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3       | 4 | 1 | MEDIDA 1 (52%) | 15<br><i>4.1952</i>                  | 7.8                                |             |               |
| 3       | 4 | 2 | MEDIDA 2 (62%) |                                      | 9.3                                |             |               |
| 3       | 4 | 3 | MEDIDA 3 (72%) |                                      | 10.8                               |             |               |

3.5. NIVELES DE SERVICIO Y COBERTURA - DISPONIBILIDAD DE RED

| ÍTEM |   |    | CONCEPTO                                                                    | Valor            | CUMPLE SI/NO | OPERATIVO SI/NO |
|------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 3    | 5 | 1  | VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA                                            | <i>10 MB</i>     |              |                 |
| 3    | 5 | 2  | VELOCIDAD DE INTERNET DE SUBIDA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | <i>9.37 MB</i>   |              |                 |
| 3    | 5 | 3  | VELOCIDAD DE INTERNET DE BAJADA MINIMA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST) | <i>10.8 MB</i>   |              |                 |
| 3    | 5 | 4  | NIVEL DE COBERTURA DEL ACCESS POINT INDOOR                                  | <i>10 metros</i> |              |                 |
| 3    | 5 | 5  | LATENCIA (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                               | <i>10.3 ms</i>   |              |                 |
| 3    | 5 | 6  | JITTER (PRUEBA DE VELOCIDAD CON SPEED TEST)                                 | <i>1.41 ms</i>   |              |                 |
| 3    | 5 | 7  | VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD A DIRECCION WEB                                |                  |              |                 |
| 3    | 5 | 8  | CONECTIVIDAD AL NODO TERMINAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                 |                  |              |                 |
| 3    | 5 | 9  | CONECTIVIDAD AL NODO DISTRITAL (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                |                  |              |                 |
| 3    | 5 | 10 | CONECTIVIDAD AL NOC (TIEMPO DE IDA Y VUELTA) [ms]                           |                  |              |                 |

DE NO CUMPLIR CON EL VALOR ESPERADO, SE DEBE INDICAR EN OBSERVACIONES EL ÍTEM Y EL DETALLE DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA, INCLUYENDO EL VALOR VERIFICADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

- Ante incumplimientos en el pago del Internet por parte del Gobierno Regional de Tacna, durante aproximadamente seis (6) meses, no contaron con la provisión del Internet del proyecto, luego de ello se regularizó y volvieron a contar con el Servicio
- Ante la baja velocidad de 10 Mb. insuficiente para la cantidad de alumnos, la APAFA contrató un servicio de internet privado, que funciona en el centro de cómputo, al cual fueron trasladados los cinco (05) equipos (computadora, teclado y mouse) los cuales van siendo utilizados por los alumnos. Quedando las instalaciones del proyecto en otro salón de clases sin equipos por resultar insuficiente. Se tramita en el GRT sin recibir respuesta.

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO; FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Por la entidad visitada:  
  
 Prof. Guido H. Velásquez Bailón  
 DIRECTOR  
 I.E. N° 42044 ALFONSO UGARTE

Por la Contraloría General de la República:  
  
 FERNANDO COCHALES VILLAGRA  
 FIRMA

Nombres y apellidos:  
**GUIDO HERNAN VELASQUEZ BAILÓN**  
 DNI:  
**01209320**  
 Cargo:  
**DIRECTOR**

Nombres y apellidos:  
**FERNANDO COCHALES VILLAGRA**  
 DNI:  
**91285572**  
 Cargo:  
**AUDITOR**



  
FIRMA  
Nombres y apellidos:  
Wilhem Jose Pintor Cova  
DNI:  
003104735  
Cargo:  
SUPERVISOR CAMPO TI OYM.

  
FIRMA  
Nombres y apellidos:  
Evelyn SCARLETT ARIAS HINOJOSA  
DNI:  
41485420  
Cargo:  
AUDITOR



Edme Ruiz Almitoma  
40655360  
SUPERVISOR PROMATEL  
DOP





**APÉNDICE N° 3**

**SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES**

**Informe de Hito de Control n.° 19697-2021-CG/MPROY-SCC**

- Notificado mediante oficio n.° 000362-2021 del 20 de octubre del 2021
- Hito de Control n.° 5
- Número de situaciones adversas identificadas:3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

**Cuadro n.° 1**  
**Seguimiento de situaciones adversas**

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                     | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado de situación adversa |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3  | Instalación del cableado externo de datos en instituciones abonadas obligatorias, sin canalización, podría generar pérdida de los servicios de telecomunicaciones en la Red de Acceso | Oficio n.° 2956-2021-MTC/24                      | Mediante el documento indicado Pronatel indico que los servicios ofrecidos no se verán afectados durante el tiempo de vida útil del cable. Asimismo, el Contratado será el responsable de la operación y mantenimiento de la Red de Acceso, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8-B de la Red de Acceso del Proyecto Regional Tacna y Moquegua. | No corregida                |

Fuente: Informe de Hito de Control n.° 026-2023-OCI/6403-SCC

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

**Informe de Hito de Control n.° 007-2022-CG/6403.SCC**

- Notificado mediante oficio n.° 000227-2022-MTC/24.04 del 03 de junio del 2022
- Hito de Control n.° 6
- Número de situaciones adversas identificadas:2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

**Cuadro n.° 2**  
**Seguimiento de situaciones adversas**

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas                                     | Acciones preventivas y correctivas | Estado de situación adversa |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Incumplimiento de condiciones establecidas en el contrato relacionado a la operatividad del grupo electrógeno, niveles de combustible de los mismos, así como extintores CO2 vencidos, podrían afectar la operatividad de los nodos de transporte del proyecto                                     | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |
| 2  | Existe dilación y atención oportuna de solicitudes de ampliación de plazo de la etapa de instalación de la ejecución del periodo de inversión del proyecto; situación que afectaría el otorgamiento oportuno de la conformidad y el inicio de la operación de los servicios de internet e intranet | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |

Fuente: Informe de Hito de Control n.° 026-2023-OCI/6403-SCC

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

**Informe de Hito de Control n.° 026-2023-OCI/6403-SCC**

- Notificado mediante Memorandum n.° 473-20023-MTC/24.04 del 18 de julio del 2023
- Hito de Control n.° 8

- Número de situaciones adversas identificadas: 5
- Número de situaciones adversas que subsisten: 5

**Cuadro n.º 3**  
**Seguimiento de situaciones adversas**

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas                                     | Acciones preventivas y correctivas | Estado de situación adversa |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | El incumplimiento de la distancia mínima de seguridad (DMS) entre las redes eléctricas y de comunicación, podría generar accidentes en el personal técnico o daños a la infraestructura, afectando la operatividad del sistema de comunicaciones.                                                                                     | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |
| 2  | La falta de aterramiento de las canalizaciones metálicas en las instalaciones eléctricas, podría generar situaciones de riesgo eléctrico, ocasionando accidentes en el personal técnico o fallas en la operación y funcionalidad de los nodos de transporte.                                                                          | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |
| 3  | El incumplimiento de la política de acceso a la red, ha evidenciado una vulnerabilidad que podría comprometer la seguridad de la red.                                                                                                                                                                                                 | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |
| 4  | El incumplimiento en el periodo de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento, no garantizaría las obligaciones contractuales del contratado, lo cual podría afectar el cumplimiento del objeto y finalidad del contrato de financiamiento.                                                                                   | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |
| 5  | Habiendo culminado el plazo del periodo provisional de la red de transporte, a la fecha, no se ha suscrito el acta de adjudicación de los bienes de la red de transporte, y se ha verificado que la inscripción de los inmuebles no ha alcanzado el 70%, generando incertidumbre en relación al cumplimiento del objeto del contrato. | Pronatel no informó en su oportunidad sobre las acciones preventivas y/o correctivas |                                    | No corregida                |

**Fuente:** Hoja Informativa n.º 005-20023-CG/OCI-ABC del 29 de septiembre del 2023. Evaluación de situaciones adversas del Informe de Hito de Control N° 026-2023-OCI/6403-SCC del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y Desarrollo Social de la Región Tacna".  
**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

Jesús María, 04 de Diciembre de 2023  
**OFICIO N° 000643-2023-CG/VCST**

Señora  
**Sarita Iedayola Vilchez Castellanos**  
Directora Ejecutiva  
**Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel**  
Av. Paseo De La Republica N° 1645  
**Lima/Lima/Lima**

**Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control N° 28938-2023-CG/GRTA-SCC

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada, al Período de Provisional y de Operación, del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tacna” – Hito de Control N° 10: Parámetros técnicos, operación y mantenimiento de la Red de Acceso, comunicamos que se ha identificado cinco (5) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 28938-2023-CG/GRTA-SCC, el mismo que se adjunta en noventa y cuatro (94) folios.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Luis Alonso Robas Sanchez**  
Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial  
Contraloría General de la República



(LRS/ecm)  
Nro. Emisión: 07169 (L100 - 2023) Elab:(U60718 - L475)



## Re: NOTIFICACIÓN DE OFICIO N° 000643-2023-CG/VCST

mesadepartes pronatel <mesadepartes@pronatel.gob.pe>

Mar 5/12/2023 13:42

Para:Enma Catacora Mamani <ecatacora@contraloria.gob.pe>

**Estimado(a) Ciudadano(a):**

Previo saludo, le comunicamos que se ha procedido a registrar su trámite en **MESA DE PARTES – PRONATEL**. Para efectuar el seguimiento de su trámite usted deberá ingresar a través de este link: <https://sdt.mtc.gob.pe/> y colocar la siguiente información requerida:

**Año del Trámite:** 2023

**N° del Trámite:** 635939

**Tipo de Trámite:** Expediente

**Contraseña:** IEDAYK

**NNN**

Se le comunica que, a través de la Mesa de Partes Digital, se considerarán presentados en el día los documentos recibidos entre las **00:00 hrs y las 23:59 hrs de un día hábil**. Aquellos que ingresen en un día no laborable, se considerarán presentados en el primer día hábil siguiente.

**Este correo no es señal de conformidad.**

El mar, 5 dic 2023 a la(s) 12:57, Enma Catacora Mamani ([ecatacora@contraloria.gob.pe](mailto:ecatacora@contraloria.gob.pe)) escribió:

Señora

**Sarita Iedayola Vilchez Castellanos**

Directora Ejecutiva

**Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel**

Av. Paseo De La Republica N° 1645

La Victoria/Lima/Lima

Buenas tardes

Por el presente, se notifica el Oficio N° 000643-2023-CG/VCST y su anexo, adjuntos en archivo PDF para conocimiento y fines pertinentes.

Agradeceré confirmar la recepción del documento por este medio, para el seguimiento y archivo de la Gerencia Regional de Control de Tacna.

Atte,



**Enma Catacora Mamani**  
Gerencia Regional de Control de Tacna  
Contraloría General de la República  
Calle Los álamos N° 1976 - 1978  
Tacna – Perú  
(01) 330 3000 anexo 5206



DRET  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 2018 - 2027"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



Candarave, 09 de noviembre del 2023

OFICIO N° 1066 – 2023-D.UGEL-C/DRET/GOB.REG.TACNA

SEÑOR:

LIC. ALDO RUPERTO ESPINOZA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA

Presente.-

- ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA
- REFERENCIA : INFORME N° 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA  
OFICIO MULTIPLE N° 023-2023-D-DRET/GOB.REG.TACNA
- ATENCIÓN : ADMINISTRACIÓN / ABASTECIMIENTO

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, remitir el INFORME N° 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA, realizado por el Especialista en Infraestructura de la UGEL Candarave, remitiendo la información solicitada del estado situacional del servicio de acceso a internet e intranet.

Sin otro particular, expreso a Usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL TACNA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TACNA



Lic. CAROLINA MOLLINEDO CATUNTA  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
CANDARAVE

ADJUNTO: DOCUMENTOS MENCIONADOS  
C.C : Archivo  
INFORME N° 075-2023-AFTC-E.I.-UGEL-C-DRET/GOB.REG.TACNA (10 FOLIOS)  
OFICIO MULTIPLE N° 023-2023-D-DRET/GOB.REG.TACNA





**DRET**  
DIRECCIÓN REGIONAL  
DE EDUCACIÓN TACNA

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



|    |          |                |                           |                                                                                                   |
|----|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | CAMILACA | CAMBAYA        | 42030 LUIS BANCHERO ROSSI | a) LA I.E. NO ESTA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA UGEL CANDARAVE. (NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN) |
| 43 | CAMILACA | NUEVA CAMILACA | 430 VIRGÉN DEL CARMEN     | a) SI SE CUENTA CON INTERNET QUIEN PROVEE LA EMPRESA OROCOM DESDE EL AÑO 2021.                    |
|    |          |                |                           | b) ACTUALMENTE NO HAY LUZ EN LA I.E.                                                              |
|    |          |                |                           | c) SE ESTÁ HACIENDO TRAMITE EN LA DRET PARA LA INSTALACIÓN DE LUZ.                                |
|    |          |                |                           | d) LA EMPRESA EN EL MES DE AGOSTO REALIZO MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE INTERNET.            |

**3. CONCLUSION:**

3.1. Se remite la información solicitada para conocimiento y tomar las acciones correspondientes.

**4. SUGERENCIA:**

4.1. Derivar el presente informe a la oficina de abastecimiento para que pueda dar a prioridad las instalaciones de LUZ de las I.E. 430 Virgen del Carmen y 326 Alto Camilaca.

Atentamente,

AFIC/EL  
Cc: Arch.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL  
- CANDARAVE -  
Ing. Alex Fernando Ticona Choque  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

**OFICIO N° -2024-CG/GRTA**

Señor:

**Luis Ramon Torres Robledo**  
Gobernador Regional  
**Gobierno Regional Tacna**  
Av. Manuel A. Odria N° 1245  
**Tacna/Tacna/Tacna**

**Asunto:** Notificación de Informe de Orientación de Oficio N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO.

**Referencia:** a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la “**Provisión del Servicio de Internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna**”, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectivo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Eyleen Scarleth Arias Hinojosa**  
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional  
de Control de Tacna(e)  
Contraloría General de la República

(EAH/fcv)

Nro. Emisión: 03772 (L475 - 2024) Elab:(U20000 - L475)





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 000740-2024-CG/GRTA

**EMISOR** : EYLEEN SCARLETH ARIAS HINOJOSA - GERENTE REGIONAL -  
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : LUIS RAMON TORRES ROBLEDO

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

---

### Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada a la "Provisión del Servicio de Internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO, que se adjunta al presente documento. Solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el presente informe.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20519752515**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000095-2024-CG/GRTA
2. Oficio\_740-2024-CG-GRTA
3. Informe\_OO\_5230-2024-CG
4. adjuntos\_informe\_oo\_2[F]
5. adjuntos\_informe\_oo\_1[F]

**NOTIFICADOR** : FERNANDO EDUARDO COHAILA VILLAGRA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000095-2024-CG/GRTA**

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 000740-2024-CG/GRTA

**EMISOR** : EYLEEN SCARLETH ARIAS HINOJOSA - GERENTE REGIONAL -  
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : LUIS RAMON TORRES ROBLEDO

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20519752515

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

**N° FOLIOS** : 330

---

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada a la "Provisión del Servicio de Internet en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL y el Gobierno Regional de Tacna", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 5230-2024-CG/GRTA-SOO, que se adjunta al presente documento. Solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el presente informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio\_740-2024-CG-GRTA
2. Informe\_OO\_5230-2024-CG
3. adjuntos\_informe\_oo\_2[F]
4. adjuntos\_informe\_oo\_1[F]

