

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC**

**INFORME DE HITO DE CONTROL  
Nº 003-2025-OCI/5333-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC  
ABANCAY – ABANCAY – APURÍMAC**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA  
DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA,  
SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA,  
CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN  
JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,  
REGIÓN APURÍMAC”**

**HITO DE CONTROL Nº 69 – A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL  
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA.**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2025**

**TOMO I DE I**

**ABANCAY, 30 DE ENERO DE 2025**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 003-2025-OCI/5333-SCC**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA, Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”**

**HITO DE CONTROL N° 69 – A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA**

**ÍNDICE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ORIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |
| II. OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       |
| III. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| V. SITUACIONES ADVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3       |
| 1. Presencia de fisuras y grietas en losa armada de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ del reservorio Alalaylla podría generar riesgo de pérdida de la capacidad de almacenamiento por infiltración y posibles daños a la integridad estructural y vida útil; además, de posibles sobre costos a la obra por las reparaciones a ejecutar para su funcionalidad. |         |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20      |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                               | 21      |
| IX. CONCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21      |
| X. RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21      |
| APÉNDICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Sarmely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

## **INFORME DE HITO DE CONTROL** **N° 003-2025-OCI/5333-SCC**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”**

### **HITO DE CONTROL N° 69 – A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Apurímac mediante oficio n.° 113-2025-CG/OC5333 de 22 de enero de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5333-2025-003, en el marco de lo dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo del 2022 y modificatorias.

#### **II. OBJETIVOS**

##### **2.1 Objetivo general**

Determinar si la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac”, se efectúe conforme a la normativa aplicable y los documentos técnicos y/o contractuales.

##### **2.2 Objetivo específico**

Determinar si la ejecución del proyecto del sistema de riego en la comunidad de Champacocha se viene cumpliendo con el expediente técnico aprobado, asimismo, con la normativa aplicable y los documentos técnicos y/o contractuales.

#### **III. ALCANCE**

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al proceso de ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac”, y que ha sido ejecutado del 24 al 30 de enero de 2025, en los ámbitos de los distritos de San Jerónimo y Pacucha en la provincia de Andahuaylas, en la Región Apurímac.

#### **IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL**

Mediante Resolución Gerencial Regional n.° 225-2022-GR/APURÍMAC/GRI de 29 de abril del 2022, se aprobó la modificación al expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac”, con CUI n.° 2215017, en adelante el “Proyecto”, realizado mediante la modalidad de



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

administración directa, siendo su plazo de ejecución de 730 días con presupuesto total del proyecto, de S/ 182 834 410,28<sup>1</sup>, según detalle:

**Cuadro n.º 1**  
**Ficha técnica de obra**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ubicación geográfica                                            | Región: Apurímac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provincia: Andahuaylas | Distrito: San Jerónimo – Pacucha |
|                                                                 | Localidad: Chullicuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                  |
| Código SNIP/Único                                               | 2215017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                  |
| Entidad                                                         | Gobierno Regional de Apurímac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                  |
| Proyecto:                                                       | "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullicuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha, y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                  |
| Documento de aprobación de expediente técnico                   | Resolución Gerencial Regional n.º 225-2022-GR/APURIMAC/GRI de 29 de abril del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                  |
| Modalidad de ejecución:                                         | Administración Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                  |
| Monto viable/aprobado                                           | S/ 150 736 804,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |
| Expediente técnico                                              | S/ 160 772 368,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |
| Documento de aprobación del presupuesto del proyecto            | Resolución Gerencial General Regional n.º 801-2022-GR.APURIMAC/GG de 29 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |
| Monto del expediente técnico modificado n.º 4                   | S/ 182 834 410,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |
| Monto actualizado del expediente técnico. ( 13 modificaciones ) | S/ 201,628,932.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  |
| Monto de control concurrente                                    | S/ 3 549 431,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                  |
| Documento de aprobación del plazo de ejecución                  | Resolución Gerencial Regional n.º 031-2022-GR.APURIMAC/GG de 12 de abril de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Plazo de ejecución                                              | 730 días calendarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                  |
| Inicio de plazo de ejecución                                    | 10/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                  |
| Documento de aprobación de plazo de ejecución reprogramado      | Resolución Gerencial Regional n.º 166-2024-GR.APURIMAC/GRI de 18 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |
| Plazo de ejecución reprogramado (52 ampliaciones de plazo)      | 1055 días calendarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |
| Fin de plazo de ejecución reprogramado.                         | 29 de marzo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                  |
| Descripción de la obra:                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de Presas.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 01.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 02.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 03.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 04.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 05.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 06.</li> <li>- Sistema Hidráulico n.º 07.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Chullicuisa.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Santa Rosa.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Cupisa.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Choccecancha.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Ancatira.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Champacocha.</li> <li>- Sistema de Riego de la Comunidad de Argama Alta.</li> <li>- Programa de Manejo Ambiental</li> <li>- Componente Social.</li> </ul> |                        |                                  |
| Estado actual de la obra:                                       | En ejecución y se encuentra suspendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                  |
| Última valorización:                                            | Diciembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                  |

**Fuente:** Expediente técnico, INFObras, SEACE, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), INVIERTE.PE.

**Elaborado por:** Comisión de Control.



Firmado digitalmente por  
 LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
 QUISPE MITMA Raul Ernesto  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CORNEJO ANTON Cesar FAU  
 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

<sup>1</sup> Presupuesto que corresponde al expediente técnico modificado en fase de ejecución n.º 4, aprobado con Resolución Gerencial General Regional n.º 801-2022-GR.APURIMAC/GG de 29 de diciembre de 2022.

Sobre el particular, se inició el proyecto con el presupuesto de S/ 182 834 410,28 que corresponde a la modificación en la fase de ejecución n.º 04, sin incremento presupuestal, por variación en los plazos de ejecución de los sub proyectos, inmersos en el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac", con CUI n.º 2215017, aprobada con Resolución Gerencial General Regional n.º 801-2022-GR.APURIMAC/GG de 29 de diciembre de 2022, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 2**  
**Costo de inversión del expediente técnico modificación n.º 04**

| Descripción                       | Porcentaje (%) | Monto S/              |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Costo directo del proyecto</b> |                | <b>140 206 750,31</b> |
| Gastos generales                  | 17,93%         | 25 139 186,40         |
| Gastos de supervisión             | 6,19%          | 8 675 429,93          |
| Gestión del proyecto              | 1,11%          | 1 550 048,42          |
| Presupuesto plan covid-19         | 0,87%          | 1 216 979,48          |
| Liquidación del proyecto          | 0,50%          | 696 584,67            |
| Expediente técnico                | 1,28%          | 1 800 000,00          |
| <b>Sub Total</b>                  |                | <b>179 284 979,21</b> |
| Control concurrente               | 2,00%          | 3 549 431,07          |
| <b>Total de inversión</b>         |                | <b>182 834 410,28</b> |

Fuente: Resolución Gerencial General Regional n.º 801-2022-GR.APURIMAC/GG de 29 de diciembre de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control.

Consecuentemente, se tuvo quince (15) ampliaciones presupuestales de los sub proyectos generando un nuevo presupuesto de S/ 201 628 932,02, aprobado con Resolución Gerencial Regional n.º 175-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de diciembre de 2024, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 3**  
**Costo de inversión actualizado del proyecto de inversión matriz con CUI 2215017**

| Expediente técnico                |                       | Total presupuestos modificados 1 en la fase de ejecución física. | Total presupuestos modificados 2 en la fase de ejecución física | Total presupuestos modificados 3 en la fase de ejecución física | Presupuesto total modificado del proyecto |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Costo directo del proyecto</b> | <b>140 206 750,31</b> | <b>12 997 029,02</b>                                             | <b>2 260 477,49</b>                                             | <b>145 864,76</b>                                               | <b>155 610 121,58</b>                     |
| Gastos generales                  | 25 139 186,40         | 436 992,32                                                       | 553 743,66                                                      | 100 969,74                                                      | 26 230 892,12                             |
| Gastos de supervisión             | 8 675 429,93          | 82 912,70                                                        | 67 667,17                                                       | 36 179,30                                                       | 8 862 189,10                              |
| Gestión del proyecto              | 1 550 048,42          | 2 112 685,58                                                     | -                                                               | -                                                               | 3 662 734,00                              |
| Presupuesto plan covid-19         | 1 216 979,48          | -                                                                | -                                                               | -                                                               | 1 216 979,48                              |
| Liquidación del proyecto          | 696 584,67            | -                                                                | -                                                               | -                                                               | 696 584,67                                |
| Expediente técnico                | 1 800 000,00          | -                                                                | -                                                               | -                                                               | 1 800 000,00                              |
| <b>Sub Total</b>                  | <b>179 284 979,21</b> | <b>15 629 619,62</b>                                             | <b>2 881 888,32</b>                                             | <b>283 013,80</b>                                               | <b>198 079 500,95</b>                     |
| Control concurrente               | 3 549 431,07          | -                                                                | -                                                               | -                                                               | 3 549 431,07                              |
| <b>Total de inversión</b>         | <b>182 834 410,28</b> | <b>15 629 619,62</b>                                             | <b>2 881 888,32</b>                                             | <b>283 013,80</b>                                               | <b>201 628 932,02</b>                     |

Fuente: Formato n.º 08-A Registros en la Fase de Ejecución, fecha verificación 29 de enero de 2025, <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2215017>.

Elaborado por: Comisión de Control.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Cuadro n.º 4**  
**Resumen del costo de inversión actualizado**

| Descripción                                    | Monto S/              |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Costo directo del proyecto</b>              | <b>155 610 121,58</b> |
| Gastos generales                               | 26 230 892,12         |
| Gastos de supervisión                          | 8 862 189,10          |
| Gestión del proyecto                           | 3 662 734,00          |
| Presupuesto plan covid-19                      | 1 216 979,48          |
| Liquidación del proyecto                       | 696 584,67            |
| Expediente técnico                             | 1 800 000,00          |
| <b>Sub Total</b>                               | <b>198 079 500,95</b> |
| Control concurrente                            | 3 549 431,07          |
| <b>Costo total de la inversión actualizado</b> | <b>201 628 932,02</b> |

Fuente: Formato n.º 08-A Registros en la Fase de Ejecución, fecha verificación 29 de enero de 2025, <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2215017>.

Elaborado por: Comisión de Control.

Sobre el particular, el expediente consignó como período de ejecución 730 días calendarios aprobado con Resolución Gerencial Regional n.º 031-2022-GR.APURÍMAC/CG de 12 de abril de 2022, iniciando su ejecución el 10 de mayo del 2022 y que culminó el 9 de mayo de 2024, conforme se detalla en cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 5**  
**Plazo de ejecución física reprogramado**

| Inicio de obra Programado | Plazo de ejecución programado | Termino de obra programado |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 10/05/2022                | 730                           | 09/05/2024                 |

Fuente: Resolución Gerencial Regional n.º 031-2022-GR.APURÍMAC/CG de 12 de abril de 2022

Sin embargo, en la fase de ejecución de todo el proyecto se aprobaron cincuenta y dos (52) ampliaciones de plazo; sin embargo, es de especificar que la meta 142-2025 – Champacocha, se aprobaron solo 8 ampliaciones de plazo, siendo la última aprobada mediante Resolución Gerencial Regional n.º 166-2024-GR.APURIMAC/GRI de 18 de diciembre de 2024 por 120 días calendarios, con el plazo aprobado el proyecto matriz antes citado culminaría el 29 de marzo de 2025<sup>2</sup>.

Asimismo, el proyecto tiene por objetivo principal obtener un incremento en la productividad agrícola para las comunidades campesinas de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, esto beneficiará a 2174 beneficiarios.

El planteamiento de proyecto consta de dos (2) componentes:

Componente 1. Infraestructura de riego, el cual se subdivide en 04 subcomponentes:

- Subcomponente 01 – Infraestructura de retención y almacenamiento en fuentes de agua;
- Subcomponente 02 – Infraestructura de captación y conducción;
- Subcomponente 03 – Infraestructura de almacenamiento y distribución; y
- Subcomponente 04 – Mitigación ambiental.

Componente 2. Componente social, el cual se subdivide en tres (3) subcomponentes:

- Subcomponente 01 – Capacitación social;
- Subcomponente 02 – Capacitación técnica
- Subcomponente 03 – Actividades de empoderamiento.

<sup>2</sup> Ampliación de plazo n.º 8, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional n.º 166-2024-GR.APURIMAC/GRI de 18 de diciembre de 2024 por 120 días calendarios.

Al respecto, el Órgano de Control Institucional ha dispuesto la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Control Concurrente bajo el alcance de la Ley n.° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente” en la fase de ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac”, con CUI n.° 2215017, en particular del sub proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua de Riego, Presa Chinquillay, Distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac”, en adelante “meta 142-2025 sistema de riego en la comunidad de Champaccocha”.

En ese contexto, se muestra las denominaciones en el proceso de ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en la comunidad de Champaccocha, distrito de San Jerónimo - Andahuaylas – Apurímac”, meta 142-2025 Champaccocha, en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 6**  
**Denominación de la meta 142-2025, sistema de riego en la comunidad de Champaccocha**

| METAS POR AÑO | DENOMINACIÓN                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 – 265    |                                                                                                                                                         |
| 2023 – 142    | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en la comunidad de Champaccocha, distrito de San Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac. |
| 2024 – 151    |                                                                                                                                                         |
| 2025 – 142    |                                                                                                                                                         |

**Fuente:** Sistema integrado de Administración financiera SIAF, ejercicio 2022, 2023, 2024 y 2025.

**Elaborado por:** Comisión de Control

Del presupuesto, la meta 142-2025 del sistema de riego en la comunidad de Champaccocha, tuvo un presupuesto inicial de S/ 9 717 465,61, aprobado con Resolución Gerencial Regional n.° 801-2022-GR.APURÍMAC/CG de 29 de diciembre de 2022, posteriormente mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 151-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de noviembre de 2024, se aprobó la modificación en la fase de ejecución n.° 01, con incremento presupuestal (mayores metrados y partidas nuevas), por S/ 896 667.41, para el sub proyecto denominado: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en la comunidad de Champaccocha, distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac”, meta 142-2025, siendo el nuevo presupuesto de S/ 10 614 133,02.

**Cuadro n.° 7**  
**Estructura de presupuesto con la modificación n.° 01**

| Presupuesto de obra     | Expediente Técnico primigenio | Modificación 01 incremento presupuestal | Presupuesto modificado |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Costo Directo</b>    | 8 165 923,69                  | 750 042,43                              | 8 915 966,12           |
| <b>Gastos Generales</b> | 1 464 156,88                  | 146 624,98                              | 1 610 781,86           |
| <b>Plan Covid</b>       | 87 385,04                     |                                         | 87 385,04              |
| <b>Total inversión</b>  | 9 717 465,61                  | 896 667,41                              | <b>10 614 133,02</b>   |

**Fuente:** Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 151-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de noviembre de 2024

**Elaborado por:** Comisión de Control

Del plazo de ejecución, de la meta 142-2025 del sistema de riego en la comunidad de Champaccocha, al respecto, se aprobaron ocho (8) ampliaciones, conforme al siguiente detalle:

**Aprobación del plazo de ejecución:** Aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 801-2022-GR.APURÍMAC/GG de 29 de diciembre de 2022, y con informe n.° 47-2022-GRAP/GRI/JTM-COORDINADOR, de 23 de setiembre de 2022, numeral 5, Plazo de ejecución de metas presupuestales, en el ítem n.° 1, se determina la Meta “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad de Champaccocha, distrito de San Jerónimo,



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Sarmely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

Andahuaylas, Apurímac", se indica el plazo de ejecución de 427 días calendarios, comprendido desde el 17 de agosto de 2022 al 17 de octubre de 2023.

### Cuadro n.º 8

#### Plazo de ejecución meta 142-2025 del sistema de riego en la comunidad de Champacocha

| Descripción                                | Fecha                | Documento de aprobación                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de inicio</b>                     | 17/08/2022           | Resolución Gerencial General Regional                                                        |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 427                  | n.º 801-2022- GR.APURIMAC/GG de 29 de diciembre de 2022, (Aprobación de Expediente Técnico). |
| <b>Fecha de término programado</b>         | 17/10/2023           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 1</b>           | 18/10/2023           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 66                   | n.º 062-2023-GR.APURIMAC/GRI de 27 de noviembre de 2023.                                     |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 1</b> | 22/12/2023           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 2</b>           | 23/12/2023           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 140                  | n.º 028-2024-GR.APURIMAC/GRI de 2 de mayo de 2024.                                           |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 2</b> | 10/05/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 3</b>           | 11/05/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 108                  | n.º 066-2024-GR.APURIMAC/GRI de 11 de julio de 2024.                                         |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 3</b> | 26/08/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 4</b>           | 27/08/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 26                   | n.º 112-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de septiembre de 2024.                                    |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 4</b> | 21/09/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 5</b>           | 22/09/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 26                   | n.º 128-2024-GR.APURIMAC/GRI de 22 octubre de 2024.                                          |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 5</b> | 17/10/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 6</b>           | 18/10/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 26                   | n.º 139-2024-GR.APURIMAC/GRI de 19 de noviembre de 2024.                                     |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 6</b> | 12/11/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 7</b>           | 13/11/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 17                   | n.º 154-2024-GR.APURIMAC/GRI de 3 de diciembre de 2024.                                      |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 7</b> | 29/11/2024           |                                                                                              |
| <b>Ampliación de plazo n.º 8</b>           | 30/11/2024           | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura                                             |
| <b>Plazo de ejecución</b>                  | 120                  | n.º 166-2024-GR.APURIMAC/GRI de 18 de diciembre de 2024.                                     |
| <b>Fecha de término reprogramado n.º 8</b> | 29/03/2025           |                                                                                              |
| <b>Plazo total de ejecución</b>            | 956 días calendarios |                                                                                              |

**Fuente:** Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.º 166-2024-GR.APURIMAC/GRI de 18 de diciembre de 2024.

**Elaborado por:** Comisión de Control

En consecuencia, sobre las ocho (8) ampliaciones de plazo, se tiene un plazo de ejecución de 956 días calendarios, con fecha de término reprogramado el 29 de marzo de 2025.

Asimismo, es preciso señalar que la meta 142-2025 del sistema de riego en la comunidad de Champacocha del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en la comunidad de Champacocha, distrito de San Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac", cuenta con la participación en el proceso de ejecución con los siguientes profesionales:

### Cuadro n.º 9

#### Personal técnico meta 142-2025 del sistema de riego en la comunidad de Champacocha

| n.º | Cargo             | Responsable                | n.º Colegiatura |
|-----|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | Residente de Obra | Juan Arizapana Mollehuanca | 116672          |
| 2   | Inspector de Obra | Sócrates Soto Pareja       | 94690           |

**Fuente:** Información proporcionada por la Entidad.

**Elaborado por:** Comisión de Control



Firmado digitalmente por  
 LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
 QUISPE MITMA Raul Ernesto  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CORNEJO ANTON Cesar FAU  
 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00


## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la visita efectuada a la ejecución de la meta 151 Sistema de riego en la comunidad de Champacocha, se han identificado una (1) situación adversa que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, la cual se expone a continuación:

- 1. PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA ARMADA DE CONCRETO  $f_c = 280 \text{ KG/CM}^2$  DEL RESERVORIO ALALAYLLA PODRÍA GENERAR RIESGO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR INFILTRACIÓN Y POSIBLES DAÑOS A LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y VIDA ÚTIL; ADEMÁS, DE POSIBLES SOBRECOSTOS A LA OBRA POR LAS REPARACIONES A EJECUTAR PARA SU FUNCIONALIDAD.**

De la inspección técnica realizada a la meta Champacocha, el 22 de noviembre de 2024, registrada en el Acta de Visita de Inspección n.° 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO-CHINQUILLAY, se advierte la presencia de fisuras y grietas en la losa de fondo y la corona de muros de concreto armado; así también, escantillones de madera embebidos en el muro (exterior) del reservorio Alalaylla, ubicado en la comunidad de Champacocha; conforme se muestra a continuación en las imágenes siguientes:

**Imagen n.° 1**  
**Diagrama de fisuras en el reservorio Alalaylla**

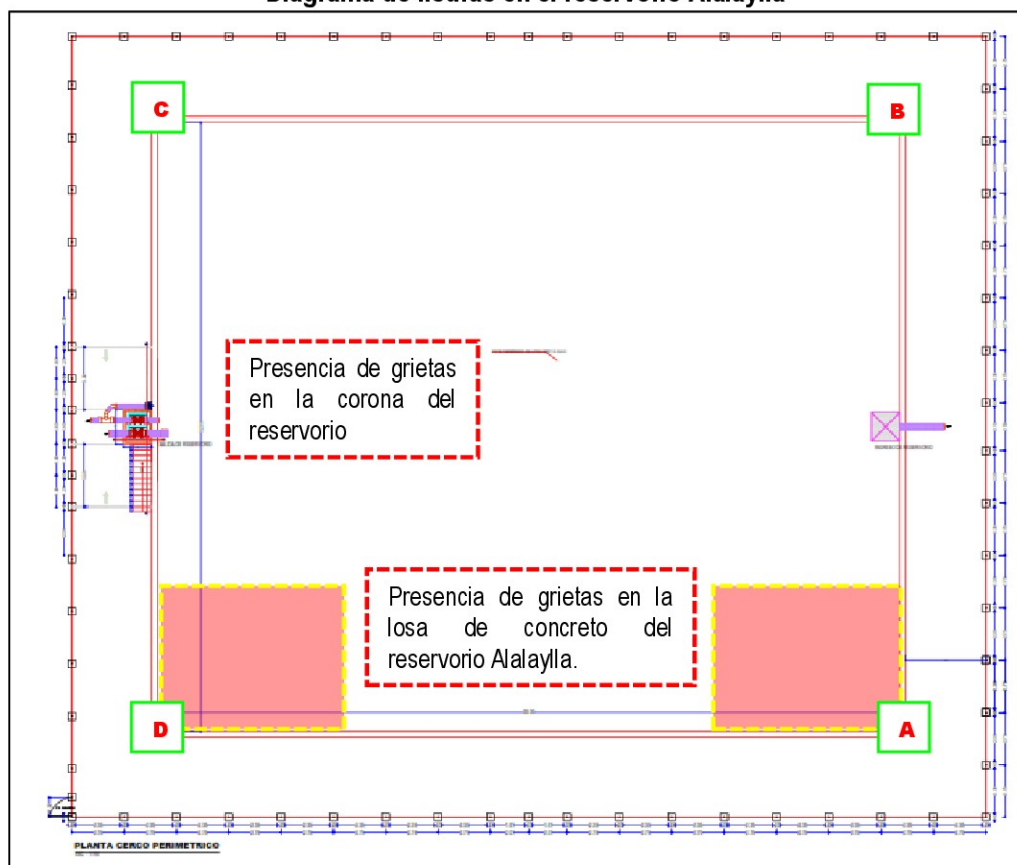

Fuente: Plano del cerco perimétrico del reservorio Alalaylla, lámina PCR -03, establecidos en el expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 151-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Sarmely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 2**  
**Panorámico del reservorio Alalaylla**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00




Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 3**  
**Presencia de fisuras y grietas en el reservorio Alalaylla**

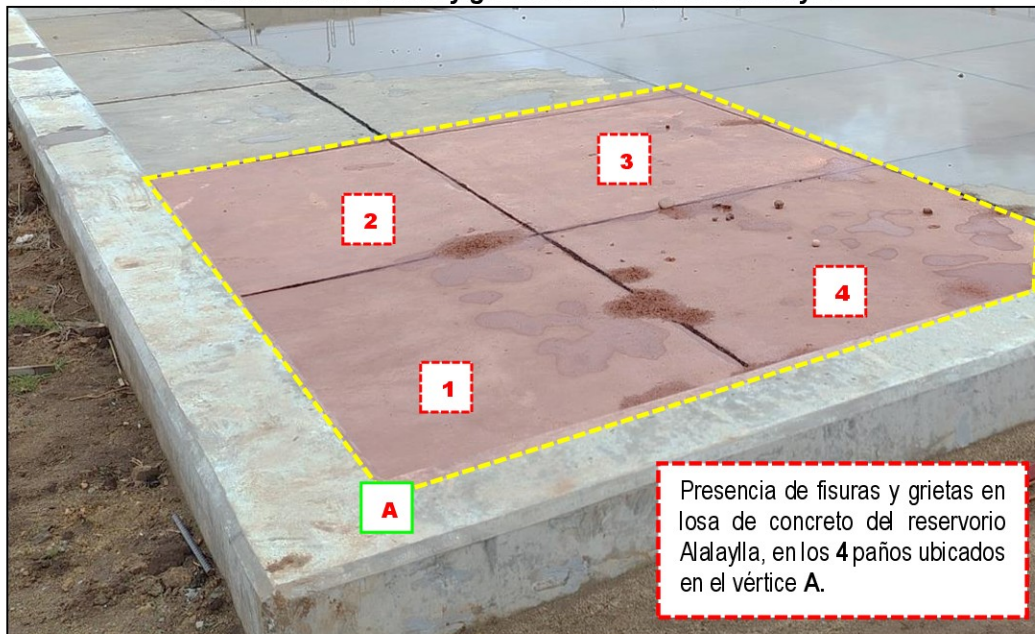

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 4**  
**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 1 A.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00

**Imagen n.º 5**

**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 2 A.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 6**  
**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 3 A.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00


**Imagen n.º 7**  
**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 4 A.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 8**

**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en los 4 paños del vértice D.**

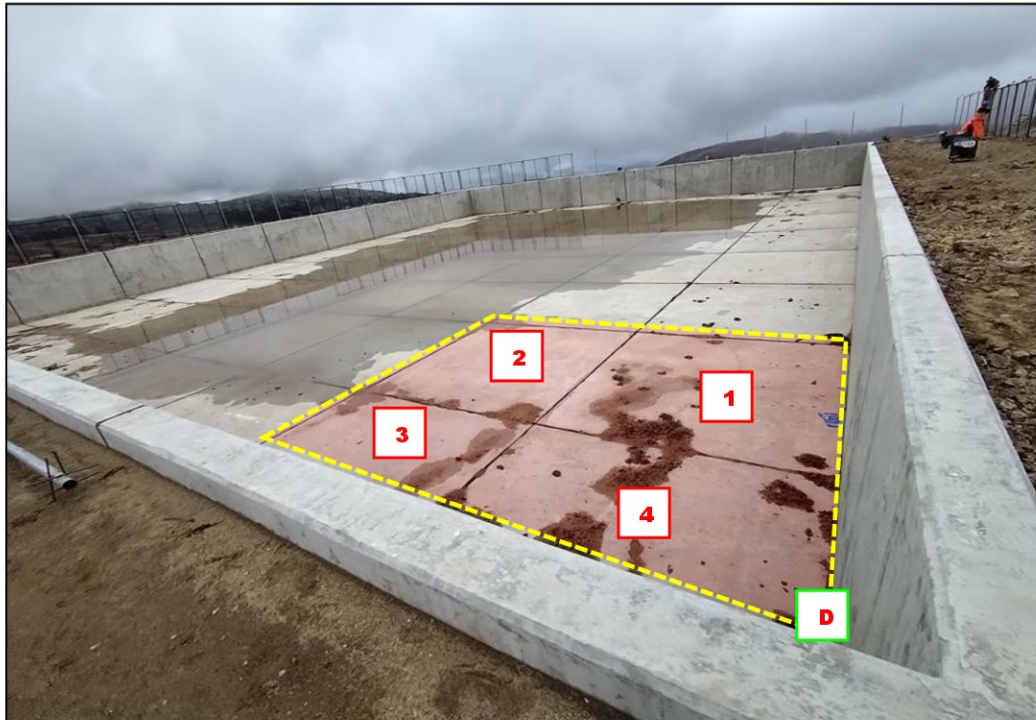

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 9**

**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 1 D.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 10**


**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla en el paño 1 D.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 11**

**Presencia de grietas en el reservorio Alalaylla en el paño 1 D.**

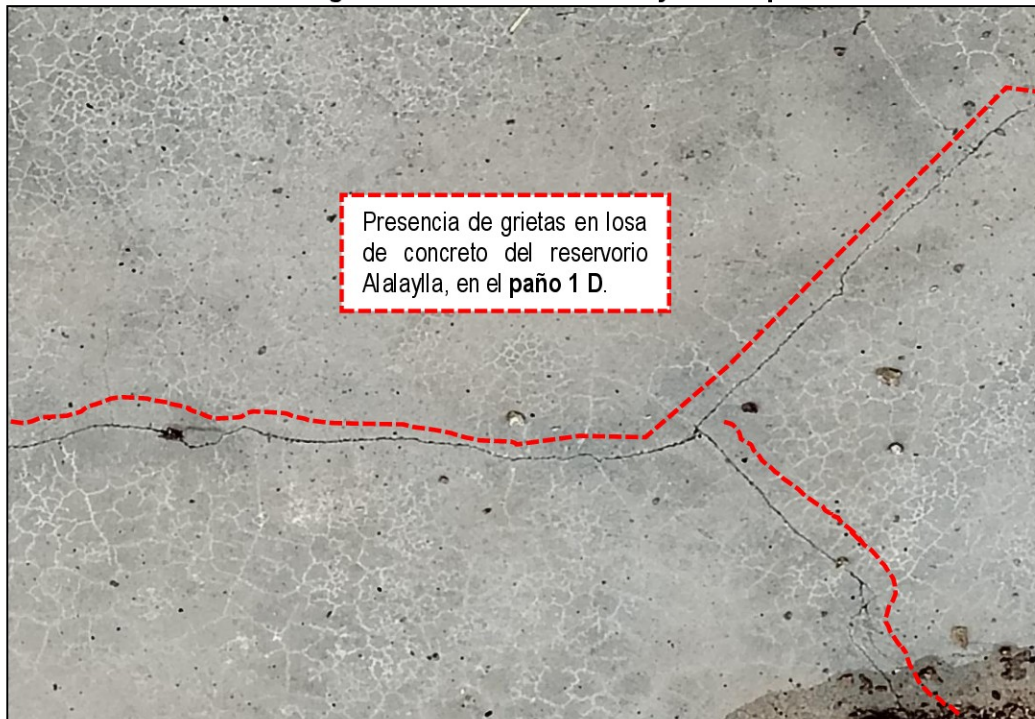

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 12**


**Presencia de grietas en el reservorio Alalaylla en el paño 4 D.**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 13**

**Presencia de fisuras en el reservorio Alalaylla ubicado en la corona.**

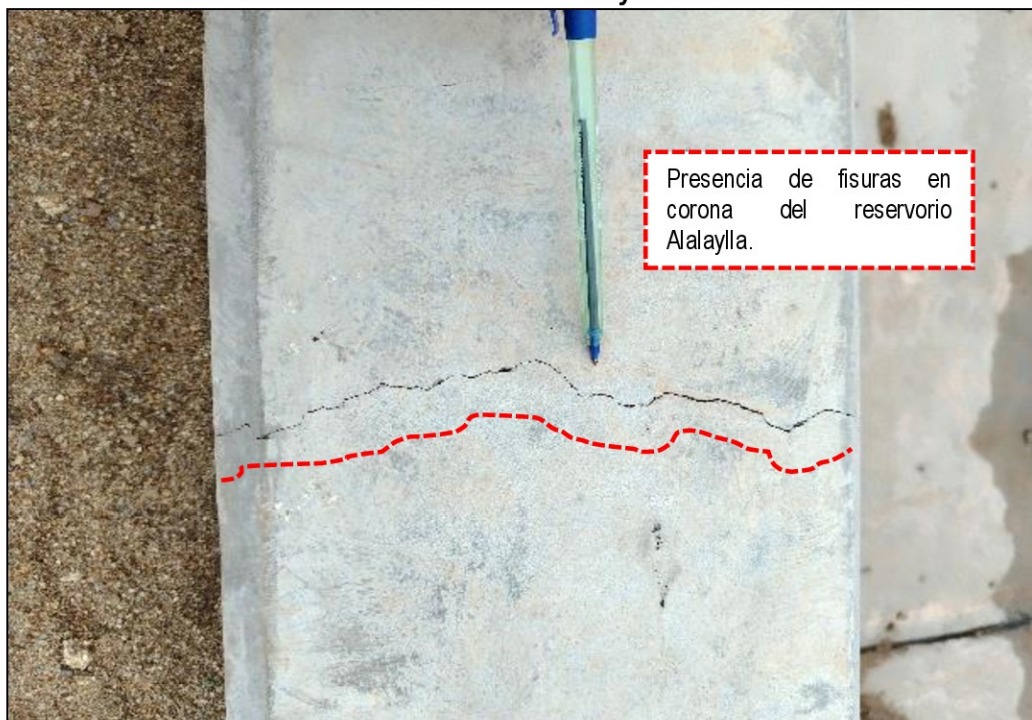

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00




Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

Las fisuras longitudinales evidenciadas en la losa del reservorio Alalaylla, por la comisión de control, podrían afectar la capacidad del reservorio, por la infiltración del agua que almacena; asimismo, por la desintegración por erosión del concreto, este tipo de patología se debe al contacto de la estructura (losa con fisuras) con el paso intenso de líquidos que transportan sólidos en movimiento<sup>3</sup>, capaz de producir desgaste en la superficie por raspadura, deslizamiento, rozamiento y arrastre. Asimismo, las deformaciones (fisuras) que pueden provocar perjuicios en el funcionamiento del elemento<sup>4</sup>.

Al respecto, las fisuras y grietas identificadas en los diferentes paños de la losa y de la corona del reservorio Alalaylla, por el contacto permanente del agua, pueden generar el riesgo de infiltración a las estructuras internas, pudiendo degradar u oxidar el acero de refuerzo estructural, hecho que podría afectar la capacidad de almacenamiento del reservorio y reduciendo su vida útil.

#### Imagen n.º 14

#### Escantillón de madera incrustada en los muros del reservorio Alalaylla

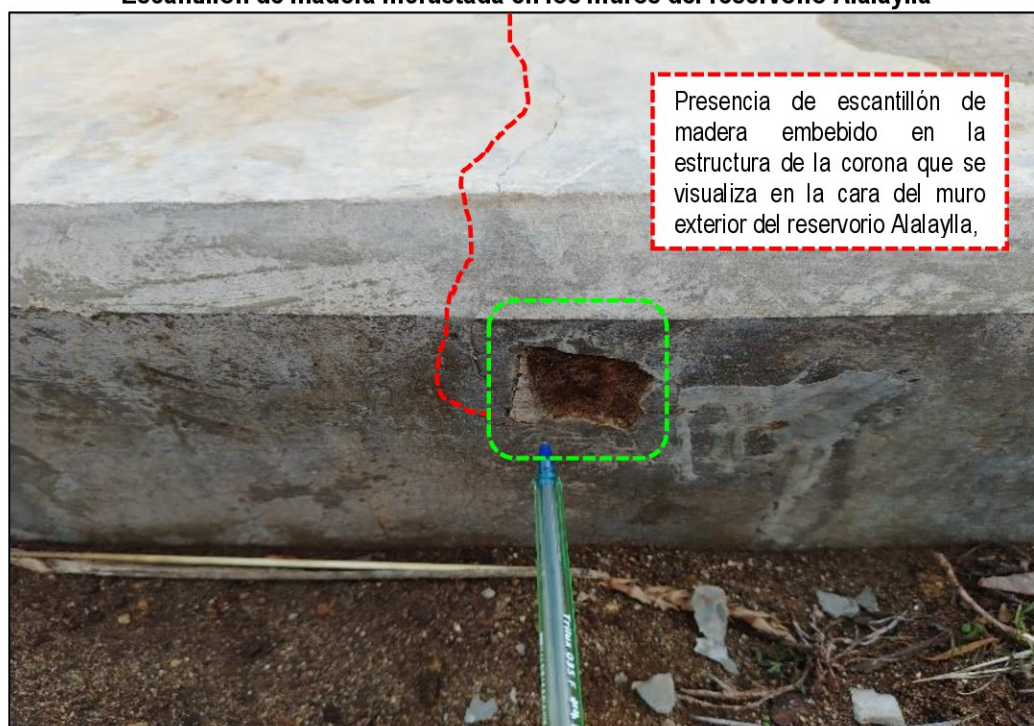

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

<sup>3</sup> Casas, O. (2017). Patología del concreto, <https://es.slideshare.net/jimmyesk1/patologia-del-concreto>.

<sup>4</sup> Curbelo, B. (2015). Concreto estructural aplicado, Concreto Armado de la Norma Peruana E.060, Concreto estructural reforzado y concreto estructural simple.

**Imagen n.º 15**

**Escantillón de madera incrustada en los muros del reservorio Alalaylla**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

**Imagen n.º 16**

**Escantillón de madera incrustada en los muros del reservorio Alalaylla**



**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00




Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**Imagen n.º 17**

**Escantillón de madera incrustada en los muros del reservorio Alalaylla**

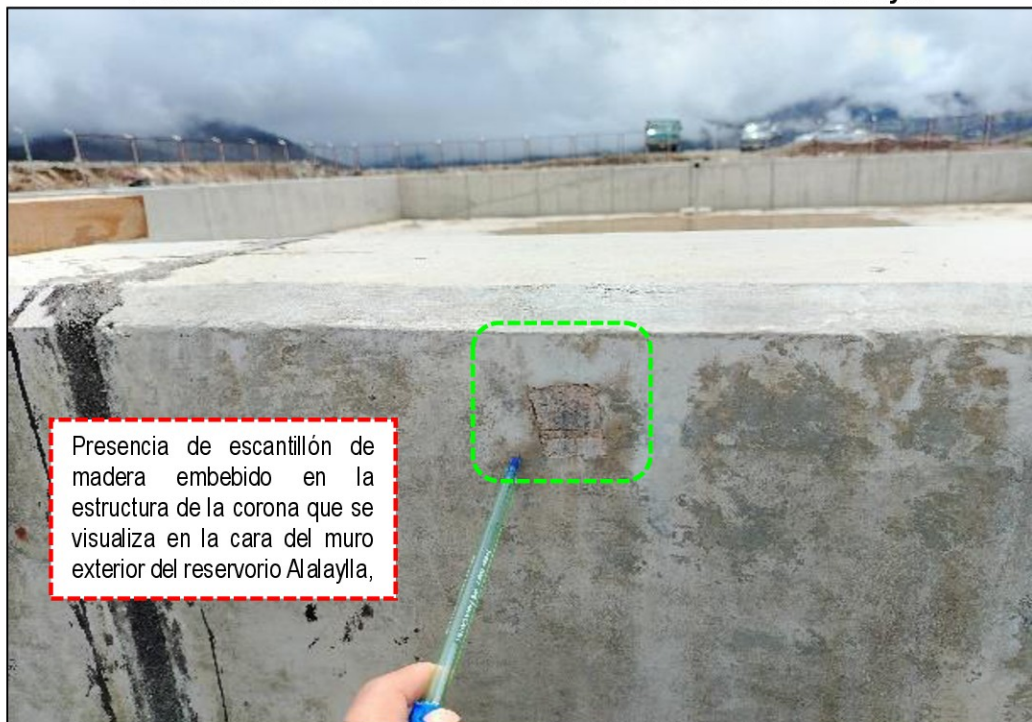

**Fuente:** Acta de visita de inspección n.º 59-2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO\_PARCCO – CHINQUILLAY, vista fotográfica de 22 de noviembre de 2024.

Por otra parte, se advierte que, los escantillones de madera se encuentran incrustados en la pantalla del muro (cara exterior) del reservorio, sin recubrimiento o tratamiento alguno, además se suma la presencia de orificios en el perímetro del escantillón, siendo un medio de filtración de agua al interior de la estructura y la madera al ser un material poroso cuando entra en contacto con el agua se hincha, expande y deteriora, ya que sus fibras absorben el agua, por lo que no es recomendable incrustar madera en la estructura<sup>5</sup>.

Al respecto, es preciso resaltar que, Félix Lasheras Merino, en el libro Patología de la construcción con madera en el Capítulo XI, establece que: "(...) Además de las acciones mecánicas propias de cualquier elemento constructivo, especialmente si tiene funciones estructurales, la madera tiene una problemática específica de degradación, siendo especialmente sensible a los agentes destructores de la edificación más importantes: el fuego y la humedad (...) "<sup>6</sup>, asimismo, también es necesario mencionar que los problemas patológicos de las estructuras de madera que pueden generar en la estructura de concreto son "(...) Fisuras o grietas (...) "<sup>7</sup>.

En tal sentido, la presencia de fisuras, grietas y escantillones de madera en el concreto, generan el riesgo de posible pérdida de capacidad de almacenamiento por infiltración y posibles daños a la integridad estructural.

Asimismo, al hecho advertido, es preciso señalar que, la responsabilidad de la calidad de obra es exclusiva del residente de obra, según la Directiva n.º 001-2022-GR, específicamente en el

<sup>5</sup> Artículo, "Wood Swells", de octubre de 1978, página 584.

<sup>6</sup> Lasheras Merino, Félix (2009). Patología de la construcción madera. En: "Tratado Técnico Jurídico de la Edificación y el Urbanismo. Tomo I. Patología de la Construcción y Técnicas de Intervención". Thomson Reuters, Aranzadi, S.A, Cizur Menor (Navarra), pp. 801-862. ISBN 9788499033297.

<sup>7</sup> Lasheras Merino, Félix (2009). Patología de la construcción madera. En: "Tratado Técnico Jurídico de la Edificación y el Urbanismo. Tomo I. Patología de la Construcción y Técnicas de Intervención". Thomson Reuters, Aranzadi, S.A, Cizur Menor (Navarra), pp. 801-862. ISBN 9788499033297.

numeral 8.3.3.5.2, literal g) que establece las responsabilidades y funciones del residente de obra/coordinador de proyecto, entre otras: “(...) el RO cumplirá estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en el expediente técnico y sus modificaciones debidamente autorizadas (...)”, así también es responsabilidad exclusiva del supervisor de obra, según la Directiva n.º 001-2022-GR, específicamente en el numeral 8.3.3.5.2, Responsabilidad y funciones del Inspector de Proyectos de Inversión, que establece entre otros: “(...) El ingeniero Inspector asume la responsabilidad técnica, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, antes, durante y después de la ejecución de la obra (...)”.

Los hechos expuestos contravienen la normatividad siguiente:

- **Norma Técnica E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA y modificada por Resolución Ministerial n.º 010 -2019-VIVIENDA de 8 de marzo de 2009.**

**“CAPÍTULO 5 CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACIÓN**

(...)

**5.10 COLOCACIÓN DEL CONCRETO**

(...)

5.10.7 Todo concreto debe ser compactado cuidadosamente por medios adecuados durante la colocación y debe ser acomodado por completo alrededor del refuerzo y de los elementos embebidos y en las esquinas del encofrado. Los vibradores no deberán usarse para desplazar lateralmente el concreto en los encofrados.

(...)

**CAPÍTULO 8 ANÁLISIS Y DISEÑO — CONSIDERACIONES GENERALES**

**8.1 MÉTODOS DE DISEÑO**

(...)

Se comprobará que la respuesta de los elementos estructurales en condiciones de servicio (deflexiones, agrietamiento, vibraciones, fatiga, etc.) queden limitadas a valores tales que el funcionamiento sea satisfactorio. (...)”.

- **Expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 801-2022-GR.APURIMAC/CG de 29 de diciembre de 2022.**

“( ... )

Plano del cerco perimétrico del reservorio Alalaylla, lámina PCR -01

( ... )

Plano del cerco perimétrico del reservorio Alalaylla, lámina PCR -03

( ... )”.

- **Directiva n.º 001-2022-GR. APURIMAC/GR “Lineamientos para la programación multianual, formulación, evaluación y ejecución de inversiones por administración directa del Gobierno Regional de Apurímac”, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.º 467-2022-GR.APURIMAC/GR de 23 de diciembre de 2022.**

“( ... )

**8.3.3. EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN**

(...)

**8.3.4. SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN**

**8.3.4.1. Consideraciones generales**

**a) Supervisión de Inversiones ejecutadas por Administración Directa**

Los Supervisores de Obra son profesionales (...), contratados para controlar de forma integral los trabajos efectuados por el Residente y/o Coordinador de la Inversión, además es el



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Sarmely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

responsable de velar directa y de forma permanente la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la inversión a través del cumplimiento en todos sus extremos del ET y/o DE, así como de las modificaciones aprobadas (...).

**b) Acciones de supervisión**

(...)

4. La supervisión de Obra deberá ejecutar el control físico, económico y contable de la Obra.

(...)

**8.3.3.5 Inicio de la ejecución física de la inversión**

(...)

**8.3.3.5.2. Proceso de ejecución**

(...)

**g. Responsabilidad y funciones del residente de obra/coordinador de proyecto**

(...)

"El RO cumplirá estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en el expediente técnico y sus modificaciones debidamente autorizadas".

(...)

**Responsabilidad y funciones del Inspector de Proyectos de Inversión**

El ingeniero Inspector asume la responsabilidad técnica, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, antes, durante y después de la ejecución de la obra.

(...)

**8.3.3.7.4. Control de calidad**

El RO/CP tiene la responsabilidad de realizar los controles de calidad de materiales y procesos constructivos, previa conformidad del inspector de la inversión.

Durante la ejecución de la Inversión debe realizarse las pruebas técnicas de control de calidad (...) destinadas a verificar si los materiales e insumos son adecuados e idóneos, siendo que su utilización corresponde a las Especificaciones Técnicas.

(...)"

Los hechos descritos, generan el riesgo de posible pérdida de capacidad de almacenamiento por infiltración y posibles daños a la integridad estructural y la vida útil del reservorio Alalaylla, debido a la presencia de grietas, fisuras, maderas incrustadas su exposición a la intemperie en los muros perimetrales; además, generar sobrecosto a la obra por las reparaciones a realizar para la funcionalidad del mismo.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de control concurrente al Hito de Control: A la ejecución contractual del sistema de riego en la comunidad de Champacocha del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac", se encuentra detallada en el apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en la condición.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

## VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales el Gobierno Regional de Apurímac aún no ha adoptado acciones preventivas y/o correctivas, se detallan en el Apéndice n.º 2.

## IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente a la ejecución contractual del sistema de riego en la comunidad de Champacocha, del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac", se ha advertido una (1) situación adversa que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Apurímac el presente informe de Hito de Control, el cual contiene una (1) situación adversa identificada como resultado del servicio de control concurrente a la ejecución contractual del sistema de riego en la comunidad de Champacocha del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distrito de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto.
2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Apurímac, que debe comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Abancay, 30 de enero de 2025.

 **LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  
Firmado digitalmente por QUISPE  
MITMA Raul Ernesto FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-01-2025 10:10:59 -05:00

**Raúl Ernesto Quispe Mitma**  
Supervisor de Comisión  
Comisión de Control

 **CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  
Firmado digitalmente por LOZA CHIPA  
Liz Sarmely FAU 20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-01-2025 10:00:44 -05:00

**Liz Sarmely Loza Chipa**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control

 **CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  
Firmado digitalmente por CORNEJO  
ANTON Cesar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-01-2025 10:26:03 -05:00

**César Cornejo Antón**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Gobierno Regional de Apurímac  
**Contraloría General de la República**

**APÉNDICE N° 1****DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE**

1. **PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA ARMADA DE CONCRETO  $f_c = 280 \text{ KG/CM}^2$  DEL RESERVORIO ALALAYLLA PODRÍA GENERAR RIESGO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR INFILTRACIÓN Y POSIBLES DAÑOS A LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y VIDA ÚTIL; ADEMÁS, DE POSIBLES SOBRECOSTOS A LA OBRA POR LAS REPARACIONES A EJECUTAR PARA SU FUNCIONALIDAD.**

| N° | Documento                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de visita de inspección n.° 59 -2024-OCI/5333-SCC/PROYECTO_PARCCO-CHINQUILLAY; de 22 de noviembre de 2024.                                |
| 2  | Expediente técnico aprobado con Resolución Gerencial General Regional n.° 801-2022-GR.APURIMAC/GG de 29 diciembre de 2022                      |
| 3  | Expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 151-2024-GR.APURIMAC/GRI de 27 de noviembre de 2024. |
| 4  | Oficio n.° 029-2025-GORE.AOURIMAC/DRA-OT de 25 de enero de 2025.                                                                               |



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Sarmely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:00:27 -05:00



Firmado digitalmente por  
QUISPE MITMA Raul Ernesto  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:10:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
CORNEJO ANTON Cesar FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 10:25:40 -05:00

**APÉNDICE N° 2****SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES**

**Informe de Hito de Control n.º 191-2024-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 1421-2024-CG/OC5333, recibido el 25 de octubre de 2024.**  
**Hito de Control n.º 63**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - Los responsables de la meta 140 presa peruanita ejecutan la partida 1.1.7.3.1 “conformación y compactado de material enrocado 3A (...)”, en la zona del espaldón aguas arriba de la banqueta B 30, de la presa peruanita, inobservando el tamaño máximo de roca establecido en los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico reformulado aprobado.
  - Los responsables de la meta 140 Presa Peruanita ejecutan el sistema de drenaje de pie de presa, inobservando la altura de relleno con material de filtro establecida en el plano de sección típica de la presa peruanita, situación que comprometería la calidad de la obra y vida útil.
  - La entidad permite que el consorcio Huari ejecute el “servicio de voladura de roca fija controlada para la obra”, incumpliendo los términos de referencia de las bases integradas del concurso público n.º 3-2024-GRAP/CS-1, generando el riesgo de no ejercer actos en salva guarda de los intereses del estado.



**Informe de Hito de Control n.º 192-2024-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 1437-2024-CG/OC5333, recibido el 6 de noviembre de 2024.**  
**Hito de Control n.º 64**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - Comité de selección calificó de manera irregular oferta de postor transgrediendo las bases integradas del concurso público n.º 2-2024-GRAP/CS-1, lo que podría afectar la transparencia en el procedimiento de selección de la meta 141 presa Chinquillay.
  - Comité de selección adjudicó la buena pro al postor corporación VAMRAH E.I.R.L., transgrediendo las bases integradas de la adjudicación simplificada n.º 46-2024-GRAP-3 (tercera convocatoria), hecho que podría afectar la transparencia en el procedimiento de selección de la meta 2 Chullcuisa.



**Informe de Hito de Control n.º 195-2024-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 1552-2024-CG/OC5333, recibido el 25 de noviembre de 2024.**  
**Hito de Control n.º 65**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - Riesgo de pérdida de la capacidad de almacenamiento por infiltración y posibles daños a la integridad estructural y vida útil; además, de posibles sobre costos a la obra por las reparaciones a ejecutar para su funcionalidad.



- Ejecución de reservorio pichiuccara inobservando el volumen de almacenamiento establecido en los planos del expediente técnico aprobado, genera el riesgo de afectar la demanda de agua para riego, el calendario y tiempo de riego, conllevando al incumplimiento del objeto del proyecto.
- La entidad recepcionó tapas metálicas sin cumplir con los términos de referencia de las bases integradas de la adjudicación simplificada AS-SM-199-2023-GRAP-1, generando el riesgo de oxidación de los bienes, situación que podría afectar la calidad y resistencia de las mismas.

**Informe de Hito de Control n.º 200-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 1571-2024-CG/OC5333, recibido el 4 de diciembre de 2024.**  
**Hito de Control n.º 66**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

- Retrasos en la prestación del servicio de conformación de dentellón (eje de presa - estructura 2A) con maquinaria pesada a todo costo, genera el riesgo de afectar la oportuna prestación del servicio para la conformación del cuerpo de la presa; además, de mayores gastos generales y demora en el cumplimiento del objetivo del proyecto.

**Informe de Hito de Control n.º 201-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 1573-2024-CG/OC5333, recibido el 10 de diciembre de 2024.**  
**Hito de Control n.º 67**



1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

- La Entidad contrató el servicio de conformación de cuerpo de presa (carguío y transporte de material de cantera a presa y conformación del cuerpo de presa) a todo costo derivado del proceso de selección concurso público n.º 2-2024-GRAP/CS-1, que contiene especificaciones técnicas de los materiales (zona a, zona b, zona c y zona 4) que no se condicen con lo establecido en el expediente técnico, documento que también consigna planos y especificaciones técnicas incongruentes, entre sí, situación que afectaría la integridad estructural de la presa y su funcionamiento.

**Informe de Hito de Control n.º 002-OCI/5333-SCC notificado con oficio n.º 135-2025-CG/OC5333, recibido el 30 de enero de 2025.**  
**Hito de Control n.º 002**



1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

- La entidad no ha comunicado al tribunal de contrataciones del estado, sobre presuntas infracciones cometidas por los postores ganadores de los procesos de selección siguientes: adjudicación simplificada AS-SM-69-2024-GRAP-1, adjudicación simplificada AS-SM-86-2024-GRAP-2 y adjudicación simplificada AS-SM-92-2023-GRAP-2, generando el riesgo que la infracción prescriba y que dicha inacción motive que se repitan situaciones similares, que generarían sobrecostos y ampliaciones de plazo a las metas del citado proyecto.



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Abancay, 31 de Enero de 2025

**OFICIO N° 000145-2025-CG/OC5333**

Señor:  
Percy Godoy Medina  
**Gobernador Regional**  
Gobierno Regional de Apurímac  
Jr. Puno N° 107  
**Apurímac/Abancay/Abancay**

**ASUNTO :** Notificación de Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5333-SCC

**REF. :** a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, y en aplicación de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuiza, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac", comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenida en el Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5333-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al OCI del Gobierno Regional de Apurímac en el **plazo máximo de (5) días hábiles** desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por  
LOZA CHIPA Liz Samely FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-01-2025 11:13:03 -05:00

Documento firmado digitalmente

**Cesar Cornejo Anton**

Jefe del Órgano de Control Institucional del  
Gobierno Regional De Apurímac  
Contraloría General de la República

(CCA/Ilc)

Nro. Emisión: 00189 (5333 - 2025) Elab:(U67163 - 5333)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **CNUTBKT**





**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2025-CG/5333-02-002-003**

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 145-2025-CG/OC5333

**EMISOR** : LIZ SARMELY LOZA CHIPA - JEFE DE COMISION - COMISION CC  
PROYECTO PARCCO CHINKILLAY - CONTRALORÍA GENERAL DE  
LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : PERCY GODOY MEDINA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20527141762

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

**N° FOLIOS** : 25

---

Sumilla: Remite informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5333-SCC efectuado a la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac"

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000145-2025-OC5333 (1)[F]
2. Infomre HC 3\_Hito 69-F





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 145-2025-CG/OC5333

**EMISOR** : LIZ SARMELY LOZA CHIPA - JEFE DE COMISION - COMISION CC  
PROYECTO PARCCO CHINKILLAY - CONTRALORÍA GENERAL DE  
LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : PERCY GODOY MEDINA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

---

Sumilla:

Remite informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5333-SCC efectuado a la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champacocha, Ancatira, Choccecancha y Argama Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac"

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20527141762**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2025-CG/5333-02-002-003
2. OFICIO-000145-2025-OC5333 (1)[F]
3. Infomre HC 3\_Hito 69-F

**NOTIFICADOR** : LADISLAO GAVANCHO OYOLA - GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

