



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH

**“EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**

**HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y MOBILIARIOS**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 9 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024**

TOMO I DE I

NUEVO CHIMBOTE, 18 DE JULIO DE 2024

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

“EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN.....	3
II. OBJETIVOS.....	3
III. ALCANCE.....	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL.....	3
V. SITUACIONES ADVERSAS.....	7
1. La Entidad requirió y compró equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto.	7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.....	13
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	13
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES.....	13
IX. CONCLUSIONES.....	13
X. RECOMENDACIONES.....	13
APÉNDICES.....	15
ANEXOS.....	17



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

“EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ancash, mediante Oficio n.° 576-2024-CG/GRAN de 15 de marzo de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L425-2024-078, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer que la fase de ejecución del proyecto cumpla con los objetivos y metas establecidas dentro del plazo y costos de acuerdo a los procedimientos de la norma vigente.

2.2 Objetivo específico

Determinar si el requerimiento y compra de los equipos de cómputo y mobiliario para el proyecto: “Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash”, es conforme a lo establecido en la normativa aplicable y al Estudio Definitivo al Equipamiento, Mobiliario y Capacitación

III. ALCANCE

El Servicio de Control Concurrente se desarrolló a la recepción de equipos informáticos y mobiliarios del proyecto: “Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash” en adelante la “Proyecto”, el cual se encuentra a cargo de la Universidad Nacional del Santa, en adelante la “Entidad”, y que ha sido ejecutada del 9 al 15 de julio de 2024, en la Oficina de Enlace de la Gerencia Regional de Control de Ancash en Chimbote, ubicado en la Av. Argentina Mz. F2 lote 10 – Urb. El Pacifico – distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

La Entidad, continuando con la ejecución del Proyecto, a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, adquirió las computadoras y mobiliario que se detalla a continuación:



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

**CUADRO N° 1
RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO**

Nro.	ORDEN DE COMPRA – GUÍA DE INTERNAMIENTO	FECHA	DETALLE	ORDEN DE COMPRA – PERÚ COMPRAS
01	0000023	11/03/2024	Adquisición de 51 CPU y 51 monitores de tipo 1	OCAM-2024-114-1-1
02	0000024	11/03/2024	Adquisición de 13 CPU y 13 monitores de tipo 2	OCAM-2024-114-2-1
03	0000099	10/03/2024	Adquisición de 21 monitores y 21 estaciones de trabajo	OCAM-2024-114-21-1
04	0000025	13/04/2024	Adquisición de 45 computadoras portátil	OCAM-2024-114-3-1
05	0000110	03/04/2024	Adquisición de 1 estación de trabajo portátil	OCAM-2024-114-22-1
06	0000068	03/04/2024	Adquisición de 1 silla giratoria de metal	OCAM-2024-114-6-1
07	0000070	03/04/2024	Adquisición de 16 sillas giratorias de metal	OCAM-2024-114-8-1
08	0000069	03/04/2024	Adquisición de 6 silla fija de metal con brazos	OCAM-2024-114-7-1
09	0000067	03/04/2024	Adquisición de 187 sillas fija de metal	OCAM-2024-114-5-1
10	0000072	03/04/2024	Adquisición de 3 banca de asientos múltiples	OCAM-2024-114-10-1
11	0000071	03/04/2024	Adquisición de 2 Banca de asientos múltiples de metal	OCAM-2024-114-9-1
12	0000073	13/04/2024	Adquisición de 109 butacas para auditorio	OCAM-2024-114-11-1

Fuente: Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024

Elaborado por: Comisión de control

Los equipos de cómputo y mobiliario de las órdenes: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067, se encuentran en el almacén principal de la Universidad Nacional del Santa – Campus 1, asimismo, el equipo de cómputo de la orden n.° 000110, se encuentra en la oficina de la dirección de Escuela de Mecánica.

**IMÁGENES N°s 1, 2, 3, 4 Y 5
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067 – ALMACÉN CENTRAL**



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00





Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00



Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024

Por otro lado, el mobiliario de las órdenes de compra n.°s 0000068, 0000070, 0000069 (mobiliario se encontró empaquetados), de la orden n.° 0000071 (mobiliario se encontró empaquetados) y de la orden n.° 0000072 se encontraron en la sala de docentes de la Escuela de Mecánica.

IMÁGENES N^{OS} 6, 7, 8, 9 Y 10
MOBILIARIOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067 – SALA DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE MECÁNICA – CAMPUS 1

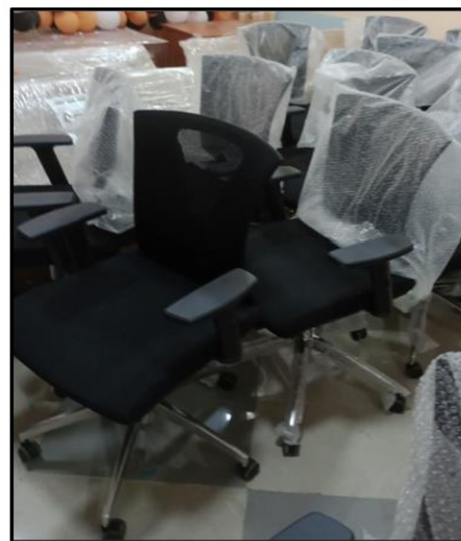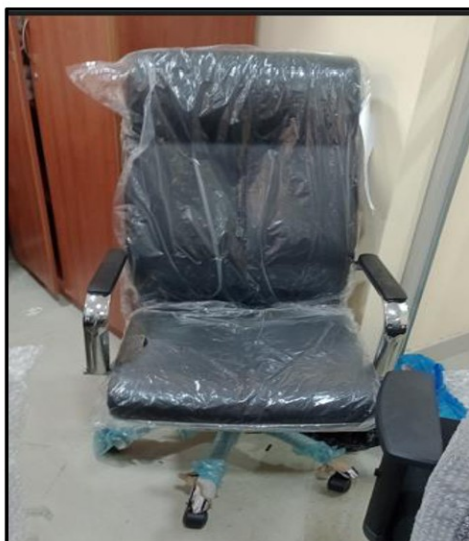

Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00



Fuente: Acta de inspección física n.° 002-2024-SCC-UNS-MEC de 9 de julio de 2024

Finalmente, los mobiliarios que forman parte de la orden de servicio 0000073, se encontraron en el auditorio de la nueva escuela de Mecánica – Campus 2, verificándose 92 butacas instaladas y 17 empaquetadas.

IMAGEN N° 11
MOBILIARIOS DE LA ORDEN DE COMPRA: 0000073 – AUDITORIO DE LA NUEVA ESCUELA DE MECÁNICA – CAMPUS 2



Fuente: Acta de inspección física n.° 002-2024-SCC-UNS-MEC de 9 de julio de 2024



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

V. SITUACIONES ADVERSAS

Al respecto, de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Entidad, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, el cual se expone a continuación:

1. LA ENTIDAD REQUIRIÓ Y COMPRÓ EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO I y II QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO INDICADAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Condición

La Entidad, el 11 de marzo de 2024 emitió las órdenes de compra n.º 0000023 y 0000024, para la adquisición de 51 monitores y CPU de tipo I, así como de 13 monitores y CPU de tipo II, tal como se observa a continuación:

IMAGEN N° 12

ORDEN DE COMPRA: 0000023 – ADQUISICIÓN DE CPUS Y MONITORES TIPO I – PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EP ING MECÁNICA

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.04.00000000

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000023

Nº Exp. SAF 531

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACION : 00014

Página: 1 de 4
Día Mes Año 11 03 2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:
RUC : 20101064515 Teléfono : 936126205 Fax : aevans@evansa.com.pe

2. CONDICIONES GENERALES
Nº Cuadro Adquisic: 000024
Tipo de Proceso : CCE
Nº Contrato :
Moneda : S/ TIC :

Concepto : ADQUISICION DE CPUS Y MONITORES TIPO I - PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EP ING MECÁNICA- CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740690370005	51	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 262222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , PRO A 60 Hz - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELS - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 35°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 175° VERTICAL/ 175° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES: POWER CABLE, 1 X HIGH CABLE	430.700000	21.965,70
140603531055	51	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 GHz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD + TECLADO MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF PLUS	4.290.661176	218.834,84

Afectación Presupuestal Van ... S/ 240.800,64

Fuente: Oficio n.º 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por RUCOBA TANANTA Emerson FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

IMAGEN N° 13
ORDEN DE COMPRA: 0000024 – ADQUISICIÓN DE CPUS Y MONITORES TIPO II – PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN EP ING MECÁNICA-

03.063

Página: 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000024

N° Exp. SIAP: 555

Día Mes Año
11 03 2024

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802 LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI: RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : sevans@evansa.com.pe	N° Cuadro Adquisitivo: 000025 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 2 -PARALA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R- ACUERDO MARCO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740690370005	13.	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA : MARCA : DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 2E2222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , FRS A 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 31°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA , 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL / 178° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR , EPEAT , TCO - CABLES ADICIONALES: POWER CORDS , A CORD / CABLE - MARCA : DELL - CODIGO UNICO DEL PRODUCTO: 31272105-71618253-R-M	430.700000	5,599.10
140690531030	13.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 GHz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD + TECLADO - MARCA : DELL - CODIGO UNICO DEL PRODUCTO: 31272105-71618253-R-M	4,439.195385	57,709.54
Afectación presupuestal				Van ... S/	63,308.64

Fuente: Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024

En tal sentido, como se observa en las órdenes de compra, se requiere que el **CPU de la computadora tipo I tenga una capacidad de almacenamiento de 512Gb** y el **CPU de la computadora tipo II tenga una capacidad de almacenamiento de 1Tb**, sin embargo, de la revisión del Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Ancash", en adelante "Estudio definitivo", con código único de inversión n.° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023, se advierte que el subnumeral 8.18 del ítem 18 de las Especificaciones de Técnicas del **Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación, considera el equipamiento con 51 computadoras de escritorio tipo I y 13 computadora de tipo II, con una capacidad de almacenamiento de 1Tb y 2 Tb, respectivamente**, tal como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

Como se puede observar, la capacidad de almacenamiento requerido en las ordenes de servicio, de las computadoras tipo I y II (512Gb y 1Tb), son menores a los requeridos en el estudio definitivo (1Tb y 2Tb), tal como se muestra a continuación:

**CUADRO N° 2
DIFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO I REQUERIDO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DE TIPO I INDICADOS EN ESTUDIO DEFINITIVO**

REQUERIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NRO. 00023-2024	EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO I – ESTUDIO DEFINITIVO
Procesador: Intel Core I7 – 13700 13 ava Gen. 16 núcleos 5.20 GHz.	Procesador: Intel Core I7-12700 12 ava Gen.12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz
Memoria RAM 16 Gb DDR5 4400 MHz	Memoria RAM 8 Gb DDR4 3200, 400MHz
Almacenamiento interno: Disco SSD de 512 Gb.	Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 Tb y 7200 rpm

Fuente: Orden de compra n.° 0000023 de 11 de marzo de 2024 y Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023

**CUADRO N° 3
DIFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO II REQUERIDO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DE TIPO I INDICADOS EN ESTUDIO DEFINITIVO**

REQUERIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NRO. 00024-2024	EQUIPO DE CÓMPUTO – ESTUDIO DEFINITIVO
Procesador: Intel Core I7 – 13700 5.20 GHz.	Procesador: Intel Core I7-12700 2.10 GHz.
Memoria RAM 16 Gb DDR5 4400 MHz	Memoria RAM 8 Gb DDR4 3200, 400MHz
Almacenamiento interno: Disco SSD de 1 Tb.	Almacenamiento: 2 Tb y 7200 rpm

Fuente: Orden de compra n.° 0000024 de 11 de marzo de 2024 y Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023

De lo expuesto, se evidencia que las órdenes de compra no observaron lo indicado en el Estudio definitivo, ya que **disminuyeron en 50% la capacidad de almacenamiento** indicado.

En ese mismo contexto, el 8 de julio de 2024, la comisión de control se apersonó al Almacén Central de la Universidad Nacional del Santa – Campus 1; y procedió a revisar los equipos de la orden de compra n.° 000023 de 11 de marzo de 2024, al respecto, se evidenció la existencia de 51 unidades de procesos y 51 monitores, cuyas características técnicas del CPU se detallan a continuación:

- Procesador: Intel Core I7 – 13700 – 13th generación
- Memoria: RAM 16 Gb DDR5 – 4400 Mhz
- Disco: 512 Gb. SSD.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro.



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00




Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

IMÁGENES N^{OS} 16, 17 Y 18
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS - TIPO I

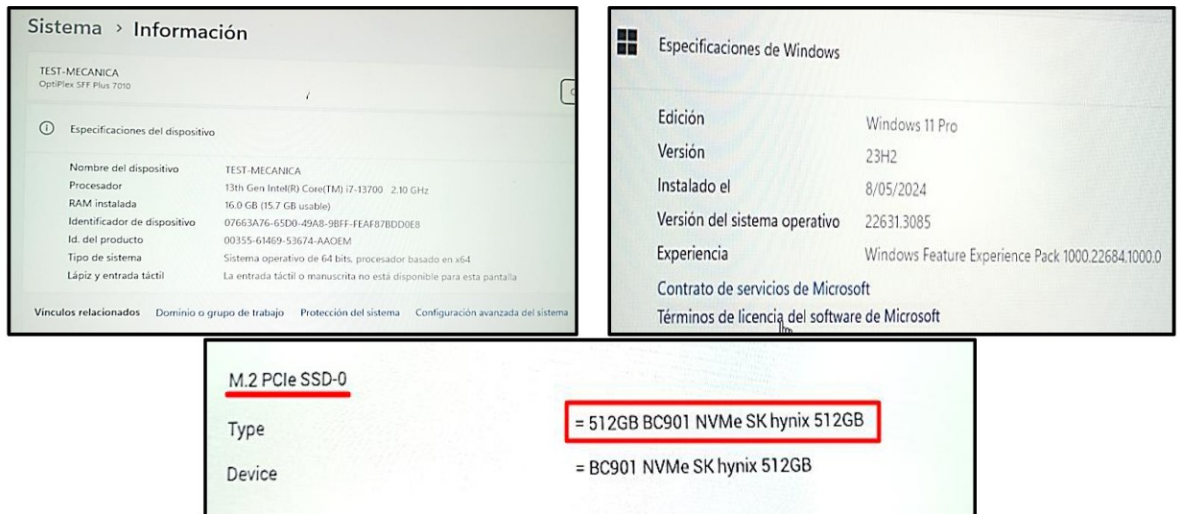


Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024

Al respecto, podemos mencionar que, si bien los equipos de cómputo recepcionados tienen mayor capacidad de procesador y memoria, no cuentan con la capacidad de almacenamiento requerido en el estudio definitivo, el cual indica una tecnología SATA y 1 Tb (1024 Gb) de capacidad, pero lo recepcionado, tiene una tecnología SSD (Solid State Drive - Unidad de estado sólido), la cual es una tecnología que ofrece un mejor rendimiento y durabilidad, pero la capacidad es de solo 512 Gb, menor a lo requerido en el estudio definitivo.

Además, se verificó los equipos de cómputo de la orden de compra n.° 000024 de 11 de marzo de 2024, la cual evidenció la existencia de 13 unidades de procesos y 13 monitores, cuyas características se detallan a continuación:

- Procesador: Intel Core I7 – 13700 – 13th generación
- Memoria: RAM 16 Gb DDR5 – 4400 Mhz
- Disco: 1 Tb. SSD.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro.

IMÁGENES N^{OS} 19 Y 20
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS - TIPO I

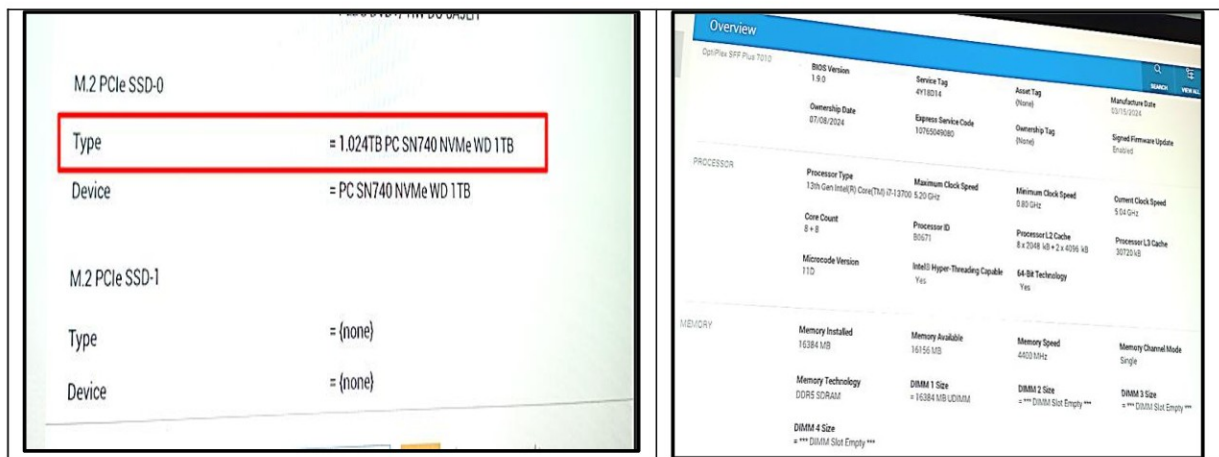

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

De igual forma, los equipos de cómputo recepcionados tienen mayor capacidad de procesador y memoria, pero con respecto a la capacidad de almacenamiento, el Estudio definitivo indica disco de 2 Tb de capacidad, pero lo recepcionado, tiene una tecnología SSD (Solid State Drive - Unidad de estado sólido), la cual es una tecnología que ofrece un mejor rendimiento y durabilidad, pero la capacidad es de solo 1Tb menor a lo requerido en el estudio definitivo.

De todo lo mencionado, se evidencia que funcionarios y/o servidores de la Entidad requirieron y compraron equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto, e incumple al artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Criterio

➤ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018 y modificatorias

“Artículo 29. Requerimiento

29.1. *Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.*

(...)

29.8. *El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

(...)

29.11. ***El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria.” (Énfasis agregado)***

➤ Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash” con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023

“8.18 ITEM N° 18: Computadoras

(...)

1) *Computadora de escritorio tipo I (I7 -12700 12 ava Gen, RAM (GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5”, teclado y mouse)*

- *Intel Core i7-12700 12 ava Gen. 12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz con frecuencia turbo, 25 MB Intel Smart Cache*

(...)

- *Memoria RAM 8 GB DDR4 3200, 400MHz.*

- *Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm.”*



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

c) Consecuencia

La situación expuesta, pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.º 4: Recepción de equipos de cómputo y mobiliario, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la comisión de control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.º 2.

IX. CONCLUSIONES:

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la recepción de equipos de cómputo y mobiliario, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
2. Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control, detalladas en el Apéndice n.º 2 del presente Informe, respecto de las cuales la Entidad no adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Hito de Control.

X. RECOMENDACIONES:

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente a la recepción de equipos de cómputo y mobiliario, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de Santa, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente, adjuntando la documentación de sustento respectiva.



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



Firmado digitalmente por
RUCOBA TANANTA Emerson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:53:07 -05:00

Nuevo Chimbote, 18 de julio de 2024.




Firmado digitalmente por GOMEZ
PEREZ Jose Wilfredo FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 11:52:56 -05:00

José Wilfredo Gomez Perez
Supervisor de Comisión
Comisión de Control



Firmado digitalmente por CHACON
AVILA Dennis Aldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 12:10:49 -05:00

Dennis Aldo Chacón Avila
Jefe de Comisión
Comisión de Control



Firmado digitalmente por RUCOBA
TANANTA Emerson FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 12:53:28 -05:00

Emerson Rucoba Tananta
Gerente Regional de Control II (e)
Gerencia Regional de Control de Ancash
Contraloría General de la República

APÉNDICE n.º 1**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

1. La Entidad requirió y compró equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto.

Nº	Documento
1	Oficio n.º 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024
2	Acta de inspección física n.º 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024
3	Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión: "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.º 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023.



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

APÉNDICE n.º 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.º 1 – Ejecución y supervisión de obra

1. Número de situaciones adversas identificadas: 5
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0

Informe de Hito de Control n.º 2 – Operación y mantenimiento de la obra

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - La Entidad no adopta acciones para solicitar la garantía de obra al contratista por defectos y vicios ocultos, posibilitando el deterioro prematuro, afectación en la funcionalidad y seguridad de la infraestructura, en perjuicio de los usuarios.
 - La Entidad no viene realizando el mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes de la escuela profesional de Ingeniería Mecánica, situación que podría ocasionar el deterioro prematuro de las instalaciones y por ende el uso de mayores costos asociados al mantenimiento preventivo.

Informe de Hito de Control n.º 3 – Estudio definitivo del equipamiento, mobiliario y capacitación

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - La Entidad requirió equipos de cómputo con tecnología desfasada para el almacenamiento interno, situación que afectaría la velocidad de transferencia, durabilidad y fiabilidad de los datos, así como, la performance de los softwares ahí instalados
 - El cálculo del costo proyecto de los equipos presenta deficiencias, debido a que, en algunos casos, se han considerado cotizaciones de equipos que no cumplen con lo requerido y en otros casos cotizaciones de equipos con mayores prestaciones a lo requerido, lo cual posibilita que no se maximice el valor de los recursos públicos involucrados



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

ANEXOS




Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO I



UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA


Estudio definitivo de equipamiento del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Ancash" - CUI 2412581


8.18. ITEM N° 18: Computadoras

Ítem	Equipo	Unidad Medida	Cantidad
1	Computadora de escritorio tipo I (i7-12700 12va Gen, RAM 8 GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5 ", teclado y mouse)	unidad	51
2	Computadora de escritorio tipo II (core i7-12700/ 16 GB DDR4/ 2 TB HDD, monitor 21.5 ", teclado y mouse)	unidad	13
3	Workstation	unidad	21
4	Estabilizador	unidad	85
5	Wokstation portátil	unidad	1
6	Laptop (i7-11800H 11ava generación/RAM 16 GB DDR4 3200/ 1TB)	unidad	45
Total			216


1) Computadora de escritorio tipo I (i7-12700 12va Gen, RAM 8 GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5 ", teclado y mouse)

- Intel® Core™ i7-12700 12va Gen. 12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz con frecuencia turbo, 25 MB Intel® Smart Cache
- Chipset: Integrado
- Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits español
- Gráficos Integrados
- Memoria RAM 8 GB DDR4 3200, 400 MHz
- Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
- Unidad Óptica No
- Teclado Sí
- Mouse Sí
- Conectividad LAN: Sí
- WLAN: Sí
- Bluetooth: Sí
- Fuente de Alimentación Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold
- Interfaces Frontal
 - (3) USB 3.2 Gen 2
 - (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C
 - (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA
- Interfaces Posterior
 - (3) USB 3.2 Gen 1
 - (2) USB 2.0
 - (1) HDMI 1.4
 - (1) Display Port 1.4
 - (1) Ethernet RJ-45
 - (1) Audio Lineout/Line-in





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ing. Rosalva Alicia Risco Ojeda
DIRECTORA E.P. ING. MECÁNICA



INGRID MARLENE MURGA
INGENIERA QUÍMICA
CIP N° 244911

152



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO II

2) Computadora de escritorio tipo II (core i7-12700/ 16 GB DDR4/ 2 TB HDD, monitor 21.5 ", teclado y mouse)

- Procesador: INTEL CORE I7-12700 2.10 GHz
- Memoria RAM: 16 GB DDR4 3200 400 MHz Disco
- Almacenamiento: 2 TB HDD 7200 RPM
- Vpro Si
- Puertos USB Frontales:
 - 4 x USB Type A
 - 2x USB 3.2 Gen 1
 - 2x USB 3.2 Gen 2
 - 1x USB-C 3.2 Gen 1
 - 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
 - 1x microphone (3.5mm)
- Puertos USB Posteriores:
 - 4 x USB Type A
 - 4x USB 2.0
 - 1x serial (9-pin)
 - 1x Ethernet (RJ-45)
 - 1x HDMI
 - 1x line-out (3.5mm)
 - 2x DisplayPort
- Unidad óptica: Si
- LAN: Si Gigabit 1 RJ45
- Sonido Integrado HD
- Puertos de Video 2 Puertos Display Port, 1 Puerto HDMI
- Tarjeta de Video Integrada
- Fuente de Poder 260W 85% eficiencia PSU
- Sistema Operativo SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL
DOWNGRADE TO WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL
- Garantía: 01 año como mínimo
- Incluye teclado, mouse y monitor



Firmado digitalmente por
GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por
CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

ORDEN DE COMPRA N° 00023-2024

05.002

Página: 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000023

N° Exp. SAF: 5-1

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACION : 00014

Día Mes Año
15 02 2024

<p>1. DATOS DEL PROVEEDOR</p> <p>Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802 LIMA/LIMA / JESUS MARIA CC: RUC : 20101084515 Teléfono : 998128206 Fax : devans@evansa.com.pe</p>	<p>2. CONDICIONES GENERALES</p> <p>N° Cuadro Adquisitivo: 000024 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ TIC :</p>
---	--

Concepto : ADQUISICION DE CPU'S Y MONITORES TIPO 1 - PARA EL PROYECTO DE INVERSION EP ING MECANICA- CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740890370005	51	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA/ MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCCION: 282222MS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , FICHA 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELS - AJUSTABILIDAD: TILT/ROTATION 4 -5° (V/H) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONDUCTIVIDAD T X MAX: 1 N-ESPELLE/PCAT 1.2, 1 X HEMI 2.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL/ 174° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES: CABLE VÍDEO, 1 X HEMI CABLE	430.700000	21.965,70
148600531055	51	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 GHz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD + TECLADO MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX T530 SFF / PLUS	4.290.891176	218.834,94

AFECTACION PRESUPUESTAL				Van ... S/	240.800,64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb - Clasi. Gasto	Monta		
0018	22.048.0010.0065.2412591.4000040	5- 18 2.6.3 2.3 1	240.800,64		

Facturar a nombre de: **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**
 Dirección: **AV. PACIFICO - URB. BUENOS AIRES 508 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH** RUC: 20148309109
 Agregarlemos en los bienes a la siguiente dirección:
URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

EMISORADO POR: MORENO MONTES, KAROL JULISSA	ORGANIZACIÓN DE: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ENTIDAD EMISORA: RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	CONFIGURADO: RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR: Fecha: Día Mes Año
--	--	---	--	---

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe suministrar y a. Factura como de la OCE otorgada.
- Este Orden de Compra es una formalidad y para responsabilidades o autorizaciones.
- Este documento es un efecto de comercio que representa el pago de acuerdo con los datos que aparecen en él.
- El Contratista/Proveedor debe diligenciar los datos de contacto que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01 (15/03/2023)

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000029

N° Exp. SAF

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

Página: 2 de 4
Día Mes Año
11 03 2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Generador: J EVANS Y ASOCIADOS SAC Dirección: AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 602 LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI: RUC: 20101064515 Teléfono: 996128205 Fax: aeavans@evanss.com.pe	N° Cuadro Adquisic: 000024 Tipo de Proceso: CCE N° Contrato: Moneda: S/ TIC:
Concepto: ADQUISICION DE CPUS Y MONITORES TIPO 1 - PARA EL PROYECTO DE INVERSION EP ING MECANICA- OLU 2412581-RES N° 316-2023-UNSR-AFUERDO MARCO.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 3HD77105-7161281502-M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700 16 NUCLEOS. 24 SUBPRODUCTOS, PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY 2.10 GHz/INTEL TURBO BOOST MAX TECHNOLOGY FREQUENCY 5.20 GHz, 30 MB DE CACHE - MEMORIA EMM 18 GB DDR5 4800 MHz PATRILLAS, CUENTA CON EXPANSION DE HASTA 128 GB RAM, CON 4 SLOTS - ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 NVME - OPCION Grafica: VIDEO INTEGRADO - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL - PUENTE DE ALIMENTACION INTELERS 200 W. POWER SUPPLY UNIT (PSU) 85% EFFICIENT, 80 PLUS BRONZE - CARTELINIDAD LAN: 2x RJ45 ETHERNET PORT - TELETROPHONE: 3x PUERTO EN REPANLA WIRED PHONE - LETRAS OPTICAS DEL SISTEMA EDUCACION - PUERTOS: FRONTALES: 1 USB 2.0 PORT 1 USB 2.0 PORT WITH 2-WAY SHARE 1 USB 3.2 GEN 2 PORT 1 USB 3.2 GEN 2 ALTERNATE PORT		240,800.64

Meta Mnemónico	Cadena Funcional	FF/RB	Clasif. Gasto	Monte S/
				240,800.64

Factura a favor de: **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**
 Dirección: **AV. PACIFICO - URB. BUENOS AIRES 500 / CHIMOTE - SANTA - ANCASH**
 Representamos a favor de los bienes a la siguiente dirección:
URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMOTE - SANTA - ANCASH

MORENO MORETES, NAYEN JULISSA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. ALMACENES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/
-------------------------------------	------------------------------	--	------------------------	-----------------------

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura el tipo de la O.C. adjunta.
- Este Orden se trata con las firmas y sellos de planillones, o autorizados.
- No responsabilizamos el derecho de devolución ni el reembolso que nos sea de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contralora (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de perder inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-114-1-1

EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148309109
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA(000114)

DATOS DEL PROMOTOR

RUC : 20101064515
Razón Social : J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Domicilio Fiscal : Avenida República de Chile 478 OX 802, Jesús María
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : EVANS GUEVARA, EVANS GUEVARA, JOHN
Correo Electrónico : sevens@evansa.com.pe
Teléfono fijo : (511) 719-7515 Arx.
Teléfono móvil : 998128205

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : SEGUNDO GUTIERREZ INFANTE MANUEL COSME TERRONES
D.N.I. : 26644159 18041523
Teléfono : (51) 04331044 / 979-334-531 (51) 04331044 / 966-264-439
Cargo : JEFE DE ALMACEN ASISTENTE DE ALMACEN
Correo electrónico : GUTIS60@HOTMAIL.COM MANUEL.TERRONES@HOTMAILES

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0377-0100038979
CCI : 01137700010003897999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización :
Estado : PUBLICADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega Única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 531
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 18/03/2024 al 02/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. UNIVERSITARIAS IN URB BELLAVISTA
Ubigeo : NUEVO CHIMBOTE / SANTA / ANCASH
Referencia : COSTADO DE SENATI
Latitud / Longitud :
Código Postal : 51

No	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700 RAM 16 GB DDR5 4400 MHz; ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD LAN: SI WLAN: NO USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMÁTICA: NO G. P. 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL OPTIPLEX 7010 SFF PLUS 3HDT710S-71612S2SS3-H	DELL	3HDT710S-71612S2SS3-H	51	3,636.34	33,381.00	218,834.94
2	MONITOR : PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920X1080 PVELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDMI: SI G. P. 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL DELL E2222H53 2E2222H53	DELL	2E2222H53	51	365.00	3,360.70	21,965.70

Monitor + CPU : Tipo I Mecánica.

IMPORTE TOTAL (PEN)

240,800.64



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

ORDEN DE COMPRA N° 00024-2024

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.NCMN

03-063

Página: 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000024

N° Exp. SWF: 52-

Dis	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC	N° Cuadro Adquisitivo: 000025
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802	Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / JESUS MORA CCI:	N° Contrato :
RUC : 20101064515 Teléfono : 998126205 Fax : ee.vans@evansa.com.pe	Moneda : S/ T/I :
Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 3 -PARA LA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412501-RE'S N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO	

Codigo	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740600370005	13	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 2E2222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , FMS A 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 21°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL / 117° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES: -PARAB CABLE / 1 X HDMI CABLE	430.700000	5.599.10
140600521030	13	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 GHz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD + TECLADO - MARCA: DELL - CODIGO UNICO DEL PRODUCTO: A077102-7161853-N-M	4.439.195385	57.700.54

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/
Metal Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monta	S/	
0018	22.040.0010.0066.2412581.4000040	5 - 18	2.6.3.2.3.1		63.308.64	63,308.64

Factura a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Dirección: AV. PACIFICO - URB. BUENOS AIRES 508 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC: 20146309109
Agencias donde se han o se van a realizar los bienes a la siguiente dirección:
URB. RELAMAR SAN - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ELABORADO POR: MORENO MONTES, KARIN JULISSA	REVISADO POR: [Firma]	CONFIRMADO POR: [Firma]	CUENTAS A PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe entregar una factura válida de la DGE aprobada.
- El proveedor es responsable de cumplir con los requisitos de garantía y de entrega establecidos en el presente documento para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.NCMA

Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0000024

N° Ex. SWF

Página: 2 de 4

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

Día Mes Año
11 03 2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señores): J EVANS Y ASOCIADOS SAC Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802 LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI: RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : evans@evansa.com.pe	N° Cuadro Adquisitivo: 000029 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 2 -PARA LA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412581-RES N° 316-2023-LINS-R-ACUERDO MARCO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Unitario S/	Total S/
			-- MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF PLUS -- ESPECIFICACIONES TECNICAS: -- PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700I 16 NUCLEOS, 24 SUBPROCESOS PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY 2.10 GHz/INTEL TURBO MAX TECHNOLOGY FREQUENCY 5.20 GHz, 30 MB DE CACHE) -- CHIPSET: INTEL Q670 -- VPRO: SOPORTA VPRO. -- MEMORIA RAM: 16 GB DDR5 4400 MHz INSTALADO, CUENTA CON EXPANSION DE HASTA 128GB RAM, CON 4 SLOTS. -- ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2 NVMe -- Opcion Grafica: INTEGRADO INTEL GRAPHICS -- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL -- FUENTE DE ALIMENTACION: INTERNA 200W, POWER SUPPLY UNIT (PSU), 85% EFFICIENT, 80 PLUS BROWN -- CONECTIVIDAD LAN: 2x 2.5G ETHERNET PORT -- CONECTIVIDAD WAN/ALTERNATIVA: 2x WIFI 6E, 2x BT 5.2 -- TECLADO/MOUSE: 2x TECLADO EN ESPAÑOL WIRELESS MOUSE -- LECTOR OPTICO: 2x INTERNO, DVD+-RW -- PUERTOS: FRONTALS 1 USB 2.0 PORT		

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/RB	Clasif. Gasto	Monto S/	Van ... S/
					63,308.64

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
 Dirección: AV. PACÍFICO - URB. BUENOS AIRES 598 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC: 20148309109
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

MORENO MONTES, KARIN JULISSA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS Y PAGAR Fecha Día Mes Año
--	---	------------------------	---

NOTA IMPORTANTE:



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-114-2-1

EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148309109
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA[000114]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20101064515
Razón Social : J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Domicilio Fiscal : Avenida Republica de Chile 478 Of. 602, Jesús María
Ubigeo : JESÚS MARÍA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : EVANS GUEVARA EVANS GUEVARA JOHN
Correo Electrónico : evans@jevans.com.pe
Teléfono fijo : (511) 719-7515 Anx.
Teléfono móvil : 998128205

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : SEGUNDO GUTIERREZ INFANTE MANUEL COSME TERRONES BARRANTES
D.N.I. : 26644159 19041523
Teléfono : (51) 04331044 / 979-334-531 (51) 04331044 / 986-294-439
Cargo : JEFE DE ALMACEN ASISTENTE DE ALMACEN
Correo electrónico : GUTIESO@HOTMAIL.COM MANUEL.TERRONESB@HOTMAILS

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0377-0100038979
CCI : 01137700010003897999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : Estado : PUBLICADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 532
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 18/03/2024 al 02/05/2024
Estrategia de compra : Compra directa

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. UNIVERSITARIA SIN URB BELLAVR
Ubigeo : NUEVO CHIMBOTE / SANTA / ANCASH
Referencia : COSTADO DE SENATI
Latitud / Longitud :
Código Postal : 51

Nro	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DELL	3HD710S-7161SS3-HW	13	3,762.03	8,803.15	57,709.54
COMPUTADORA DE ESCRITORIO - PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700 RAM: 16 GB DDR5 4400 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB M2 SSD NVMe LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL OPTIFLEX 7010 SFF PLUS 3HD710S-7161SS3-HW						
2	DELL	2E222HS3	13	365.00	854.10	5,599.10
MONITOR: PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920X1080 PVELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDMI: SI G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL DELL E2222HS 2E222HS3						
					IMPORTE TOTAL (PEN)	63,308.64

Monitor + cpu: Tipo II -
Mecánica.



Firmado digitalmente por GOMEZ PEREZ Jose Wilfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 11:52:17 -05:00



Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2024 12:09:37 -05:00



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/GRAN-02-078

DOCUMENTO : OFICIO N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

EMISOR : DENNIS ALDO CHACON AVILA - JEFE DE COMISION - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : AMERICA ODAR ROSARIO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148309109

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

N° FOLIOS : 26

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe_n-19748-2024-CG-GRAN-SCC
2. Oficio-n-001626-2024-CG-GRAN





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

EMISOR : DENNIS ALDO CHACON AVILA - JEFE DE COMISION - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : AMERICA ODAR ROSARIO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148309109**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/GRAN-02-078
2. Informe_n-19748-2024-CG-GRAN-SCC
3. Oficio-n-001626-2024-CG-GRAN

NOTIFICADOR : DENNIS ALDO CHACON AVILA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho*

Huaraz, 18 de Julio de 2024

OFICIO N° 001626-2024-CG/GRAN

Señora:

America Odar Rosario

Rectora

Universidad Nacional del Santa

Av. Pacífico N° 508

Ancash/Santa/Nuevo Chimbote

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "*Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash*", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 19748-2024-CG/GRAN-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Emerson Rucoba Tananta

Gerente Regional de Control II Gerencia Regional
de Control de Ancash
Contraloría General de la República

(ERT/dca)

Nro. Emisión: 08703 (L425 - 2024) Elab:(U18856 - L425)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DMWBJLO**

