CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH

"EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 9 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024

TOMO I DE I

NUEVO CHIMBOTE, 18 DE JULIO DE 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

"EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS

ÍNDICE

N° Pág.

I. ORIGEN.....3

II. OBJETIVOS.....3

III. ALCANCE.....3

IV. NFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL.....3

V. SITUACIONES ADVERSAS.....7

1. La Entidad requirió y compró equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto. 7

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.....13

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 13

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES.....13

IX. CONCLUSIONES.....13

X. .RECOMENDACIONES.....13

APÉNDICES.....15

ANEXOS.....17

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

"EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL N° 4: RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ancash, mediante Oficio n.° 576-2024-CG/GRAN de 15 de marzo de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L425-2024-078, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer que la fase de ejecución del proyecto cumpla con los objetivos y metas establecidas dentro del plazo y costos de acuerdo a los procedimientos de la norma vigente.

2.2 Objetivo específico

Determinar si el requerimiento y compra de los equipos de cómputo y mobiliario para el proyecto: "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash", es conforme a lo establecido en la normativa aplicable y al Estudio Definitivo al Equipamiento, Mobiliario y Capacitación

III. ALCANCE

El Servicio de Control Concurrente se desarrolló a la recepción de equipos informáticos y mobiliarios del proyecto: "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash" en adelante la "Proyecto", el cual se encuentra a cargo de la Universidad Nacional del Santa, en adelante la "Entidad", y que ha sido ejecutada del 9 al 15 de julio de 2024, en la Oficina de Enlace de la Gerencia Regional de Control de Ancash en Chimbote, ubicado en la Av. Argentina Mz. F2 lote 10 – Urb. El Pacífico – distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

La Entidad, continuando con la ejecución del Proyecto, a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, adquirió las computadoras y mobiliario que se detalla a continuación:

CUADRO N° 1
RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Nro.	ORDEN DE COMPRA – GUÍA DE INTERNAMIENTO	FECHA	DETALLE	ORDEN DE COMPRA – PERÚ COMPRAS
01	0000023	11/03/2024	Adquisición de 51 CPU y 51 monitores de tipo 1	OCAM-2024-114-1-1
02	0000024	11/03/2024	Adquisición de 13 CPU y 13 monitores de tipo 2	OCAM-2024-114-2-1
03	0000099	10/03/2024	Adquisición de 21 monitores y 21 estaciones de trabajo	OCAM-2024-114-21-1
04	0000025	13/04/2024	Adquisición de 45 computadoras portátil	OCAM-2024-114-3-1
05	0000110	03/04/2024	Adquisición de 1 estación de trabajo portátil	OCAM-2024-114-22-1
06	0000068	03/04/2024	Adquisición de 1 silla giratoria de metal	OCAM-2024-114-6-1
07	0000070	03/04/2024	Adquisición de 16 sillas giratorias de metal	OCAM-2024-114-8-1
08	0000069	03/04/2024	Adquisición de 6 silla fija de metal con brazos	OCAM-2024-114-7-1
09	0000067	03/04/2024	Adquisición de 187 sillas fija de metal	OCAM-2024-114-5-1
10	0000072	03/04/2024	Adquisición de 3 banca de asientos múltiples	OCAM-2024-114-10-1
11	0000071	03/04/2024	Adquisición de 2 Banca de asientos múltiples de metal	OCAM-2024-114-9-1
12	0000073	13/04/2024	Adquisición de 109 butacas para auditorio	OCAM-2024-114-11-1

Fuente: Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024
Elaborado por: Comisión de control

Los equipos de cómputo y mobiliario de las órdenes: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067, se encuentran en el almacén principal de la Universidad Nacional del Santa – Campus 1, asimismo, el equipo de cómputo de la orden n.° 000110, se encuentra en la oficina de la dirección de Escuela de Mecánica.

IMÁGENES N^{OS} 1, 2, 3, 4 Y 5
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067 – ALMACÉN CENTRAL

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024

Por otro lado, el mobiliario de las órdenes de compran n.°s 0000068, 0000070, 0000069 (mobiliario se encontró empaquetados), de la orden n.° 0000071 (mobiliario se encontró empaquetados) y de la orden n.° 0000072 se encontraron en la sala de docentes de la Escuela de Mecánica.

IMÁGENES NOS 6, 7, 8, 9 Y 10
MOBILIARIOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA: 0000023, 0000024, 0000099, 0000025 y 0000067 – SALA DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE MECÁNICA – CAMPUS 1

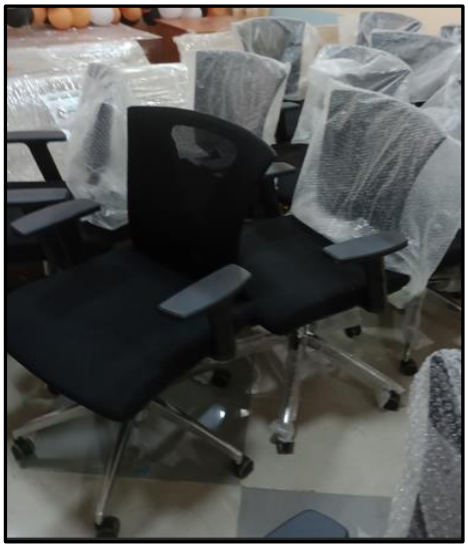

Fuente: Acta de inspección física n.° 002-2024-SCC-UNS-MEC de 9 de julio de 2024

Finalmente, los mobiliarios que forman parte de la orden de servicio 0000073, se encontraron en el auditorio de la nueva escuela de Mecánica – Campus 2, verificándose 92 butacas instaladas y 17 empaquetadas.

IMAGEN N° 11
MOBILIARIOS DE LA ORDEN DE COMPRA: 0000073 – AUDITORIO DE LA NUEVA ESCUELA DE MECÁNICA – CAMPUS 2

Fuente: Acta de inspección física n.° 002-2024-SCC-UNS-MEC de 9 de julio de 2024

V. SITUACIONES ADVERSAS

Al respecto, de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Entidad, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, el cual se expone a continuación:

1. LA ENTIDAD REQUIRIÓ Y COMPRÓ EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO I y II QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO INDICADAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Condición

La Entidad, el 11 de marzo de 2024 emitió las órdenes de compra n.°s 0000023 y 0000024, para la adquisición de 51 monitores y CPU de tipo I, así como de 13 monitores y CPU de tipo II, tal como se observa a continuación:

IMAGEN N° 12
ORDEN DE COMPRA: 0000023 – ADQUISICIÓN DE CPUS Y MONITORES TIPO I – PARA EL PROYECTO DE INVESRIÓN EP ING MECÁNICA

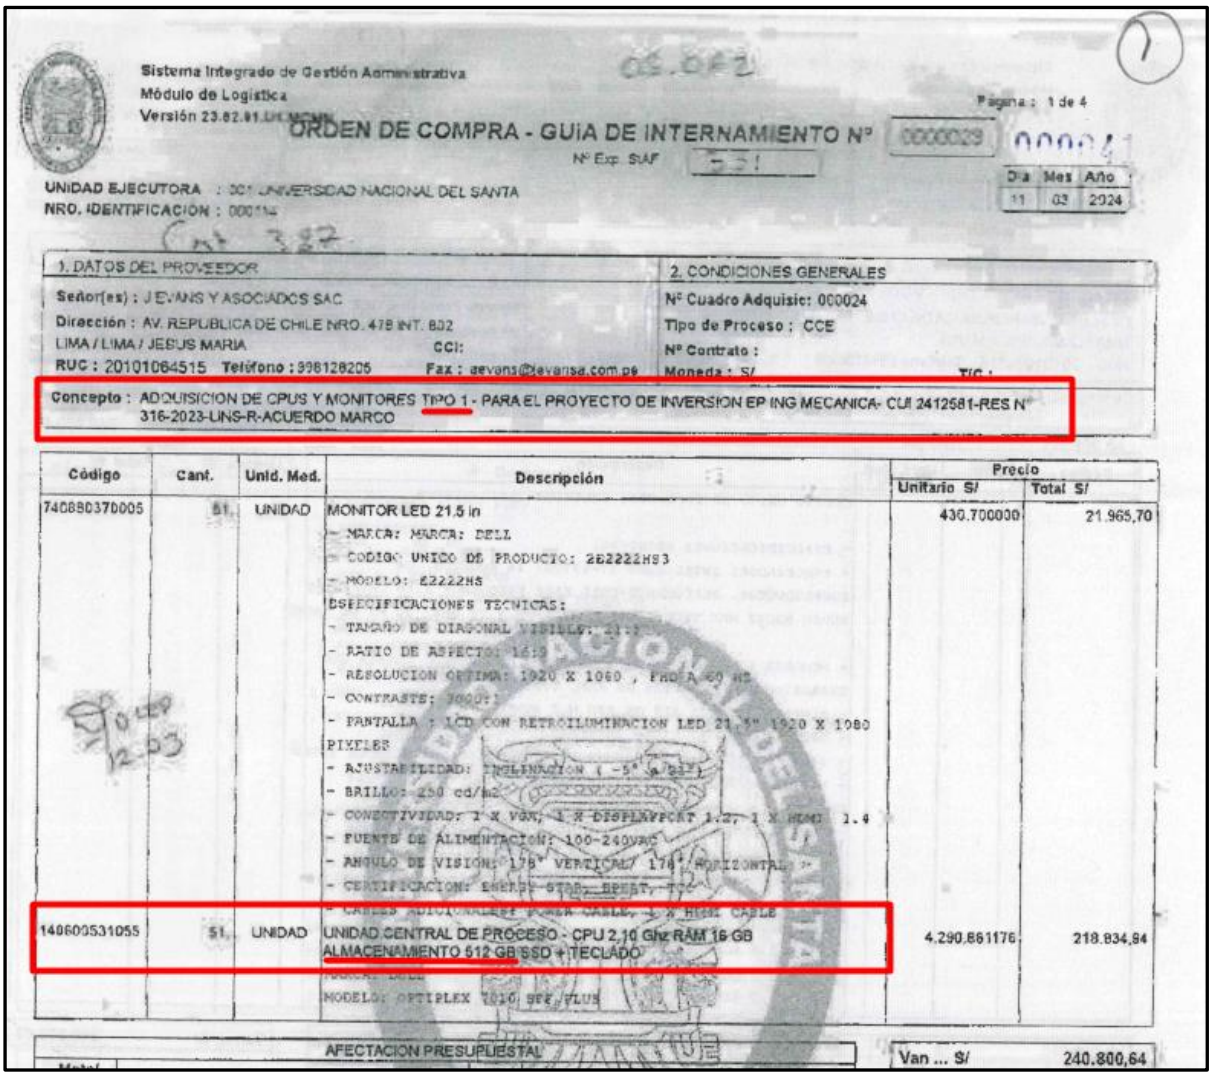

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.DEMONI

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000023

Página : 1 de 4

N° Exp. SIAF

Día	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:
RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : aevans@jevansa.com.pe

2. CONDICIONES GENERALES
N° Cuadro Adquisic: 000024
Tipo de Proceso : CCE
N° Contrato :
Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE CPUS Y MONITORES TIPO 1 - PARA EL PROYECTO DE INVERSION EP ING MECANICA- CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
740880370005	51	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 2E2222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5 - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , HASTA 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 21°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL/ 178° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES POWER CABLE, 1 X HDMI CABLE	430.700000	21.965,70
140600531055	51	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD + TECLADO MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF /PLUS	4.290.861176	218.834,94
			AFECTACION PRESUPUESTAL	Van ... S/	240.800,64

Fuente: Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024

IMAGEN N° 13
ORDEN DE COMPRA: 0000024 – ADQUISICIÓN DE CPUS Y MONITORES TIPO II – PARA EL PROYECTO DE INVESRIÓN EP ING MECÁNICA-

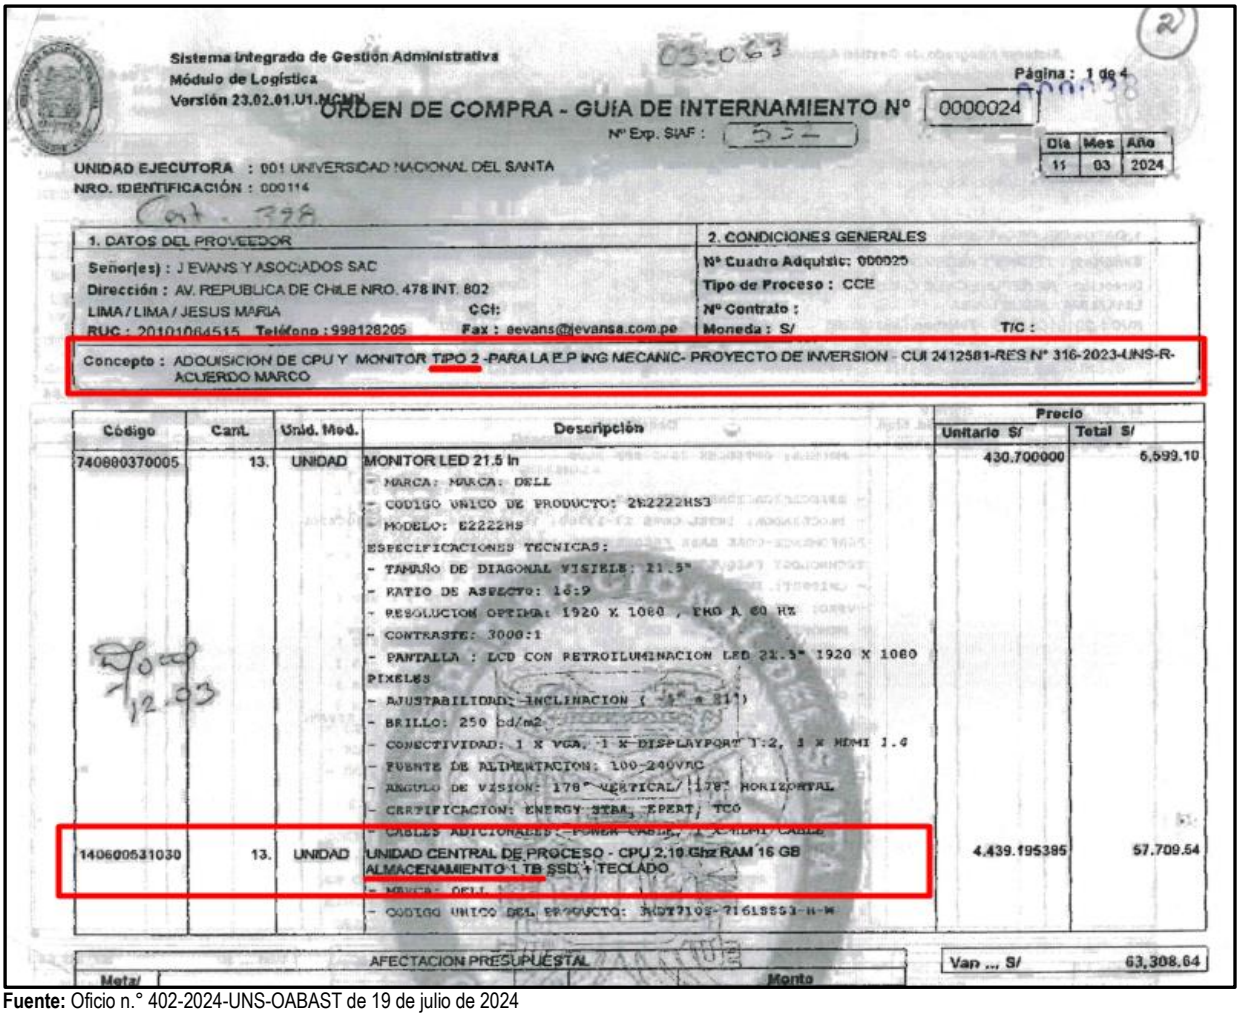

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.MGNN

Página : 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000024

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC	N° Cuadro Adquisic: 000025
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802	Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:	N° Contrato :
RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : aevans@jevansa.com.pe	Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 2 -PARA LA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
740880370005	13.	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 2E2222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , FHD A 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 21°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL/ 178° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES: POWER CABLE, 1 X HDMI CABLE	430.700000	5,599.10
140600531030	13.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD + TECLADO - MARCA: DELL - CODIGO UNICO DEL PRODUCTO: 3NDT7103-7161SSS1-H-M	4,439.195385	57,709.54

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/	Monto

Van ... S/ 63,308.64

Fuente: Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024

En tal sentido, como se observa en las órdenes de compra, se requiere que el **CPU de la computadora tipo I tenga una capacidad de almacenamiento de 512Gb y el CPU de la computadora tipo II tenga una capacidad de almacenamiento de 1Tb**, sin embargo, de la revisión del Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash", en adelante "Estudio definitivo", con código único de inversión n.° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023, se advierte que el subnumeral 8.18 del ítem 18 de las Especificaciones de Técnicas del **Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación, considera el equipamiento con 51 computadoras de escritorio tipo I y 13 computadora de tipo II, con una capacidad de almacenamiento de 1Tb y 2 Tb, respectivamente**, tal como se muestra a continuación:

IMAGEN N° 14
NUMERAL 8.18 DEL ITEM N° 18 – COMPUTADORAS TIPO I

1) **Computadora de escritorio tipo I (i7-12700 12va Gen, RAM 8 GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5 ", teclado y mouse)**

- Intel® Core™ i7-12700 12va Gen. 12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz con frecuencia turbo, 25 MB Intel® Smart Cache
- Chipset: Integrado
- Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits español
- Gráficos Integrados
- Memoria RAM 8 GB DDR4 3200, 400 MHz
- Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
- Unidad Optica No
- Teclado Sí
- Mouse Sí
- Conectividad LAN: Sí
- WLAN: Sí
- Bluetooth: Sí
- Fuente de Alimentación Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold
- Interfaces Frontal
  - (3) USB 3.2 Gen 2
  - (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C
  - (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA
- Interfaces Posterior
  - (3) USB 3.2 Gen 1
  - (2) USB 2.0
  - (1) HDMI 1.4
  - (1) Display Port 1.4
  - (1) Ethernet RJ-45
  - (1) Audio Lineout/Line-in

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA FACULTAD DE INGENIERÍA
Ing. Rubén Alberto Risco Ojeda
DIRECTOR E.P. ING. MECANICA

BUSTAMANTE BUSTAMANTE ANABELA MAVALIN
INGENIERA QUIMICO
CIP Nº 244911

Fuente: Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash", con código único de inversión n.° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023.

IMAGEN N° 15
NUMERAL 8.18 DEL ITEM N° 18 – COMPUTADORAS TIPO II

2) **Computadora de escritorio tipo II (core i7-12700/ 16 GB DDR4/ 2 TB HDD, monitor 21.5 ", teclado y mouse)**

- Procesador: INTEL CORE I7-12700 2.10 GHz
- Memoria RAM: 16 GB DDR4 3200 400 MHz Disco
- Almacenamiento: 2 TB HDD 7200 RPM
- Vpro Si
- Puertos USB Frontales:
  - 4 x USB Type A
  - 2x USB 3.2 Gen 1
  - 2x USB 3.2 Gen 2
  - 1x USB-C 3.2 Gen 1
  - 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
  - 1x microphone (3.5mm)
- Puertos USB Posteriores:
  - 4 x USB Type A
  - 4x USB 2.0
  - 1x serial (9-pin)
  - 1x Ethernet (RJ-45)
  - 1x HDMI
  - 1x line-out (3.5mm)
  - 2xDisplayPort
- Unidad óptica: Si
- LAN: SI Gigabit 1 RJ45
- Sonido Integrado HD
- Puertos de Video 2 Puertos Display Port, 1 Puerto HDMI
- Tarjeta de Video Integrada
- Fuente de Poder 260W 85% eficiencia PSU
- Sistema Operativo SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL DOWNGRADE TO WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL
- Garantía: 01 año como mínimo
- **Incluye teclado, mouse y monitor**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA FACULTAD DE INGENIERÍA
Ing. Rubén Alberto Risco Ojeda
DIRECTOR E.P. ING. MECANICA

BUSTAMANTE BUSTAMANTE ANABELA MAVALIN
INGENIERA QUIMICO
CIP Nº 244911

Fuente: Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash", con código único de inversión n.° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023.

Como se puede observar, la capacidad de almacenamiento requerido en las ordenes de servicio, de las computadoras tipo I y II (512Gb y 1Tb), son menores a los requeridos en el estudio definitivo (1Tb y 2Tb), tal como se muestra a continuación:

CUADRO N° 2
DIFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO I REQUERIDO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DE TIPO I INDICADOS EN ESTUDIO DEFINITIVO

REQUERIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NRO. 00023-2024	EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO I – ESTUDIO DEFINITIVO
Procesador: Intel Core I7 – 13700 13 ava Gen. 16 núcleos 5.20 GHz.	Procesador: Intel Core I7-12700 12 ava Gen.12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz
Memoria RAM 16 Gb DDR5 4400 MHz	Memoria RAM 8 Gb DDR4 3200, 400MHz
Almacenamiento interno: Disco SSD de 512 Gb.	**Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 Tb y 7200 rpm**

Fuente: Orden de compra n.° 0000023 de 11 de marzo de 2024 y Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023

CUADRO N° 3
DIFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO II REQUERIDO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DE TIPO I INDICADOS EN ESTUDIO DEFINITIVO

REQUERIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NRO. 00024-2024	EQUIPO DE CÓMPUTO – ESTUDIO DEFINITIVO
Procesador: Intel Core I7 – 13700 5.20 GHz.	Procesador: Intel Core I7-12700 2.10 GHz.
Memoria RAM 16 Gb DDR5 4400 MHz	Memoria RAM 8 Gb DDR4 3200, 400MHz
Almacenamiento interno: Disco SSD de 1 Tb.	**Almacenamiento: 2 Tb y 7200 rpm**

Fuente: Orden de compra n.° 0000024 de 11 de marzo de 2024 y Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023

De lo expuesto, se evidencia que las órdenes de compra no observaron lo indicado en el Estudio definitivo, ya que **disminuyeron en 50% la capacidad de almacenamiento** indicado.

En ese mismo contexto, el 8 de julio de 2024, la comisión de control se apersonó al Almacén Central de la Universidad Nacional del Santa – Campus 1; y procedió a revisar los equipos de la orden de compra n.° 000023 de 11 de marzo de 2024, al respecto, se evidenció la existencia de 51 unidades de procesos y 51 monitores, cuyas características técnicas del CPU se detallan a continuación:

- Procesador: Intel Core I7 – 13700 – 13th generación
- Memoria: RAM 16 Gb DDR5 – 4400 Mhz
- Disco: 512 Gb. SSD.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro.

IMÁGENES NOS 16, 17 Y 18
ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS - TIPO I

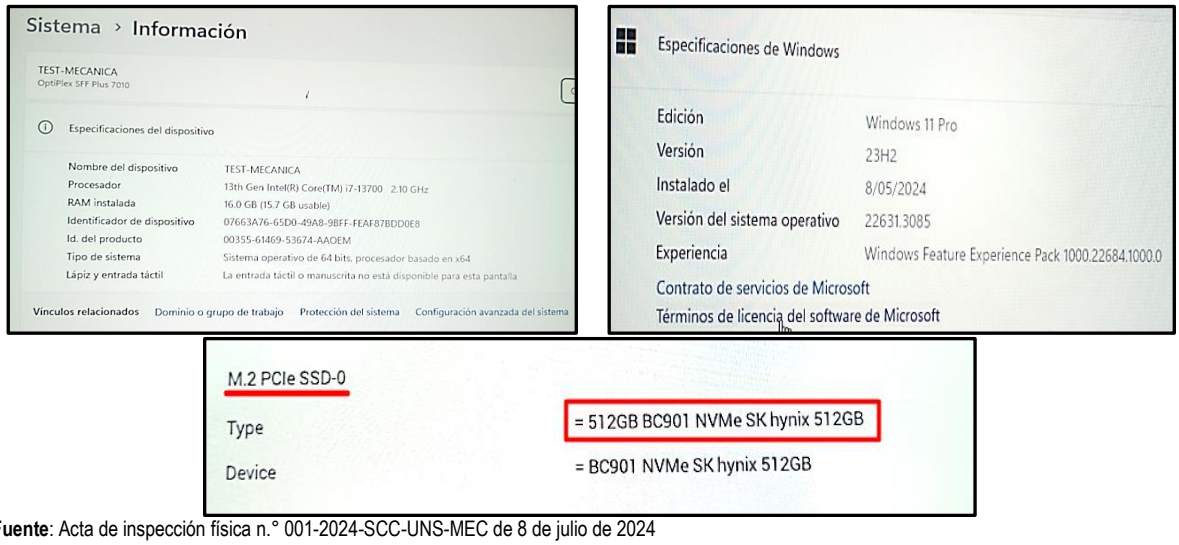

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024

Al respecto, podemos mencionar que, si bien los equipos de cómputo recepcionados tienen mayor capacidad de procesador y memoria, no cuentan con la capacidad de almacenamiento requerido en el estudio definitivo, el cual indica una tecnología SATA y 1 Tb (1024 Gb) de capacidad, pero lo recepcionado, tiene una tecnología SSD (Solid State Drive - Unidad de estado sólido), la cual es una tecnología que ofrece un mejor rendimiento y durabilidad, pero la capacidad es de solo 512 Gb, menor a lo requerido en el estudio definitivo.

Además, se verificó los equipos de cómputo de la orden de compra n.° 000024 de 11 de marzo de 2024, la cual evidenció la existencia de 13 unidades de procesos y 13 monitores, cuyas características se detallan a continuación:

- Procesador: Intel Core I7 – 13700 – 13th generación
- Memoria: RAM 16 Gb DDR5 – 4400 Mhz
- Disco: 1 Tb. SSD.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro.

IMÁGENES NOS 19 Y 20
ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS - TIPO I

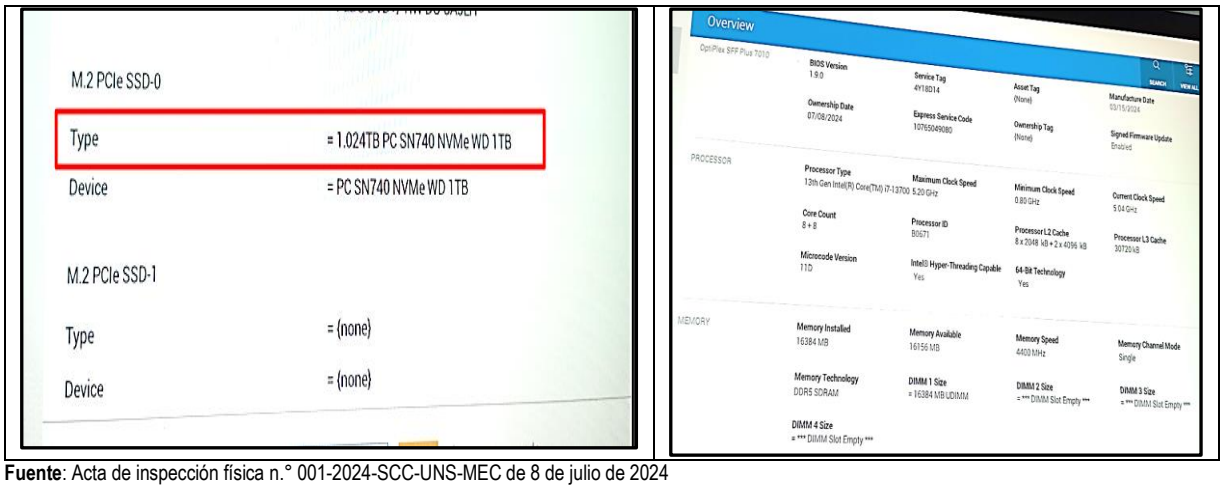

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024

De igual forma, los equipos de cómputo recepcionados tienen mayor capacidad de procesador y memoria, pero con respecto a la capacidad de almacenamiento, el Estudio definitivo indica disco de 2 Tb de capacidad, pero lo recepcionado, tiene una tecnología SSD (Solid State Drive - Unidad de estado sólido), la cual es una tecnología que ofrece un mejor rendimiento y durabilidad, pero la capacidad es de solo 1Tb menor a lo requerido en el estudio definitivo.

De todo lo mencionado, se evidencia que funcionarios y/o servidores de la Entidad requirieron y compraron equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto, e incumple al artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Criterio

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018 y modificatorias**

"Artículo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

(…)

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

(…)

*29.11. **El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra,** así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria." (Énfasis agregado)*

- **Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión n° 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023**

"8.18 ITEM N° 18: Computadoras

(…)

1) Computadora de escritorio tipo I (I7 -12700 12 ava Gen, RAM (GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5", teclado y mouse)

- *Intel Core i7-12700 12 ava Gen. 12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz con frecuencia turbo, 25 MB Intel Smart Cache*
  (…)
- *Memoria RAM 8 GB DDR4 3200, 400MHz.*
- *Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm."*

c) Consecuencia

La situación expuesta, pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 4: Recepción de equipos de cómputo y mobiliario, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la comisión de control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

IX. CONCLUSIONES:

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la recepción de equipos de cómputo y mobiliario, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
2. Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control, detalladas en el Apéndice n.° 2 del presente Informe, respecto de las cuales la Entidad no adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Hito de Control.

X. RECOMENDACIONES:

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente a la recepción de equipos de cómputo y mobiliario, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de Santa, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Nuevo Chimbote, 18 de julio de 2024.

José Wilfredo Gomez Perez
Supervisor de Comisión
Comisión de Control

Dennis Aldo Chacón Avila
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Emerson Rucoba Tananta
Gerente Regional de Control II (e)
Gerencia Regional de Control de Ancash
Contraloría General de la República

APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. La Entidad requirió y compró equipos de cómputo de tipo I y II que no cumplen con las características técnicas de almacenamiento indicadas en el estudio definitivo, situación que pone en riesgo las metas y objetivos del proyecto.

N°	Documento
1	Oficio n.° 402-2024-UNS-OABAST de 19 de julio de 2024
2	Acta de inspección física n.° 001-2024-SCC-UNS-MEC de 8 de julio de 2024
3	Estudio definitivo de equipamiento, mobiliario y capacitación enmarcados en la ejecución del componente 2: equipamiento y mobiliario, y componente 3: capacitación del proyecto de inversión: "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote – provincia del Santa – departamento de Áncash" con código único de inversión 2412581, aprobado mediante Resolución Rectoral n.° 316-2023-UNS-R de 6 de julio de 2023.

APÉNDICE n.° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 1 – Ejecución y supervisión de obra

1. Número de situaciones adversas identificadas: 5
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0

Informe de Hito de Control n.° 2 – Operación y mantenimiento de la obra

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
   - La Entidad no adopta acciones para solicitar la garantía de obra al contratista por defectos y vicios ocultos, posibilitando el deterioro prematuro, afectación en la funcionalidad y seguridad de la infraestructura, en perjuicio de los usuarios.
   - La Entidad no viene realizando el mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes de la escuela profesional de Ingeniería Mecánica, situación que podría ocasionar el deterioro prematuro de las instalaciones y por ende el uso de mayores costos asociados al mantenimiento preventivo.

Informe de Hito de Control n.° 3 – Estudio definitivo del equipamiento, mobiliario y capacitación

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
   - La Entidad requirió equipos de cómputo con tecnología desfasada para el almacenamiento interno, situación que afectaría la velocidad de transferencia, durabilidad y fiabilidad de los datos, así como, la performance de los softwares ahí instalados
   - El cálculo del costo proyecto de los equipos presenta deficiencias, debido a que, en algunos casos, se han considerado cotizaciones de equipos que no cumplen con lo requerido y en otros casos cotizaciones de equipos con mayores prestaciones a lo requerido, lo cual posibilita que no se maximice el valor de los recursos públicos involucrados

ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO I

8.18. ITEM N° 18: Computadoras

Ítem	Equipo	Unidad Medida	Cantidad
1	Computadora de escritorio tipo I (i7-12700 12va Gen, RAM 8 GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5 ", teclado y mouse)	unidad	51
2	Computadora de escritorio tipo II (core i7-12700/ 16 GB DDR4/ 2 TB HDD, monitor 21.5 ", teclado y mouse)	unidad	13
3	Workstation	unidad	21
4	Estabilizador	unidad	85
5	Wokstation portátil	unidad	1
6	Laptop (i7-11800H 11ava generación/RAM 16 GB DDR4 3200/ 1TB)	unidad	45
	Total		216

1) Computadora de escritorio tipo I (i7-12700 12va Gen, RAM 8 GB DDR4 3200, 1 TB y 7200 rpm, monitor 21.5 ", teclado y mouse)

- Intel® Core™ i7-12700 12va Gen. 12 núcleos 20 hilos 2.10 GHz hasta 4.90 GHz con frecuencia turbo, 25 MB Intel® Smart Cache
- Chipset: Integrado
- Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits español
- Gráficos Integrados
- Memoria RAM 8 GB DDR4 3200, 400 MHz
- Almacenamiento interno: Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
- Unidad Óptica No
- Teclado Sí
- Mouse Sí
- Conectividad LAN: Sí
- WLAN: Sí
- Bluetooth: Sí
- Fuente de Alimentación Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold
- Interfaces Frontal
  - (3) USB 3.2 Gen 2
  - (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C
  - (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA
- Interfaces Posterior
  - (3) USB 3.2 Gen 1
  - (2) USB 2.0
  - (1) HDMI 1.4
  - (1) Display Port 1.4
  - (1) Ethernet RJ-45
  - (1) Audio Lineout/Line-in

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERIA
Ing. Raúl Alberto Rivas Ogata
DIRECTOR E.P. ING. MECANICA

ALISA ANY ALCANTARA MARIA DE MELO
INGENIERA QUIMICO
CIP N° 244911

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TIPO II

2) Computadora de escritorio tipo II (core i7-12700/ 16 GB DDR4/ 2 TB HDD, monitor 21.5 ", teclado y mouse)

- Procesador: INTEL CORE I7-12700 2.10 GHz
- Memoria RAM: 16 GB DDR4 3200 400 MHz Disco
- Almacenamiento: 2 TB HDD 7200 RPM
- Vpro Si
- Puertos USB Frontales:
  - 4 x USB Type A
  - 2x USB 3.2 Gen 1
  - 2x USB 3.2 Gen 2
  - 1x USB-C 3.2 Gen 1
  - 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
  - 1x microphone (3.5mm)
- Puertos USB Posteriores:
  - 4 x USB Type A
  - 4x USB 2.0
  - 1x serial (9-pin)
  - 1x Ethernet (RJ-45)
  - 1x HDMI
  - 1x line-out (3.5mm)
  - 2xDisplayPort
- Unidad óptica: Si
- LAN: SI Gigabit 1 RJ45
- Sonido Integrado HD
- Puertos de Video 2 Puertos Display Port, 1 Puerto HDMI
- Tarjeta de Video Integrada
- Fuente de Poder 260W 85% eficiencia PSU
- Sistema Operativo SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL DOWNGRADE TO WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL
- Garantía: 01 año como mínimo
- **Incluye teclado, mouse y monitor**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ing. Rider Alberto Risco Ojeda
DIRECTOR E.P. ING. MECANICA

BUSTAMANTE BUSTAMANTE ANABELA DAMALIN
INGENIERA QUIMICO
CIP Nº 244911

ORDEN DE COMPRA N° 00023-2024

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01 DIC 2023

Página : 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000023

N° Exp. SIAF

Día	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC	N° Cuadro Adquisic: 000024
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802	Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:	N° Contrato :
RUC : 20101084515 Teléfono : 998128206 Fax : devans@evansa.com.pe	Moneda : S/ TIC :

Concepto : ADQUISICION DE CPUS Y MONITORES TIPO 1 - PARA EL PROYECTO DE INVERSION EP ING MECANICA- CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
740890370005	51	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 282222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5 - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , FREC A 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° A 21°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL/ 178° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, ENERGY, TCO - CABLES ADICIONALES: 1 X VGA CABLE, 1 X HDMI CABLE	430.700000	21.965,70
140600531055	51	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 GHz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB SSD + TECLADO MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF PLUS	4.290.681176	218.834,94

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/RB	Clasif. Gasto	Monto S/
0018	22.048.0010.0065.2412581.4000040	5 - 18	2.6.3 2.3 1	240.800,64

Van ... S/ 240.800,64

Facturar a nombre de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Dirección AV. PACIFICO - URB. BUENOS AIRES 508 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC 20148309109
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ELABORADO POR	ORDENADO POR		CONFORMIDAD	
MORENO MONTES, KARIN JULISSA				CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01 (PLANCAR)

Página : 2 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000029

N° Exp. SIAF

UNIDAD EJECUTORA : 301 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

Día	Mes	Año
11	03	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802
LIMA / LIMA / JESUS MARIA
CCI:
RUC : 20101064515 Teléfono : 996128205 Fax : aevans@evansa.com.pe

2. CONDICIONES GENERALES

N° Cuadro Adquisic: 000024
Tipo de Proceso : CCE
N° Contrato :
Moneda : S/
TIC :

Concepto : ADQUISICION DE CPUS Y MONITORES TIPO 1 - PARA EL PROYECTO DE INVERSION EP ING MECANICA- CUI 2412681-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Vienen ... 240,800.64

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
			CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 3HDT7108-7161281931-M - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700(16 NUCLEOS, 24 SUBPRODUCTOS, PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY 2.10 GHZ/INTEL TURBO BOOST MAX TECHNOLOGY FREQUENCY 5.20 GHZ, 30 MB DE CACHE - MEMORIA RAM : 16 GB DDR5 4800 MHZ DISTRIBUIDO, CUENTA CON EXPANSION DE HASTA 128 GB RAM, CON 4 SLOTS - ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 NVME - OPCION GRAFICA: VIDEO INTEGRADO - SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL - PUERTO DE ALIMENTACION: INTERNO, 85 W, POWER SUPPLY UNIT(PSU) , 85% EFFICIENT, 80 PLUS BRONZE - CONECTIVIDAD LAN/ GIGABIT ETHERNET PORT - TECLADO/MOUSE: STD TECLADO EN ESPAÑOL WIRED MOUSE - LECTOR DIGITAL DE TARJETAS: DUAL/COMBO - PUERTOS FRONTALES: 1 USB 2.0 PORT 1 USB 2.0 PORT WITH PWR SHARE 1 USB 3.2 GEN 2 PORT 1 USB 3.2 GEN 2 X2 TYPE-C PORT		

Van ... S/ 240,800.64

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Dirección: AV. PACIFICO - URB. BUENOS AIRES 500 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC: 20145309103
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ELABORADO POR: MORENO MONTES, SANDY JULISSA

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES — RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES — RESPONSABLE DE ALMACEN

CUENTAS X PAGAR S/
Fecha: Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura la copia de la OC adjunta
- Esta Orden es válida con las firmas y sellos reglamentarios e autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

PERÚ COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-114-1-1

EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20148309109
Razón Social	: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Ejecutora	: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA [000114]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20101064515
Razón Social	: J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Domicilio Fiscal	: Avenida Republica de Chile 478 Of. 802, Jesús María
Ubigeo	: JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Rpte Legal	: EVANS GUEVARA EVANS GUEVARA JOHN
Correo Electrónico	: aevans@evansa.com.pe
Teléfono fijo	: (511) 719-7515 Anx.
Teléfono móvil	: 998128205

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SEGUNDO GUTIERREZ INFANTE	MANUEL COSME TERRONES BARRANTES
D.N.I.	: 26644159	18041523
Teléfono	: (51) 04331044 / 979-334-531	(51) 04331044 / 966-264-439
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	ASISTENTE DE ALMACEN
Correo electrónico	: GUTI550@HOTMAIL.COM	MANUELTERRONESB@HOTMAILES

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta	: 0011-0377-0100038979
CCI	: 011377000100038979 99

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	:	Estado	: PUBLICADA
Tipo de Contratación	: Paquete		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 531		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 18/03/2024 al 02/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega	: 1 de 1
Dirección	: AV. UNIVERSITARIA S/N URB BELLAMAR
Ubigeo	: NUEVO CHIMBOTE / SANTA / ÁNCASH
Referencia	: COSTADO DE SENATI
Latitud / Longitud	:
Código Postal	: 51

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700 RAM: 16 GB DDR5 4400 MHz ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD LAN: SI WLAN: NO USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G. P: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL OPTIPLEX 7010 SFF PLUS 3HDT710S-71612S2SS3-H	DELL	3HDT710S-71612S2SS3-H	51	3,636.34	33,381.60	218,834.94
2	MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920X1080 PIXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDMI: SI G. P: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL DELL E2222HS 2E2222HS3	DELL	2E2222HS3	51	365.00	3,350.70	21,965.70

Monitor + CPU : Tipo I
Mecánica.

IMPORTE TOTAL (PEN) 240,800.64

ORDEN DE COMPRA N° 00024-2024

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.NCMN

Página : 1 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000024

N° Exp. SIAF : 532

Día	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC	N° Cuadro Adquisic: 000025
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 478 INT. 802	Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:	N° Contrato :
RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : eevans@evansa.com.pe	Moneda : S/ TIC :

Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 2 -PARA LA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
740880370005	13.	UNIDAD	MONITOR LED 21.5 in - MARCA: MARCA: DELL - CODIGO UNICO DE PRODUCTO: 2E2222HS3 - MODELO: E2222HS ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TAMAÑO DE DIAGONAL VISIBLE: 21.5" - RATIO DE ASPECTO: 16:9 - RESOLUCION OPTIMA: 1920 X 1080 , HMD A 60 HZ - CONTRASTE: 3000:1 - PANTALLA : LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920 X 1080 PIXELES - AJUSTABILIDAD: INCLINACION (-5° a 21°) - BRILLO: 250 cd/m2 - CONECTIVIDAD: 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI 1.4 - FUENTE DE ALIMENTACION: 100-240VAC - ANGULO DE VISION: 178° VERTICAL/ 178° HORIZONTAL - CERTIFICACION: ENERGY STAR, EPEAT, TCO - CABLES ADICIONALES: POWER CABLE, 1 X HDMI CABLE	430.700000	5,599.10
140600521030	13.	UNIDAD	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.10 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD + TECLADO - MARCA: DELL - CODIGO UNICO DEL PRODUCTO: [illegible]	4,439.195385	57,709.54

Van ... S/ 63,308.64

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0018	22.046.0010.0056.2412581.4000040	5 - 18	2.6. 3 2. 3 1	63,308.64

Facturar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Dirección: AV. PACÍFICO - URB. BUENOS AIRES 508 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC 20148309109
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección
URB. RELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ELABORADO POR	ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD		CONFORMIDAD	
MORENO MONTES, KARIN JULISSA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- [illegible]
- [illegible] para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U1.HCMN

Página : 2 de 4

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000024

Nº Exp. SIAF

Día	Mes	Año
11	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000114

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J EVANS Y ASOCIADOS SAC	Nº Cuadro Adquisic: 000025
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE NRO. 476 INT. 802	Tipo de Proceso : CCE
LIMA / LIMA / JESUS MARIA CCI:	Nº Contrato :
RUC : 20101064515 Teléfono : 998128205 Fax : aevans@evanes.com.pe	Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICION DE CPU Y MONITOR TIPO 2 -PARA LA E.P ING MECANIC- PROYECTO DE INVERSION - CUI 2412581-RES N° 316-2023-UNS-R-ACUERDO MARCO

Vienen ... 63,308.64

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
			- MODELO: OPTIPLEX 7010 SFF PLUS - ESPECIFICACIONES TECNICAS: - PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700(16 NUCLEOS, 24 SUBPROCESOS PERFOMANCE-CORE BASE FREQUENCY 2.10 GHZ/INTEL TURBO MAX TECHNOLOGY FREQUENCY 5.20 GHZ, 30 MB DE CACHE) - CHIPSET: INTEL Q670 -VPRO: SOPORTA VPRO. - MEMORIA RAM: 16 GB DDR5 4400 MHZ INSTALADO, CUENTA CON EXPANSION DE HASTA 128GB RAM, CON 4 SLOTS. - ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2 NVMe - OPCION GRAFICAS: INTEGRADO, INTEL GRAPHICS - SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑ - FUENTE DE ALIMENTACION: INTERNA, 260W, POWER SUPPLY UNIT(PSU), 85% EFFICIENT, 80 PLUS BRONZE - CONECTIVIDAD LAN: SI, RJ45 ETHERNET PORT - CONECTIVIDAD WLAN/BLUETOOTH: SI, WIFI 6 , 802.11 + BT 5.2 - TECLADO/MOUSE: SI, TECLADO EN ESPAÑOL WIRED MOUSE - LECTOR OPTICO: SI, INTERNO, DVD+/- RW - PUERTOS: FRONTALES 6 1 USB 2.0 PORT		

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/

Van ... S/ 63,308.64

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Dirección : AV. PACÍFICO - URB. BUENOS AIRES 598 / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH RUC 20148309109
Agradeceremos enviar los bienes a la siguiente dirección
URB. BELLAMAR S/N - AV. UNIVERSITARIA / NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

ELABORADO POR	OPERACIONES LOGÍSTICAS		CONFORME	
MORENO MONTES, KARIN JULISSA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

PERÚ COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-114-2-1

EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20148309109
Razón Social	: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Ejecutora	: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA [000114]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20101064515
Razón Social	: J EVANS Y ASOCIADOS SAC
Domicilio Fiscal	: Avenida Republica de Chile 478 Of. 802, Jesús Maria
Ubigeo	: JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Rpte Legal	: EVANS GUEVARA EVANS GUEVARA JOHN
Correo Electrónico	: aevans@jevansa.com.pe
Teléfono fijo	: (511) 719-7515 Anx.
Teléfono móvil	: 998128205

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SEGUNDO GUTIERREZ INFANTE	MANUEL COSME TERRONES BARRANTES
D.N.I.	: 26644159	18041523
Teléfono	: (51) 04331044 / 979-334-531	(51) 04331044 / 966-264-439
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	ASISTENTE DE ALMACEN
Correo electrónico	: GUTI550@HOTMAIL.COM	MANUELTERRONESB@HOTMAIL.ES

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta	: 0011-0377-0100038979
CCI	: 011377000100003897999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	:	Estado	: PUBLICADA
Tipo de Contratación	: Paquete		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 532		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 18/03/2024 al 02/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega	: 1 de 1
Dirección	: AV. UNIVERSITARIA S/N URB BELLAMAR
Ubigeo	: NUEVO CHIMBOTE / SANTA / ÁNCASH
Referencia	: COSTADO DE SENATI
Latitud / Longitud	:
Código Postal	: 51

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700 RAM: 16 GB DDR5 4400 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB M.2 SSD NVMe LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL OPTIPLEX 7010 SFF PLUS 3HDT710S-7161SSS3-H-W	DELL	3HDT710S-7161SSS3-H-W	13	3,762.03	8,803.15	57,709.54
2	MONITOR : PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920X1080 PIXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDMI: SI G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL DELL E2222HS 2E2222HS3	DELL	2E2222HS3	13	365.00	854.10	5,599.10

IMPORTE TOTAL (PEN) 63,308.64

Monitor + CPU : Tipo II .
Mecánica .

Firmado digitalmente por CHACON AVILA Dennis Aldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 15:57:29 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/GRAN-02-078

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC
EMISOR	:	DENNIS ALDO CHACON AVILA - JEFE DE COMISION - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	AMERICA ODAR ROSARIO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148309109
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL
N° FOLIOS	:	26

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe_n-19748-2024-CG-GRAN-SCC
2. Oficio-n-001626-2024-CG-GRAN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **6D3UW7R**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 15:57:47 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 19748-2024-CG/GRAN-SCC
EMISOR	:	DENNIS ALDO CHACON AVILA - JEFE DE COMISION - COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	AMERICA ODAR ROSARIO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148309109**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/GRAN-02-078
2. Informe_n-19748-2024-CG-GRAN-SCC
3. Oficio-n-001626-2024-CG-GRAN

NOTIFICADOR : DENNIS ALDO CHACON AVILA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **6HWWK3Z**

Firmado digitalmente por RUCOBA TANANTA Emerson FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2024 12:49:54 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Huaraz, 18 de Julio de 2024

OFICIO N° 001626-2024-CG/GRAN

Señora:
America Odar Rosario
Rectora
Universidad Nacional del Santa
Av. Pacifico Nº 508
Ancash/Santa/Nuevo Chimbote

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 19748-2024-CG/GRAN-SCC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita y revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra "*Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ingeniería Mecánica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, distrito de Nuevo Chimbote -provincia del Santa - departamento de Ancash"*, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 19748-2024-CG/GRAN-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Emerson Rucoba Tananta
Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control de Ancash
Contraloría General de la República

(ERT/dca)

Nro. Emisión: 08703 (L425 - 2024) Elab:(U18856 - L425)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **DMWBJLO**
