CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

INFORME DE VISITA DE CONTROL Nº 016-2026-OCI/4155-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
HUACHO, HUAURA, LIMA

OBRA: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUACHACAN A LA ALTURA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE AYARANGA, DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI Nº 2472644

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 08 SETIEMBRE DE 2026 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2026

TOMO I DE I

HUACHO, 21 DE SETIEMBRE DE 2026

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 016-2026-OCI/4155-SVC

OBRA: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUACHACAN A LA ALTURA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE AYARANGA, DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI Nº 2472644

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	3
II.	OBJETIVOS	3
III.	ALCANCE	3
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LA VISITA DE CONTROL	4
V.	SITUACIONES ADVERSAS	7
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL	20
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	20
VIII.	CONCLUSIÓN	20
IX.	RECOMENDACIONES	20
	APÉNDICE	22

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 016-2026-OCI/4155-SVC

OBRA: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUACHACAN A LA ALTURA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE AYARANGA, DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI Nº 2472644

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura, mediante Oficio n.° 914-2026-MPH/OCI de 08 de setiembre de 2026 registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 4155-2026-014, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaura, cumple con lo establecido en la normativa aplicable y disposiciones internas.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

2.2 Objetivo específico

Determinar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, Reglamento y normas vigentes, relacionados al proceso constructivo y ejecución contractual de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

III. ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644.** (en adelante, la Obra), la cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaura (en adelante, la Entidad) bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura (en adelante, OCI), a cargo del servicio de control realizado del 08 setiembre de 2026 al 17 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Este Servicio de Control Simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 "*Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación*", correspondiente a la meta *9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos*".

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA VISITA DE CONTROL

4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del servicio de Visita de Control está enfocado al estado situacional de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaura y se realizó en el marco de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios.

4.2 Aprobación del Expediente Técnico

Mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025, se aprobó el Expediente Técnico de la inversión denominada: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, con un costo total de inversión que asciende a S/ 1 079 047,55, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta (contrata) y bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, cuyo desagregado de presupuesto es conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 2
Estructura del presupuesto de obra según Expediente Técnico

Descripción	Monto S/
COSTO DIRECTO	**671 958,35**
GASTOS GENERALES (8.00%)	53 756,67
UTILIDAD (8.00%)	53 756,67
SUB TOTAL S/	**779 471,69**
IGV 18%	140 304,90
VALOR REFERENCIAL	**919 776,59**
GASTOS DE SUPERVISIÓN	64 384,36
GESTIÓN DE PROYECTOS	55 186,60
REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	39 700,00
PRESUPUESTO TOTAL	**1 079 047,55**

Fuente: Expediente Técnico de la Obra aprobado por Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

La obra contempla los siguientes componentes:

Cuadro n.° 3
Resumen de componentes

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	OBRAS PROVISIONALES
2	TRABAJOS PRELIMINARES
3	SEGURIDAD YSALUD DURANTE EL TRABAJO
4	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
5	MOVIMIENTO DE TIERRAS
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE GAVIONES
7	VARIOS
8	FLETE

Fuente: Expediente Técnico de la Obra aprobado por Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

4.3 Ubicación

La obra "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Ayaranga, en el distrito de Paccho, provincia de Huaura y departamento de Lima, cuya ubicación se muestra en la imagen siguiente:

Imagen 1
Ubicación de la obra



Fuente: Google Earth Pro.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

4.4 Contrato de Ejecución de Obra

A través del procedimiento de selección **de Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 005-2025-CS/MPH-H,** el 27 de noviembre de 2025, la Entidad adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**; a favor del Consorcio Sayán, suscribiéndose el Contrato n.° 037-2025-MPH-H, el 31 de diciembre de 2025, por un monto de S/ 919 776,59, tal como se detalla a continuación:

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Cuadro n.° 4
Detalle del Contrato n.° 003-2025-MPH-H

Datos	Detalle
Procedimiento de selección	Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 005-2025-CS/MPH-H, el 27 de noviembre de 2025.
Contratista	Consorcio Sayán
Contrato	n.° 037-2025-MPH-H, el 31 de diciembre de 2025.
Representante Común	Salcedo Saavedra Kant Giulio con DNI n.° 43278158
Sistema de contratación	A Precios Unitarios
Monto del contrato	S/ 919 776,59
Plazo de ejecución	60 días calendario

Fuente: Contrato n.° 037-2025-MPH-H, suscrito el 31 de diciembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

4.5 Contrato de Supervisión de Obra

La Entidad suscribió el Contrato n.º 02-2026-GM-H el 02 de febrero de 2026, con el Consorcio Supervisor Ayaranga quien designa a la ingeniera Linda Estrella Alba Santa Cruz con CIP n.° 186481 para la supervisión de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.º 2472644,** por el importe de S/ 64 384,36, por el plazo de 90 días calendario, tal como se detalla a continuación:

Cuadro n.° 5
Detalle de contrato n.° 02-2026-GM-H

Datos	Detalle
Contratista	Consorcio Supervisor Ayaranga
Contrato	n.° 02-2026-GM-H el 02 de febrero de 2026
Monto del contrato	S/ 64 384,36
Supervisor de Obra	Linda Estrella Alba Santa Cruz con CIP n.° 186481
Plazo de ejecución	90 días calendario: 60 días calendario de ejecución y 30 días calendario para la liquidación de la obra

Fuente: Contrato n.º 02-2026-GM-H el 02 de febrero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

4.6 Estado situacional de la obra.

De la revisión realizada por la Comisión de Control, a la documentación proporcionada por la Entidad, mediante Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH[1] de 01 de setiembre de 2026, se verifica que la obra inició su ejecución el 17 de febrero de 2026, según consta en el Acta de Inicio de Obra, con un plazo de 60 días calendario, tal como se detalla a continuación:

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Cuadro n.° 6
Estado Situacional de la Obra

Datos	Detalle
Entrega de Terreno	16/02/2026
Inicio de Plazo Contractual	17/02/2026
Plazo de Ejecución	60 días calendario
Término Programado	17/04/2026
Suspensión de Plazo	17/04/2026

Fuente: Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH de 01 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Así mismo, se menciona que la obra se encuentra "paralizada", con un avance de ejecución acumulado de 95,69%, contenido en las valorizaciones de la Obra n.[os] 1, 2 y 3, tal como se detalla a continuación:

- Valorización n.° 01, con un porcentaje de avance mensual de 9,67%.
- Valorización n.° 02, con un porcentaje de avance mensual de 67,22% y acumulado de 76,89%
- Valorización n.° 03, con un porcentaje de avance mensual de 18,80% y acumulado de 95,69%.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

[1] Documento presentado en atención al Oficio n.° 874-2026-MPH/OCI de 28 de agosto de 2026 emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la información recopilada por la Comisión de Control, durante la visita de inspección realizada a la ejecución de la obra, así como de la proporcionada por la Entidad mediante Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH[2] recepcionado el 01 de setiembre de 2026, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644,** las cuales se exponen a continuación:

1. LA ENTIDAD VIENE INOBSERVANDO LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL DISEÑO Y EN LOS MATERIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO SU CALIDAD Y DURABILIDAD, ASÍ COMO, LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA MISMA.

a) Condición

De la visita de inspección realizada por la Comisión de Control el 09 de setiembre de 2026 a la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, y según consta en el Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA, suscrita con los representantes del Centro Poblado de Ayaranga, se ha verificado que la misma, se encuentra paralizada y además se advierten deficiencias técnicas en el diseño y en los materiales, tales como: Dimensiones de los gaviones, tamaño de las piedras de los gaviones y medidas de las mallas metálicas de los gaviones, no acordes con lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra, tal como se detalla a continuación:

<u>Dimensiones de los gaviones</u>

Durante el recorrido a la obra se constató las dimensiones de los gaviones, tales como longitud, ancho y alto del tramo I (40 m) y del tramo II (70 m), advirtiéndose que el largo del Tramo I (medido desde la progresiva 0.00 hacia dirección del río) cuenta con una longitud total de 39,30 m, siendo el primer bloque de menor dimensión (4.23 m), tal como se evidencia en las imágenes siguientes:

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

[2] Documento presentado en atención al Oficio n.° 874-2026-MPH/OCI de 28 de agosto de 2026 emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura.

Imágenes 2 y 3
Bloque inicial del tramo I mide 4.23 m de longitud



Fuente: Fotografía tomada en la visita de inspección a la obra realizada el 09 de setiembre de 2026.



Fuente: Fotografía tomada en la visita de inspección a la obra realizada el 09 de setiembre de 2026.


Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Al respecto, de la revisión realizada a los planos del proyecto, respecto al *Plano "PDG-01 - Detalle de gavión Tipo I- Tipo II – Tipo III"*, incluidas en el Expediente Técnico de la Obra[3], precisa que la longitud del bloque del gavión tiene que ser de 5,00 m, tal como, se muestra en la imagen siguiente:

Imagen 4
Detalle isométrico de Gavión Tramo I

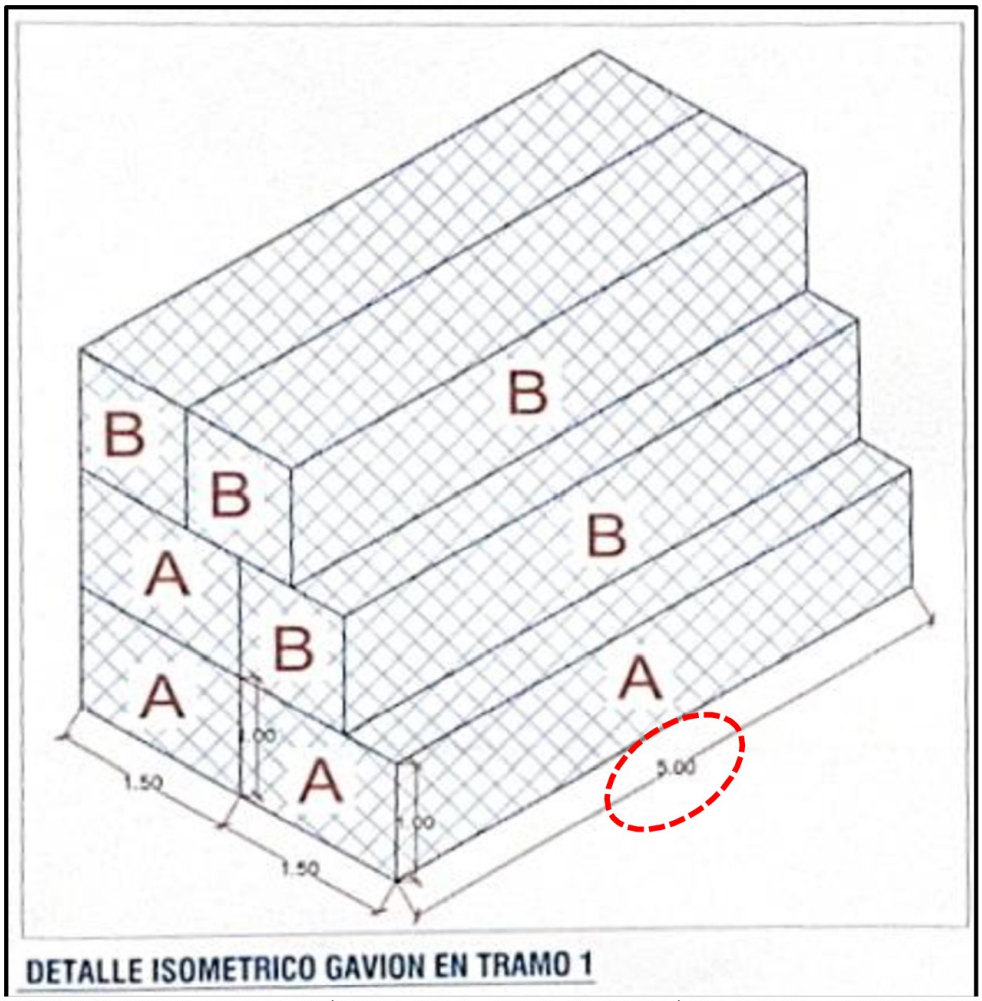

Fuente: Plano "PDG-01 -Detalle de gavión Tipo I- Tipo II – Tipo III", Expediente Técnico de la Obra aprobado mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025.

Tamaño de las piedras de los gaviones

Durante la verificación técnica realizada por la Comisión de Control, se advirtió que existían piedras contenidas en el bloque de los gaviones, con tamaño de 12 cm de diámetro y hasta de menores tamaños, tal como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

[3] Documento remitido mediante el Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH recepcionado el 01 de setiembre de 2026.

Imagen 5
Los gaviones contienen piedras que miden 12 cm de diámetro



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Imágenes 6 y 7
Los gaviones contienen piedras de tamaño pequeño



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

7



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

En este sentido, las Especificaciones Técnicas establecidas en el Expediente Técnico de la Obra, respecto de las partidas *1.6.4. LLENADO Y TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.50x1.00m CON PIEDRA DE 6" -10" y 1.6.5. LLENADO Y TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.00x1.00m CON PIEDRA DE 6" -10"*, indican lo siguiente: *El llenado y tapado de los gaviones tipo caja (...) rellena de con piedra canto rodado de 6" a 10"*. (El subrayado es nuestro).

Estas indicaciones implican que las piedras contenidas en los bloques de gaviones deben de tener medidas entre 15 cm (6") a 25 cm (10") de diámetro.

Medidas de las mallas metálicas de gaviones


Durante la verificación técnica realizada por la Comisión de Control, se advirtió que las mallas metálicas de los gaviones, eran de un material metálico recubierto con PVC, con un espesor de 3 mm aproximadamente y con una cocada hexagonal de hasta 16 cm de abertura, tal como se aprecia en las imágenes siguientes:

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Imagen 8
Espesor de la malla metálica, con aproximadamente 3 mm de diámetro

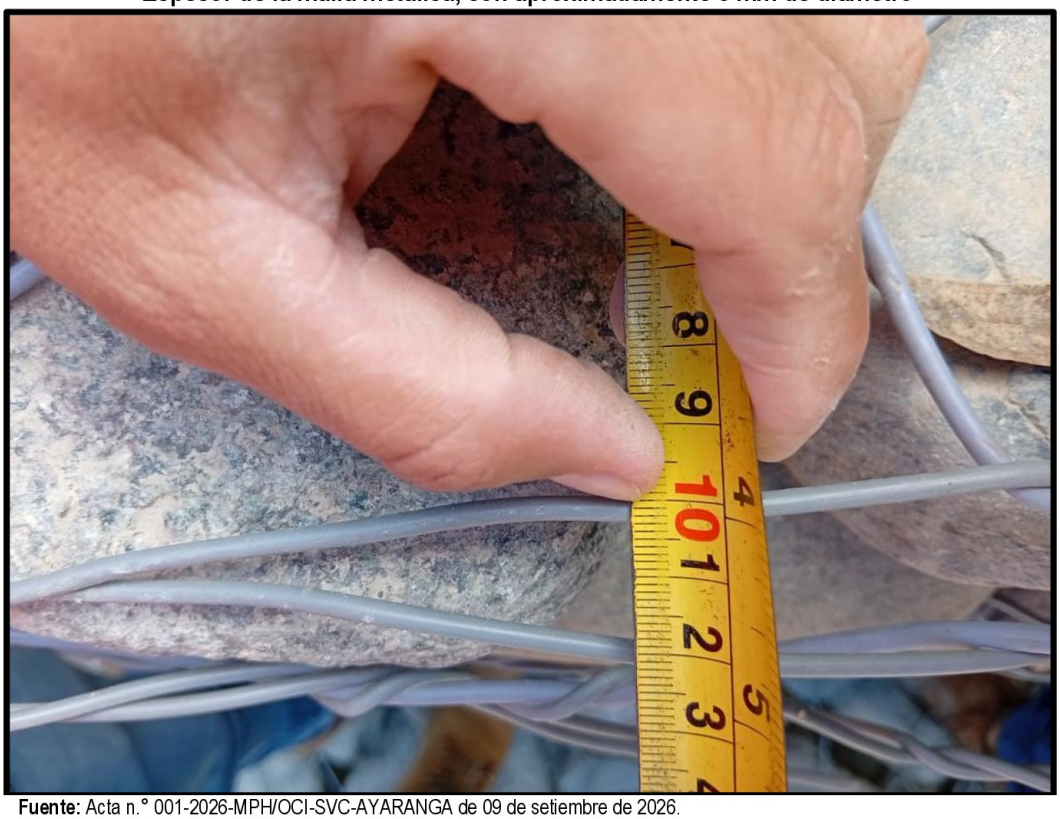

Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Imagen 9
Ancho de abertura cocada hexagonal de la malla mide 12,00 cm



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Imagen 10
Ancho de abertura de cocada de la malla mide 16,00 cm



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Sobre el particular, las Especificaciones Técnicas establecidas en el Expediente Técnico, respecto de las partidas *1.6.2. ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.50x1.00m y 1.6.3. ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.00x1.00m*, indican lo siguiente: *(…) Se contará con malla hexagonal con abertura de 50 x 70 mm, siendo el alambre galvanizado de 3.40 mm (…)* (Lo subrayado es nuestro). Estas indicaciones implican que el alambre de la malla galvanizada debe de tener un espesor de 3.4 mm, un ancho de cocada de 5 cm (50mm) x 7 cm (70 mm).

En ese sentido, lo anteriormente evidenciado pone en riesgo que los gaviones mantengan su calidad y durabilidad, por ende, ante una fuerte precipitación pluvial aumente el caudal del Río Huachacan, debilitando la estructura de los gaviones y que estos se derrumben.

b) Criterio:

Los hechos mencionados anteriormente inobservan lo establecido en:

- **Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, publicada el 24 de junio 2024 y vigente desde el 22 de abril de 2025, que establece:

  "(…)
  Artículo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual
  (…)
  69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.
  (…)"

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,** aprobado mediante Decreto Supremo n.º 009-2025-EF vigente desde el 23 de abril de 2025 y sus modificatorias, que establece:

  "(…)
  Artículo 187. Funciones de la supervisión de obras y consultoría de obras
  (…)
  187.1. La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.
  (…)"

- **Contrato n.° 037-2025-GM/MPH-H**, suscrito el 31 de diciembre de 2025 – Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 005-2025-C/MPH-H, de 02 de diciembre de 2025, que establece:

  "(…)
  CLÁUSULA DÉCIMOCUARTO: PENALIDADES
  (…)

OTRAS PENALIDADES			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***forma de cálculo***	***procedimiento***
(…)	*(…)*	*(…)*	*(…)*
07	***CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA*** *Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado además de la penalidad, el Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo algunos para la Entidad.* *Esto se refiere que no cumple con las especificaciones técnicas mínimas que se detallan en el Expediente Técnico.* *Donde no se cumplen con las dosificaciones, encofrados, alojamientos, pendiente y otras formas geométricas que se indican en los planos.* *Cuando el contratista ejecuta las partidas con materiales insumos que no cuenten con la certificación de calidad correspondiente, los cuales deben ser calificados entre el residente y el Supervisor con los correspondientes protocolos de control y/o aseguramiento de calidad.*	*(0,5 UIT) por cada caso detectado*	*Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA y/o informe de la SGEPOPYM, GDUR, según corresponda.*
(…)	*(…)*	*(…)*	*(…)*
08	***CALIDAD Y MATERIALES*** *Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y cada uno de los materiales utilizados no cuente con su respectivo certificado de calidad. La penalidad será por cada detectado, EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazar por otro que cumplas con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.*	*(0,5 UIT) por cada caso detectado*	*Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA y/o informe de la SGEPOPYM, GDUR, según corresponda.*

(…)"

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

- **Contrato 02-2026-GM-H**, suscrito el 02 de febrero de 2026– Concurso Público Abreviado n° 011-2025-C/MPH-H, de 17 de diciembre de 2025, que establece:

"(…)
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTO: PENALIDADES
(…)

OTRAS PENALIDADES			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***forma de cálculo***	***procedimiento***
(…)	*(…)*	*(…)*	*(…)*
05	*Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser responsables por los perjuicios ocasionados a la entidad.*	*(0 ,5 UIT) por cada caso detectado*	*Según informe del SGEPOPYM, GDRU-Monitor. coordinador; de la Municipalidad Provincial de Huaura.*
(…)	*(…)*	*(…)*	*(…)*

(…)"

- **Expediente Técnico de la obra: "Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, aprobado mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025, que establece:

"(…)
06. ESPECIFICACIONES TECNICAS
(…)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(…)
1. MURO DE GAVIONES
(…)
1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE GAVIONES
1.6.1. ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10")

DESCRIPCIÓN
Esta partida contempla la ejecución de acopio con material de material de relleno de los gaviones, para conformación del muro de gaviones tipo caja y de las dimensiones establecida en los planos o donde ordene la supervisión. Esta partida comprende el trabajo de preparación del relleno necesario para la conformación de las cajas del muro de gaviones indicados en los planos.

1.6.2. ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.50x1.00m
1.6.3. ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.00x1.00m

DESCRIPCIÓN
Los gaviones son estructuras flexibles construidas por una red de malla hexagonal con abertura de 50 x 70 mm, siendo el alambre galvanizado de 3.40 mm con polímero de alta resistencia, además esta es sometida a triple torsión.
En esta partida se abastecerá del material para la construcción del muro de contención.
Se contará con malla hexagonal con abertura de 50 x 70 mm, siendo el alambre galvanizado de 3.40 mm con polímero de alta resistencia a triple torsión las cuales se armarán en forma de cajón con las medidas 5.00x1.50x1.00, 5.00x1.00x1.00, y 2.00x1.00x1.00m para ser colocados de acuerdo a los planos.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

1.6.4. LLENADO Y TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.50x1.00m CON PIEDRA DE 6" -10"
1.6.5. LLENADO Y TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.00x1.00x1.00m CON PIEDRA DE 6" -10"

DESCRIPCION
El llenado y tapado de los gaviones tipo caja de 5.00x1.50x1.00, 5.00x1.00x1.00, y 2.00x1.00x1.00m de malla de triple torsión, hexagonal de 50 x 70 mm, de alambre de acero galvanizado de 3.4mm de diámetro, rellena con piedra canto rodado de aportación de granulometría comprendía de 6" a 10", el cual será colocada manualmente.

14. PLANOS
(…)
14.6. PLANO DETALLE DE GAVIÓN TIPO I- TIPO II – TIPO III
Plano Detalle de gavión Tipo I- Tipo II – Tipo III" (PDG-01)
(…)"

c) Consecuencia

La situación antes expuesta, pondría en riesgo la calidad y durabilidad de la obra, afectando la finalidad pública de la misma.

2. LA ENTIDAD VIENE INOBSERVANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN SU ÚLTIMO DÍA DE PLAZO, AUN FALTANDO LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA *1.7.1. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA*, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA NO CULMINACIÓN DE LA MISMA Y QUE, ANTE LA POSIBLE ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA, EL RÍO HUACHACAN SE DESBORDE CAUSANDO DAÑOS A LA POBLACIÓN, INCUMPLIÉNDOSE EL OBJETIVO DE LA OBRA.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

a) Condición

De la visita de inspección realizada por la Comisión de Control, el 09 de setiembre de 2026 a la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, y según consta en el Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA suscrita con los representantes del Centro Poblado de Ayaranga y en el Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH[4] recepcionado el 01 de setiembre de 2026, se determina que la obra se encuentra paralizada desde el 17 de abril del 2026, siendo este a la vez el último día del plazo de su ejecución, tal como se detalló en el cuadro n.° 6.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Al respecto, durante la verificación técnica realizada por la Comisión de Control, se advirtió que el Río Huachacan a lo largo del Tramo I de los gaviones colocados, se encuentra colmatado en el centro de su cauce, por las piedras y rocas que fueron removidas para la habilitación del terreno durante la construcción de los gaviones, tal como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

[4] Documento presentado en atención al Oficio n.° 874-2026-MPH/OCI de 28 de agosto de 2026 emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura.

Imágenes 11 y 12
Cauce central del río, colmatado por piedras y rocas a lo largo del tramo I de gaviones



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00



Fuente: Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Cabe precisar que, las Especificaciones Técnicas establecidas en el Expediente Técnico, respecto de la partida *1.7.1. LIMPIEZA FINAL DE OBRA*, indica lo siguiente: *(…) Incluye la limpieza y despeje de todas las áreas de construcción, de acuerdo al replanteo general al final de la obra. (…);* así mismo, el ***Objetivo de la obra*** incluido en el Resumen Ejecutivo del Expediente Técnico de la obra, indica lo siguiente: *Aumentar la seguridad de las vías provinciales por los aumentos de la cuenca del Río Huachacan. Salvaguardar la accesibilidad a los centros poblados*. (El subrayado es nuestro).

En ese sentido, la no ejecución de la limpieza final de la colmatación de piedras en el cauce del Río Huachacan, ante el posible aumento del caudal por la activación de la quebrada que la alimenta (en consideración a la declaración de emergencia[5] decretado por el Estado Peruano ante el peligro de inminentes lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027), causaría el desborde del mismo, afectando la vía de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, no cumpliéndose el objetivo de la obra.

b) Criterio:

Los hechos mencionados anteriormente inobservan lo establecido en:

- **Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,** publicada el 24 de junio 2024 y vigente desde el 22 de abril de 2025, que establece:

  "(…)
  Artículo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual
  (…)
  69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.
  (…)"

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,** aprobado mediante Decreto Supremo n.º 009-2025-EF y sus modificatorias vigente desde el 23 de abril de 2025, que establece:

  "(…)
  Artículo 187. Funciones de la supervisión de obras y consultoría de obras
  (…)
  187.1. La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.
  (…)"

- **Contrato n.° 037-2025-GM/MPH-H**, suscrito el 31 de diciembre de 2025 – Licitación Pública Abreviada de obras n.° 005-2025-C/MPH-H, de 02 de diciembre de 2025, que establece:

  "(…)
  CLÁUSULA DÉCIMOCUARTO: PENALIDADES
  (…)

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

[5] Declarado en emergencia mediante Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM de 01 de setiembre de 2026.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

(…)"

- **Contrato 02-2026-GM-H**, suscrito el 02 de febrero de 2026– Concurso Público Abreviado n° 011-2025-C/MPH-H, de 17 de diciembre de 2025, que establece:

"(…)
CLÁUSULA DÚODECIMA: PENALIDADES
(…)
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

(…)"

- **Expediente Técnico de la obra: "Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, aprobado mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025, que establece:

"(…)
06. ESPECIFICACIONES TECNICAS
(…)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(…)
1. MURO DE GAVIONES
(…)
1.7. VARIOS
1. 7.1. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Incluye la limpieza y despeje de todas las áreas de construcción, de acuerdo al replanteo general al final de la obra. En particular, se deberán efectuar estas operaciones en áreas para instalaciones provisionales del Núcleo ejecutor, áreas de construcción de todas las obras permanentes a cielo abierto que conforman el Proyecto, de modo que el terreno quede limpio, libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.
La partida comprende también el apilado de todo el material retirado producto de la limpieza en el lugar indicado por El Residente de obra.
(…)"

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

c) Consecuencia

La situación antes expuesta, pondría en riesgo la no culminación de la obra y que, ante la posible activación de la quebrada, el Río Huachacan se desborde, causando daños a la población, incumpliéndose el objetivo de la misma.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control al estado situacional de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, se encuentra detallada en el **Apéndice n.° 1**.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Huaura.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del servicio de Visita de Control a la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644,** se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la misma, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

IX. RECOMENDACIONES

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control realizada a la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la propia Entidad.

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

2. Hacer de conocimiento del Concejo Municipal el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control realizada a la ejecución de la obra: "**Creación de la Defensa Ribereña en la margen izquierda del Río Huachacan a la altura de la carretera de acceso al Centro Poblado de Ayaranga, distrito de Paccho - provincia de Huaura - departamento de Lima" - CUI n.° 2472644**, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.2.1.3 de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, Servicio de Control Simultáneo, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218- 2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

3. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a este Órgano de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Huacho, 21 de setiembre de 2026

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 18:55:56 -05:00

Rosa Yesenia Aguilar Zelada
Supervisora

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 18:53:24 -05:00

Richard Jesús Silvestre Gómez
Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 18:56:09 -05:00

Rosa Yesenia Aguilar Zelada
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huaura
Cód. CGR N° 62212

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD DE CONTROL

1. **LA ENTIDAD VIENE INOBSERVANDO LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL DISEÑO Y EN LOS MATERIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO SU CALIDAD Y DURABILIDAD, ASÍ COMO, LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA MISMA.**

N°	Documento
1	Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH recepcionado el 01 de setiembre de 2026.
2	Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.
3	Expediente Técnico de la Obra aprobado mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025.

2. **LA ENTIDAD VIENE INOBSERVANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA EN SU ÚLTIMO DÍA DE PLAZO, AUN FALTANDO LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA *1.7.1. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA*, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA NO CULMINACIÓN DE LA MISMA Y QUE, ANTE LA POSIBLE ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA, EL RÍO HUACHACAN SE DESBORDE, CAUSANDO DAÑOS A LA POBLACIÓN, INCUMPLIÉNDOSE EL OBJETIVO DE LA OBRA.**

N°	Documento
1	Informe n.° 01733-2026-SGEPOPyM-GDUR-MPH recepcionado el 01 de setiembre de 2026.
2	Acta n.° 001-2026-MPH/OCI-SVC-AYARANGA de 09 de setiembre de 2026.
3	Expediente Técnico de la Obra aprobado mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil n.° 197-2025-GDUR/MPH de 25 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por SILVESTRE GOMEZ Richard Jesus FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:52:40 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:23 -05:00

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2026 18:55:42 -05:00

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 19:03:55 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1003-2026-MPH/OCI
EMISOR	:	ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Sumilla:

Se remite el Informe de Visita de Control N° 016-2026-OCI/4155-SVC, a fin de que la Entidad adopte las acciones preventivas o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20141418557**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000023-2026-CG/4155
2. INFORME DE VC N° 016-2026-OCI-4155-SVC[F][F][F][F][F][F]
3. OFICIO N° 1003-2026-MPH-OCI[F]

NOTIFICADOR : ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AUQUAAN**

Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 19:02:30 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000023-2026-CG/4155

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1003-2026-MPH/OCI
EMISOR	:	ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20141418557
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° FOLIOS	:	23

Sumilla: Se remite el Informe de Visita de Control N° 016-2026-OCI/4155-SVC, a fin de que la Entidad adopte las acciones preventivas o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME DE VC N° 016-2026-OCI-4155-SVC[F][F][F][F][F][F]
2. OFICIO N° 1003-2026-MPH-OCI[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ANWH6D6**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Órgano de Control Institucional

REG. DOCUMENTO: 2610086
REG. EXPEDIENTE: 877905

Huacho, 21 de setiembre de 2026

OFICIO N° 1003-2026-MPH/OCI

Señor:
Santiago Yuri Cano La Rosa
Alcalde
Municipalidad Provincial de Huaura
Calle Colón n.° 150
Huacho /Huaura /Lima

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 016-2026-OCI/4155-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, publicada 23 de julio de 2002 y modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la Visita de Control realizada a la Obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUACHACAN A LA ALTURA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE AYARANGA, DISTRITO DE PACCHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2472644**, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 016-2026-OCI/4155-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por AGUILAR ZELADA Rosa Yesenia FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-09-2026 18:52:13 -05:00

Rosa Yesenia Aguilar Zelada
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huaura
Cód. CGR N° 62212

RYAZ
C.c. Archivo
