CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 034-2026-OCI/6042-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE, VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PIURA - PIURA

"EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FENÓMENO EL NIÑO 2026 Y 2027 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE"

PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 2 DE JULIO DE 2026 AL 12 DE OCTUBRE DE 2026

TOMO I DE I

VEINTISÉIS DE OCTUBRE, 16 DE OCTUBRE DE 2026

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 034-2026-OCI/6042-SVC

"EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FENÓMENO EL NIÑO 2026 Y 2027 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	N° Pág.
I.	ORIGEN	2
II.	OBJETIVOS	2
III.	ALCANCE	2
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD	2
V.	SITUACIONES ADVERSAS	3
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	31
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	31
VIII.	CONCLUSIÓN	31
IX.	RECOMENDACIONES	32
	APÉNDICES	33

Firmado digitalmente por
MORE ZAPATA Sandra Maribel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por
RAMIREZ HUASASQUICHE
Ingrid Aleida FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por
CORDOVA CORDOVA Julio
Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 034-2026-OCI/6042-SVC

"EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FENÓMENO EL NIÑO 2026 Y 2027 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) mediante oficio n.° 000515-2026-CG/OC6042 de 30 de setiembre de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con la Orden de Servicio n.° 6042-2026-030, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, publicada el 31 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si la ejecución presupuestal y las acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, se realizan de manera oportuna y conforme a las declaratorias de Estado de Emergencia, el Plan de Acción Ante Lluvias Intensas MDVO-2026 y a la normativa aplicable.

2.2. Objetivos específicos

Determinar si la ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068, así como la formulación, contratación, seguimiento y conformidad de las fichas técnicas de intervención para la limpieza y descolmatación de drenes, se efectúan de manera oportuna y conforme a la normativa de presupuesto público, gestión del riesgo de desastres y contrataciones públicas, los términos de referencia y las órdenes de servicio, en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia vigente.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló a la "Ejecución presupuestal y acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre", en adelante, el "Proceso", el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, en adelante, la "Entidad", la cual se encuentra bajo el ámbito de control de este OCI, y que ha sido ejecutada de 30 de setiembre de 2026 al 6 de octubre de 2026, ubicada en la prolongación Av. Grau Mz. N Lote 01 A.H. Las Capullanas en el distrito de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Mediante Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026, se declaró el Estado de Emergencia en setecientos noventa y seis (796) distritos del país, entre ellos el distrito de Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, las cuales deben tener nexo directo de causalidad con el evento.

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Posteriormente, mediante Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de setiembre de 2026, se declaró el Estado de Emergencia en ochocientos noventa y tres (893) distritos del país, entre ellos el distrito de Veintiséis de Octubre, por el mismo peligro y por un plazo de sesenta (60) días calendario, para que se tomen las mismas medidas y acciones.

En dicho contexto, el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Entidad elaboró el Plan de acción ante lluvias intensas MDVO-2026, alcanzado a este OCI con oficio n.° 084-2026-GM/MDVO de 20 de julio de 2026, en el que se identificaron los drenes y quebradas del distrito que requieren limpieza y descolmatación. Para tal fin, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (SGRD), en calidad de área usuaria, requirió la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de trece (13) fichas técnicas de intervención, con cargo a la categoría presupuestal 0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", meta 0128, cadena funcional 19.016.0036.0068.3000001.5006144, clasificador de gasto 2.3.2 7.14 98, mediante contratos menores con un plazo de ejecución de veinte (20) días calendario.

Sin embargo, de la revisión al estado situacional de las fichas técnicas remitido por la Entidad mediante los oficios n.° 232-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 17 de setiembre de 2026 y 192-2026-GM/MDVO de 5 de octubre de 2026, se advierte que, transcurridos cuarenta y ocho (48) y sesenta y seis (66) días calendario desde la emisión de la mayoría de las órdenes de servicio, solo un grupo reducido contaba con la conformidad correspondiente. Las demás se encontraban pendientes de aprobación, con observaciones o en trámite de resolución de contrato.

Por su parte, de acuerdo con la consulta de ejecución del gasto (Consulta Amigable) del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Entidad registra un avance de ejecución menor al 32,00% en la categoría presupuestal 0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", pese a la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y a la proximidad de la temporada de lluvias.

Asimismo, el 30 de setiembre de 2026, este OCI efectuó la inspección física del Dren Marcavelica y del tramo II del Dren Petroperú[1] a fin de verificar el estado de avance en la ejecución física de los servicios previstos.

En tal sentido, el Proceso se encuentra en la fase de ejecución presupuestaria y acciones, en la que la mayoría de las intervenciones de limpieza y descolmatación de los drenes priorizados, se encuentran en la etapa de elaboración de fichas técnicas con incumplimientos de los proveedores[2], a pesar de encontrarse vigente la declaratoria de Estado de Emergencia.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

V. SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

De la revisión y análisis efectuados a la información que sustenta la ejecución presupuestal de la Entidad al 12 de octubre de 2026 y los documentos administrativos que determinan el estado de las acciones implementadas en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del Proceso, las cuales se encuentran sustentadas en el Informe Técnico n.° 005-2026-CG/OC6042-MAGD de 12 de octubre de 2026, y se exponen a continuación:

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[1] Acta de Visita de Inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA y en el Acta de Visita de Inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II, de 30 de setiembre de 2026

[2] Excepto la ficha técnica del Dren Víctor Maldonado (O/S n.° 2226), la cual es materia de un servicio de Control Concurrente, por lo que no forma parte del alcance del presente servicio.

1. **LA ENTIDAD REGISTRA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE 31,2% EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068, A CUARENTA Y UN (41) DÍAS DE DECLARADO EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO; SITUACIÓN QUE LIMITA LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO, AFECTANDO A LOS HABITANTES DE ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES EN EL DISTRITO.**

Mediante Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de julio de 2026, se declaró el Estado de Emergencia en setecientos noventa y seis (796) distritos del país, entre ellos el distrito Veintiséis de Octubre, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, vigente del 3 de julio al 31 de agosto de 2026. Posteriormente, mediante Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de setiembre de 2026, se declaró nuevamente el Estado de Emergencia en el distrito por el mismo peligro y por igual plazo, vigente del 2 de setiembre al 31 de octubre de 2026. En ambos dispositivos, se dispuso que los gobiernos locales comprendidos ejecuten las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación, con cargo a su presupuesto institucional.

En los gobiernos locales, dichas acciones se financian a través del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" (en adelante, PP 0068), cuya Actividad 5006144 "Atención de actividades de emergencia" recibe las modificaciones presupuestarias autorizadas por el artículo 51 de la Ley n.° 32513[3], Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, publicada el 4 de diciembre de 2025; asimismo, el artículo 52 de dicha ley autoriza el uso de recursos para la limpieza y descolmatación de cauces, canales y drenes, que se ejecutan en el mismo programa.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

No obstante, de la consulta efectuada el 12 de octubre de 2026 al aplicativo Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto) del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se advierte que la Entidad cuenta en el PP 0068 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/3 530 685,00, del cual solo ha devengado S/1 102 277,00, lo que representa un avance de 31,2 %, inferior al 68,0 % que registra la Entidad en la ejecución total de su presupuesto, conforme se muestra a continuación:


Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

---

3 La Ley n.º 32513, dispone:
"[…]
Artículo 51.- Autorización para efectuar modificaciones presupuestarias para la atención del peligro inminente y de desastres e información sobre bienes de ayuda humanitaria
[…]
Dichas modificaciones presupuestarias financian la Actividad "5006144. Atención de Actividades de Emergencia" del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
[…]
Artículo 52.- Recursos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres
52.1 Se autoriza, en forma excepcional, en el Año Fiscal 2026, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, y hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos efectivamente transferidos por concepto del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), así como para incorporar los saldos de balance generados por dicho Fondo, para ser destinados al financiamiento de las siguientes actividades: i) la limpieza o descolmatación del cauce de ríos y quebradas, canales y drenes; ii) la protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo; […]; y, vii) las actividades comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobado por la instancia correspondiente, […]. Los recursos autorizados por el presente artículo se ejecutan en el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres".
[…]".
[El subrayado es agregado].

Imagen n.° 1
Ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre

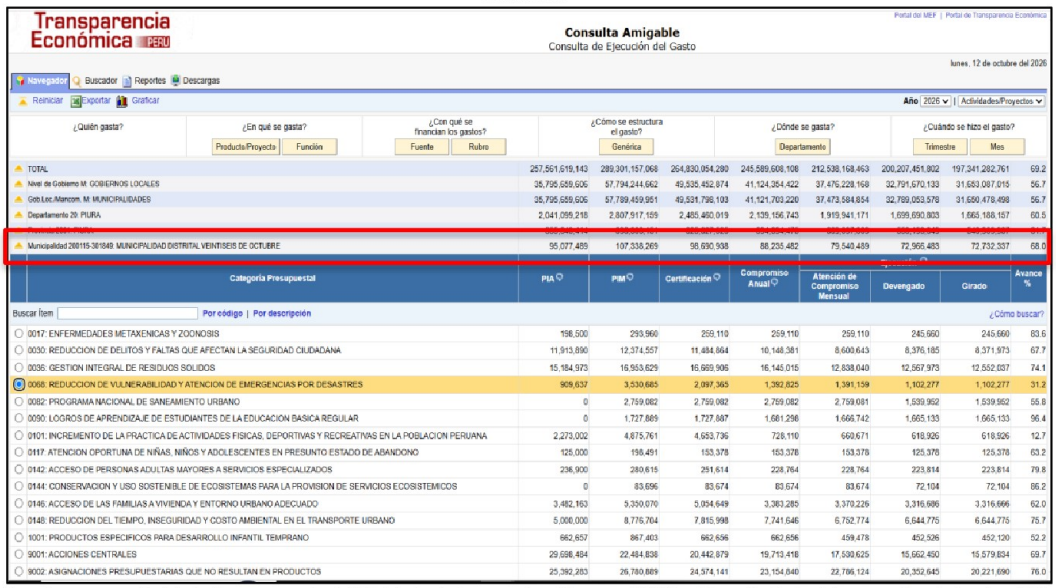

Fuente: Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Consulta Amigable, consulta efectuada el 12 de octubre de 2026 en https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx .
Elaborado por: Comisión de Control.

Cabe precisar que el **PIM** del **PP 0068** se incrementó de S/909 637,00 (Presupuesto Institucional de Apertura - PIA) a **S/3 530 685,00**; sin embargo, a la fecha de la consulta, **S/1 433 320,00** (40,6 % del PIM) no contaban con certificación de crédito presupuestario y **S/2 428 408,00** se encontraban pendientes de devengar.

Dicho nivel de ejecución se registra cuando han transcurrido ciento dos (102) días calendario desde el inicio de la primera declaratoria[4] y cuarenta y uno (41) de los 60 (sesenta) días de vigencia declarados en el Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, y cuando la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), mediante **Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026**[5], de 28 de setiembre de 2026, mantiene la alerta de "**El Niño costero**" y prevé precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte para el trimestre **octubre–diciembre** de 2026.

Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que, entre octubre y diciembre de 2026, la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical central y oriental alcance niveles récord, lo que evidencia el fortalecimiento del Fenómeno El Niño. Según la OMM, existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027, y podría convertirse en uno de los más intensos desde al menos 1950, con efectos sobre los patrones climáticos, las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo[6].

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[4] Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026.

[5] Según el comunicado precisa que:
"[…]
Para el trimestre octubre – diciembre, precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y valles de la vertiente occidental andina norte. No se descarta la ocurrencia de episodios puntuales de lluvia de moderada a fuerte intensidad, concentrándose principalmente en la costa norte, tal como se han venido presentando en los últimos días en la región costera de Tumbes. Esta condición favorecería a un incremento de los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, la Leche y Jequetepeque, principalmente. […]".

[6] Organización Meteorológica Mundial (OMM). Comunicado de prensa "Sea-surface temperatures reflect strengthening El Niño", 8 de octubre de 2026 (traducción libre). Disponible en: https://wmo.int/news/media-centre/sea-surface-temperatures-reflect-strengthening-el-nino

Por su parte, la **Ley n.° 29664**, **Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)**, publicada el 19 de febrero de 2011, asigna a las entidades públicas, el deber de identificar oportunamente riesgos, generar alertas tempranas y adoptar medidas preventivas antes de la ocurrencia del daño, a fin de evitar que se repitan los episodios ocurridos en los años **1982-1983 y 1997-1998** que generaron pérdidas estimadas por el SENAMHI en US$3 283 millones y US$3 500 millones respectivamente[7], producto de la interrupción simultánea de infraestructura vial, producción, transporte y servicios esenciales.

En tal sentido, el bajo avance de ejecución presupuestal en el PP 0068, principal instrumento presupuestal para financiar las acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, reduce la capacidad de la Entidad para intervenir oportunamente en las zonas expuestas a inundación pluvial del distrito, donde reside una población de 114 875 habitantes, de los cuales 93 264[8] habitantes (81,2%) se ubican en zonas de riesgo muy alto.

La normativa aplicable a la situación expuesta es la siguiente:

- ✓ **Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada mediante Ley n.° 29664, publicada el 19 de febrero de 2011, y modificatorias.**

"[…]
Artículo 6.- Componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
6.1 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se establece sobre la base de los siguientes componentes:
[…]
***b. Gestión correctiva:** Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente.*
***c. Gestión reactiva:** Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.*
[…]
6.2 La implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con los siguientes procesos:
[…]
***b. Prevención y reducción del riesgo:** Acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.*
[…]
Artículo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento.
14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres.
[…]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[7] Extraído del Inventario de Datos de Eventos de Inundaciones del Perú: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-99.pdf
[8] Cantidad de población expuesta a inundación extraída del cuadro n.° 3 del "Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (2026)", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026.

- ✓ **Decreto Legislativo n.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado el 16 de setiembre de 2018, y modificatorias.**

"[…]
Artículo 2.- Principios
[…]
5. Orientación a la población: *Consiste en que el Proceso Presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno.*
6. Calidad del Presupuesto: *Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.*
[…]
Artículo 7. Titular de la Entidad
[…]
7.3 El Titular de la Entidad es responsable de:
1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad.
2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, en coordinación con el responsable de los Programas Presupuestales, según sea el caso.
3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente.
[…]".

- ✓ **Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, aprobada mediante Ley n.° 32513, publicada el 4 de diciembre de 2025, y modificatorias.**

"[…]
Artículo 5.- Control de gasto público
5.1 Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del artículo7 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
[…]

Artículo 51. Autorización para efectuar modificaciones presupuestarias para la atención del peligro inminente y de desastres e información sobre bienes de ayuda humanitaria
51.1 Se autoriza, durante el Año Fiscal 2026, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados en el rubro canon y sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, en el rubro Fondo de Compensación Regional (FONCOR), en los rubros Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), e Impuestos Municipales, y Recursos Directamente Recaudados, así como para incorporar los saldos de balance provenientes del canon y sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, FONCOR, FONCOMUN e Impuestos Municipales, a fin de financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y/o la rehabilitación en las zonas en desastre producto del impacto de peligros generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana, de los niveles 4 y 5 a los que se refiere el artículo 43 del Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo 048-2011-PCM, y que cuenten con declaratoria de estado de emergencia vigente por desastre o peligro inminente por la autoridad competente.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Dichas modificaciones presupuestarias financian la Actividad "5006144. Atención de Actividades de Emergencia" del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
[…]

Artículo 52. Recursos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres
52.1 Se autoriza, en forma excepcional, en el Año Fiscal 2026, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera, y hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos efectivamente transferidos por concepto del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), así como para incorporar los saldos de balance generados por dicho Fondo, para ser destinado al financiamiento de las siguientes actividades: i) la limpieza y/o descolmatación del cauce de ríos y quebradas, canales y drenes; ii) la protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo; iii) el control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos; iv) la revegetación y mantenimiento de especies nativas; v) el tratamiento de cabeceras de cuencas en Gestión del Riesgo de Desastres; vi) diques para el control de cárcavas; y, vii) las actividades comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobado por la instancia correspondiente, el cual debe contar con la opinión técnica favorable del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y publicarse en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID). Dichas actividades se ejecutan en los puntos críticos identificados y/o ámbitos geográficos determinados con niveles de peligro ylo riesgo de nivel alto y muy alto ante inundaciones, aluviones, deslizamientos de tierras, flujo de detritos (huaycos), sismos, bajas temperaturas, sequías e incendios forestales, identificados y georreferenciados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) del pliego Ministerio de Defensa, y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), según corresponda y publicados en el SIGRID y/o en las sedes digitales de las citadas entidades. Los recursos autorizados por el presente artículo se ejecutan en el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres".
[…]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

✓ **Reglamento de la Ley n.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, publicado el 26 de mayo de 2011, y modificatorias.**

"[…]
TÍTULO V
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL
[…]
CAPÍTULO II
ESTRATEGIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL RIESGO DE DESASTRES.

Artículo 41.- Definición
[…]
41.5 Las entidades públicas priorizan la asignación de recursos presupuestales, para el desarrollo de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastre, preferentemente en lo referido a la atención de emergencias y el proceso de reconstrucción.
[…]

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Artículo 49.- Acciones ante situación de peligro inminente
[…]
49.2 Las acciones a desarrollarse deben estar dirigidas únicamente a reducir el impacto del probable desastre por ocurrir y deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, a fin de salvaguardar la seguridad de la población, sus bienes y la infraestructura pública.
[…]

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

TÍTULO VI
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
Artículo 67.- Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre.
[...]
67.2 La Declaratoria del Estado de Emergencia tiene por finalidad la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias, frente a un peligro inminente o a la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del Gobierno Regional, protegiendo la vida e integridad de las personas, el patrimonio público y privado y restableciendo los servicios básicos indispensables.
[...]".

- ✓ **Decreto Supremo n.º 097-2026-PCM, que declara El Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y La Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, publicado el 2 de julio de 2026.**

"[…]
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes; […].

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
[…]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

- ✓ **Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, publicado el 1 de setiembre de 2026.**

  "[…]
  Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
  Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
  Artículo 2.- Acciones a ejecutar
  Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
  Artículo 3.- Financiamiento
  La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
  […]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

La situación expuesta, limita la oportuna implementación de medidas de reducción del riesgo, afectando a los habitantes de zonas expuestas a inundaciones en el distrito; debido a que, la Entidad registra un avance de ejecución de 31.2% en el Programa Presupuestal 0068, a cuarenta y un (41) días de declarado el estado de emergencia por el Fenómeno El Niño.

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

2. FALTA DE APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, IMPIDE EL INICIO DE LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN NUEVE (9) DRENES Y LA QUEBRADA PAJARITOS, PESE A SU COLMATACIÓN Y AL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO 2026-2027, GENERANDO EL RIESGO DE DESBORDES E INUNDACIONES, AFECTANDO A LA POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Con la finalidad de verificar las acciones adoptadas por la Entidad para la reducción del riesgo en el marco del Estado de Emergencia, la Comisión de Control evaluó la documentación correspondiente a once (11) drenes y una (1) quebrada del casco urbano del distrito, identificados por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres en el Informe n.° 462-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 14 de julio de 2026 y en el "Plan de Acción ante Lluvias Intensas del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la MDVO – 2026" (en adelante, el Plan).

Asimismo, el 30 de setiembre de 2026 se efectuó la inspección física del Dren Marcavelica y del tramo II del Dren Petroperú.

Con relación al Plan de Acción:

La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres elaboró el: "*Plan de Acción ante Lluvias Intensas del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la MDVO – 2026"*, con la finalidad de prevenir posibles emergencias por lluvias intensas correspondientes al 2026, el cual fue aprobado por el titular de la Entidad mediante Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026[9].

En dicho plan, se identificó el estado actual de ocho (8) drenes[10] y una (1) quebrada, de las cuales sus cajas hidráulicas se encuentran colmatadas, por lo que, ante lluvias intensas, generarían desbordes (numeral 3.2 del Plan), conforme se detalla a continuación:

"[…]
3.2 Desborde de drenes
El Distrito en su jurisdicción tiene aproximadamente 12 drenes dentro del casco urbano, como DREN PETRO PERÚ, DREN MARCAVELICA, DREN JAPON - TURQUIA, DREN VICTOR MALDONADO, DREN 66, DREN CERO, DREN ENACE, DREN PAREDES MACEDA, DREN TELEFONICA, DREN VILLA HERMOSA y DREN POMACAHUA y se desplazan en la mayoría hacia la laguna de los Humedales de Santa Julia y la Laguna "Los Patos" sector Coscomba, ubicada en el mismo distrito, allí se descarga las aguas recolectadas de las cuencas ciegas de diferentes zonas del distrito, sus infraestructuras hidráulicas son a tajo abierto y su sección geométrica es trapezoidal. Abarca varios asentamientos humanos y posesiones informales en su gran mayoría.

El estado situacional de las cajas hidráulicas de los drenes se encuentran colmatada (con presencia de arena, arcilla, vegetación, y con residuos de desechos de, material de construcción y basura), por lo que no cuenta con la capacidad suficiente de descargar el flujo de avenidas pluviales, y ante la ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño y/o Yaku generaría desborde de aguas pluviales, motivo que ante un evento de un niño costero urge la necesidad de intervenir con suma premura en la limpieza y descolmatación del drenaje pluvial de los citados drenes […].

3.2.1. Estado Situacional de Dren Turquía – Japón
El dren pluvial se desplaza en dirección Noroeste hacia la laguna "Los patos", ubicada en el mismo distrito, donde descarga las aguas recolectadas de las cuencas ciegas del Chilca e Ignacio Merino, su infraestructura hidráulica es a tajo abierto y su sección geométrica es trapezoidal. Abarca varios asentamientos humanos ubicados en su zona de influencia. La caja hidráulica del drenaje se encuentra colmatada (con presencia de arena y arcilla con presencia de vegetación), por lo que no cuenta con la capacidad suficiente de descargar el flujo de avenidas pluviales, originando desbordes en varios tramos por lo que es necesario y urgente la limpieza total del dren Turquía – Japón.
[…]
C) ACCIONES:
- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado en la caja hidráulica del dren de evacuación pluvial, con su extracción permitirá la recuperación de la sección hidráulica, para su ejecución se utilizará maquinaria pesada)*

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[9] Según la Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026:
"[…]
***SE RESUELVE**:*
***ARTÍCULO PRIMERO**. - APROBAR el PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE (2026), […].*
[…]".

[10] Excepto el Dren Víctor Maldonado, el cual es materia de un servicio de Control Concurrente, por lo que no forma parte del alcance del presente servicio.

3.2.2. Estado Situacional de Dren 66

Dren 66, es un dren que nace de la Laguna Los Humedales de Santa Julia del distrito de Veintiséis de Octubre y desemboca en el Dren Sechura que corresponde al distrito de Catacaos, tiene una longitud de aproximadamente 1,498.77 m, del Dren 66 nace el brazo del Dren Cero, Dren Cesar Vallejo llega a desembocar sus aguas en el Dren 66 y Dren Cero.

La situación actual del dren 66 es que se encuentra colmatado de maleza, lo que ha generado que pierda la zanjas de drenantes en algunas partes, debido a la totora impidiendo el flujo de su escorrentía de las aguas. En Épocas de lluvia su capacidad portante es insuficiente por lo que llega a desbordarse en las zonas colindantes afectando a varios sectores emplazados en el distrito. Por ello, ante la ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño, urge la necesidad de intervenir con acciones de mitigación de la limpieza y descolmatación del Dren 66 y Dren Cero, a fin de reforzar su sistema de drenaje en el consolidación y estabilización de taludes del citado dren.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado en la caja hidráulica del dren de evacuación pluvial, con su extracción permitirá la recuperación de la sección hidráulica, para su ejecución se utilizará maquinaria pesada)*

[…]

3.2.4. Estado Situacional de Dren Marcavelica

El Dren Marcavelica tiene un trazo de conducto cerrado de 600 m aproximadamente que inicia en el sector las Malvinas a 100 m de la Av. Don Bosco frente a la Mz. E-L2 y discurre hacia el AH Santa Julia frente, donde vierte sus aguas en la Laguna de Los Humedales de Santa Julia, actualmente se encuentra colmatado de vegetación, residuos de material de construcción, su sección hidráulica ha sido obstruida impidiendo la escorrentía de las aguas pluviales, de presentarse un periodo lluvioso generaría un desborde inundación causando daños de infraestructura pública y privada.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación de la desembocadura del dren siendo un total de 100 m, eliminando el excedente de vegetación y residuos*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado)*

[…]

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

3.2.5. Estado Situacional de Dren Petro Perú

El dren Petro Perú es un dren a tajo abierto traslada escorrentías pluviales, tramos de trazo natural, tramos de trazo tipo canal vía hacia el dren Maldonado y trazos que son cortados por vías vehiculares (Av. José Carlos Mariátegui, Calle Morropón y Av. Chulucanas).

[…]

C) ACCIONES:

- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado.*
- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, eliminando el excedente de vegetación y residuos*

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

3.2.6. Estado Situacional de Dren Enace (Dunas)

El Dren ENACE (Dunas), ubicado distrito de Veintiséis de Octubre, presenta una longitud aproximada de 757 m y una caja hidráulica de aproximadamente 7 m. El trazo del dren se desarrolla desde el punto de inicio con coordenadas UTM WGS-84 Zona 17 (Norte: 9 427 783.22 / Este: 534 651.62) hasta el punto final con coordenadas (Norte: 9 427 119.60 / Este: 534 333.42), atravesando zonas colindantes como la UPIS Las Dunas, el A.H. Ciudad del Sol y el Conjunto Habitacional Micaela Bastidas ENACE IV Etapa. Actualmente, el dren se encuentra colmatado por acumulación de vegetación, residuos sólidos y material de construcción, lo que ha reducido significativamente su sección hidráulica, impidiendo la adecuada escorrentía de las aguas pluviales. Ante la ocurrencia de un periodo lluvioso intenso, esta situación podría generar desbordes e inundaciones, ocasionando daños a la infraestructura pública y privada de las zonas aledañas.

[…]

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes reforzando su talud.*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en remoción del material acumulado en la caja hidráulica*

3.2.7. Estado Situacional de Dren Paredes Maceda

La intervención tiene como finalidad realizar la descolmatación del tramo final del Dren Paredes Maceda, con una longitud aproximada de 45.9 m, correspondiente al sector donde desemboca sus aguas en el Dren Maldonado. Dicho tramo se encuentra colmatado por acumulación de vegetación, sedimentos y residuos, lo que ha reducido su sección hidráulica e impide la adecuada evacuación de las aguas pluviales, incrementando el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas colindantes durante eventos de lluvia.

[…]

ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes reforzando su talud*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en la remoción del material acumulado en la caja hidráulica.*

3.2.8. Estado Situacional de Dren Telefónica

El Dren Telefónica, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, cuenta con una longitud aproximada de 142 m y una caja hidráulica de 6 m. Colinda con las zonas A.H. Villa Perú Canadá, Nueva Esperanza y San Sebastián. Actualmente, puede presentar acumulación de sedimentos, vegetación o residuos que limiten la escorrentía de aguas pluviales, lo que podría generar desbordes e inundaciones en las áreas adyacentes durante períodos de lluvia intensa.

[…]

ACCIONES:

- *Realizar la limpieza de material excedente y limpieza de la vegetación*

Firmado digitalmente por
MORE ZAPATA Sandra Maribel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

3.2.9. Estado Situacional del Dren Mateo Pomacahua

El tramo final del Dren Mateo Pomacahua, con una longitud aproximada de 40 m, ubicado en el sector colindante con A.H. Villa Perú Canadá, se encuentra afectado por acumulación de sedimentos, vegetación y residuos. Esta condición ha reducido la sección hidráulica, limitando la escorrentía de aguas pluviales y aumentando el riesgo de desbordes e inundaciones en las áreas aledañas durante periodos de lluvia intensa.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación de la desembocadura del dren siendo, eliminando el excedente de residuos*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado*

Firmado digitalmente por
RAMIREZ HUASASQUICHE
Ingrid Aleida FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

[…]

3.3. Desborde de la Quebrada Pajaritos

Otra de las zonas críticas más importantes es Quebrada Pajaritos, la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, en base a su mandato, realizó un recorrido in situ por la zona a las zonas más afectadas por inundaciones climáticas en años anteriores, como es el caso de FEN 2017 y YAKU 2023, las cuales se encontraron en mal estado en la convivencia de Quebrada Pajaritos, de los puntos anteriores, se confirma que existe material de relleno de escombros de construcción y basura arrojados por personas inescrupulosas, lo que se suma a la vegetación existente, que no permite que el agua fluya naturalmente para descargar su caudal, debido a que el estrangulamiento en muchos tramos.

Firmado digitalmente por
CORDOVA CORDOVA Julio
Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Asimismo, la quebrada no ha tenido intervención de la descolmatación y limpieza en años por parte de las entidades a cargo tanto del ANA y de la Junta de Regantes del Bajo Piura, este hecho agrava más al punto de que en época de lluvias intensas sea el motivo de colapso en varios puntos de la quebrada, afectando a terrenos agrícolas privados y públicos, daños en la infraestructura y pérdidas de ganadería producto de la acumulación de sedimentos, maleza y residuos sólidos, lo que reduce su capacidad de flujo y aumenta el riesgo de inundaciones durante temporadas de lluvias intensas.

[…]

IV. ACCIONES A EJECUTAR
4.1. Acciones Estructurales
[…]
4.2. Acciones No Estructurales

- *Intervención "Limpieza y tratamiento de las cajas hidráulicas, eliminación de excesos, en los Drenes de PETRO PERÚ, DREN MARCAVELICA, DREN JAPON - TURQUIA, DREN VICTOR MALDONADO, DREN 66, DREN CERO, DREN ENACE, DREN PAREDES MACEDA, DREN TELEFONICA y DREN POMACAHUA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE – PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA".*

[…]".

Con relación al Estado de Emergencia:

Mediante Decreto Supremo n.º 097-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de julio de 2026, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de sesenta (60) días calendario, vigente del 3 de julio de 2026 al 31 de agosto de 2026 en determinados distritos del país[11], para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Posteriormente, a través de Decreto Supremo n.º 124-2026-PCM, publicado el 1 de setiembre de 2026, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de sesenta (60) días calendario, vigente del 2 de setiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026 en determinados distritos del país[9], para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Con relación a las acciones de la Entidad:

Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, la Entidad contrató la elaboración de trece (13) fichas técnicas bajo la modalidad de contrataciones menores (iguales o inferiores a 8 UIT), con un plazo de ejecución de veinte (20) días calendario, de las cuales doce (12) correspondían a drenes y una (1) a la quebrada Pajaritos; sin embargo, las notificaciones a los respectivos proveedores se efectuaron entre el 22 de julio y el 3 de agosto de 2026, esto es, entre diecinueve (19) y treinta y un (31) días calendario posteriores al inicio del referido decreto, advirtiéndose además que los días 12 y 17 de agosto de 2026 se notificaron las órdenes de servicio correspondientes a las fichas de los Drenes 66 y Cero, conforme al detalle siguiente:

Cuadro n.° 1
Órdenes de servicio para la elaboración de fichas técnicas

O/S n.°	Fecha de notificación	Proveedor	Dren / quebrada	Monto (S/)
0001971	23/07/2026	M & J Y CIA E.I.R.L.	Dren Pumacahua	14 010,00
0001974	23/07/2026	Pintado Bure Bryam	Dren Villa Perú Canadá	14 010,00
0002021	22/07/2026	Chumacero Mena Johnny Darwin	Dren Telefónica	15 500,00
0002179	30/07/2026	Ojeda Castillo Dagner Nayid	Dren Japón Turquía	17 250,00
0002224	31/07/2026	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	Dren Villa Hermosa	16 100,00
0002225	31/07/2026	Colchado Díaz Carlos David Orestes	Dren Marcavelica	14 900,00
0002226 (*)	31/07/2026	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	Dren Víctor Maldonado	19 800,00
0002227	31/07/2026	CEPA Constructora & Servicios Generales S.A.C.	Dren Petroperú Tramo II	16 900,00
0002228	31/07/2026	Rumiche Chávez César Augusto	Dren ENACE	14 900,00
0002229	31/07/2026	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	Dren 31 de Enero	14 200,00
0002270	03/08/2026	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	Quebrada Pajaritos	19 250,00

[11] Entre ellos el distrito Veintiséis de Octubre.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

O/S n.°	Fecha de notificación	Proveedor	Dren / quebrada	Monto (S/)
0002567	17/08/2026	Cardoza Remirez Lonardo Agustin	Dren Cero	16 970,00
0002439	12/08/2026	Cardoza Remirez Lonardo Agustin	Dren 66	15 150,00
			Total	**208 940,00**

Fuente: Oficio n.° 232-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 18 de septiembre de 2026, con sus anexos; Informe n.° 1263-2026-MDVO-OGA-OFIC.ABAST de 5 de agosto de 2026, con sus anexos.
Elaborado por: Comisión de Control.
(*) Materia de un servicio de Control Concurrente, no comprendida en el alcance del presente servicio.

No obstante, al 17 de setiembre de 2026, fecha en la cual habían transcurrido cuarenta y ocho (48) días calendario desde la notificación de la mayoría de las órdenes de servicio y había vencido la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, solo cuatro (4) fichas técnicas contaban con la conformidad del área usuaria y únicamente una de ellas, correspondiente al Dren Víctor Maldonado (excluido del alcance), disponía de resolución de aprobación[12].

Posteriormente, mediante el oficio n.° 192-2026-GM/MDVO del 5 de octubre de 2026[13], la Entidad informó sobre el estado situacional actualizado a dicha fecha, evidenciando que de las diez[14] (10) fichas correspondientes a los nueve (9) drenes y la quebrada pendientes de intervención, ninguna contaba con resolución de aprobación; encontrándose cinco (5) con conformidad en trámite de aprobación, tres (3) en revisión u observadas, y dos (2) con solicitud de resolución o anulación de la orden de servicio, conforme al detalle siguiente:

Cuadro n.° 2
Estado situacional de las fichas técnicas de las intervenciones informado por la SGRD

N°	Ficha técnica	O/S n.°	Proveedor	Longitud (m)	Estado situacional informado al 17 de setiembre de 2026	Estado situacional informado al 5 de octubre de 2026
1	Dren 31 de Enero	0002229	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	280,00	Con conformidad de ficha técnica (Informe n.° 623-2026-MDVO-GSC-SGGRD).	Con conformidad de ficha técnica (Informe n.° 623-2026-MDVO-GSC-SGGRD); conformidad de la O/S mediante Informe n.° 742-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 08/09/2026.
2	Dren ENACE	0002228	César Augusto Rumiche Chávez	760,17	Levantamiento de observaciones presentado el 02/09/2026; en estado de revisión.	Levantamiento de observaciones presentado el 02/09/2026; en proceso de revisión y aprobación por el área usuaria.
3	Dren Víctor Maldonado (*)	0002226	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	4 680,00	Con conformidad; Resolución de GDU n.° 159-2026-MDVO/GDU de 28/08/2026.	Con conformidad de ficha técnica (Informe n.° 623-2026-MDVO-GSC-SGGRD); Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.° 159-2026-MDVO/GDU de 28/08/2026.
4	Dren Japón Turquía	0002179	Dagner Nayid Ojeda Castillo	1 535,00	Ejecutado mediante convenio de colaboración interinstitucional con el MVCS.	Ejecutado mediante convenio de colaboración interinstitucional con el MVCS; conformidad de la O/S mediante Informe n.° 829-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 29/09/2026.
5	Dren Petroperú Tramo II	0002227	CEPA Constructora & Servicios Generales S.A.C.	1 237,00	Observaciones comunicadas al consultor el 09/09/2026.	Observaciones comunicadas al consultor el 09/09/2026.
6	Dren Marcavelica	0002225	Carlos David Orestes	170,00	Solicitud de resolución de la O/S y penalidad	Solicitud de resolución de la O/S y penalidad máxima (Informe

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[12] Información del estado situacional de las fichas, remitida por la SGRD con oficio n.° 232-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 17 de setiembre de 2026, en atención al oficio n.° 000467-2026-CG/OC6042 de 28 de agosto de 2026.
[13] Información actualizada y complementaria del estado situacional de las fichas, alcanzada por la SGRD en atención al oficio n.° 000467-2026-CG/OC6042 de 28 de agosto de 2026.
[14] Excluyendo a la ficha técnica del Dren Víctor Maldonado, materia de un servicio de Control Concurrente y no comprendida en el alcance del servicio, así como, las fichas técnicas de los drenes Japón – Turquía y 66, cuyas intervenciones ya fueron ejecutadas bajo el marco del convenio con Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).

N°	Ficha técnica	O/S n.°	Proveedor	Longitud (m)	Estado situacional informado al 17 de setiembre de 2026	Estado situacional informado al 5 de octubre de 2026
			Colchado Díaz		máxima (Informe n.° 760-2026-MDVO-GSC-SGGRD).	n.° 760-2026-MDVO-GSC-SGGRD); mediante Informe n.° 826-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 28/09/2026 se confirma la vigencia de la necesidad pública y se solicita nueva elaboración de ficha técnica.
7	Dren Telefónica	0002021	Johnny Darwin Chumacero Mena	115,97	Con conformidad de ficha técnica (Informe n.° 623-2026-MDVO-GSC-SGGRD).	Con conformidad de ficha técnica (Informe n.° 767-2026-MDVO-GSC-SGGRD); conformidad de la O/S mediante Informe n.° 828-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 29/09/2026.
8	Dren Villa Hermosa	0002224	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	1 381,60	Levantamiento de observaciones presentado el 15/09/2026; en revisión.	En la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para continuar el trámite de aprobación mediante acto resolutivo.
9	Dren Villa Perú Canadá	0001974	Pintado Bure Bryam	71,40	Levantamiento de observaciones presentado el 10/09/2026; en revisión.	En la Subgerencia de Infraestructura para aprobación mediante acto resolutivo; conformidad de la O/S mediante Informe n.° 824-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 28/09/2026.
10	Dren Pumacahua	0001971	M & J	50,00	Levantamiento de observaciones presentado el 09/09/2026; en revisión.	Levantamiento de observaciones presentado el 23/09/2026; en revisión por la Subgerencia.
11	Quebrada Pajaritos	0002270	Gamma Perú Consultores Generales E.I.R.L.	6 810,00	Solicitud de anulación/resolución de la O/S por incumplimiento (Informe n.° 682-2026-MDVO-GSC-SGGRD).	Solicitud de anulación de la O/S por incumplimiento en la entrega de información obligatoria prevista en los TDR (Informe n.° 682-2026-GSC-SGGRD).
12	Dren Cero	0002567	Leonardo Agustín Cardoza Ramírez	1 265,28	Aprobado en la SGRD.	Con conformidad (Informe n.° 762-2026-GSC-SGGRD de 16/09/2026); en la Gerencia de Desarrollo Urbano para la emisión de la resolución de aprobación técnica.
13	Dren 66	0002439	Leonardo Agustín Cardoza Ramírez	1 534,00	En trámite de resolución de la O/S por incumplimiento de presentación.	En trámite de resolución de la O/S por incumplimiento en la presentación y subsanación de observaciones (Informe n.° 763-2026-MDVO-GSC-SGGRD); la necesidad técnica fue cubierta con la intervención ejecutada mediante convenio con el MVCS.

Fuente: Oficio n.° 232-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 17 de setiembre de 2026, con sus anexos; oficio n.° 192-2026-GM-MDVO de 5 de octubre de 2026, con sus anexos.
Elaborado por: Comisión de Control.
(*) Materia de un servicio de Control Concurrente, no comprendida en el alcance del presente servicio.

Asimismo, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, se advierten los siguientes hechos relevantes:

- ✓ La ficha técnica de intervención del Dren Japón – Turquía fue remitida al Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) mediante oficio n.° 215-2026-MDVO-A, de 21 de julio de 2026, en el marco del Convenio n.° 019-2025-VIVIENDA/VMVU/PNC y su Adenda 01-2026; no obstante, la Orden de Servicio n.° 2179 para la elaboración de la ficha técnica del mismo dren fue emitida posteriormente, el 30 de julio de 2026.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

- ✓ Con Informe n.° 638-2026-MDVO-GSC-SGGRD, de 24 de agosto de 2026, la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres (SGRD) solicitó la autorización para el inicio de la ejecución física de la Ficha Técnica de Intervención n.° 009-2026-LD-PI-PIU del Dren Pluvial 66 (de 1,534 km de longitud y un presupuesto de S/107 967,40), formulada por dicha subgerencia, así como la habilitación presupuestal de los aportes a cargo de la Entidad; la ficha fue remitida al MVCS mediante oficio n.° 242-2026-MDVO/A, de 27 de agosto de 2026. Paralelamente, la Orden de Servicio n.° 2439, emitida para la elaboración de la ficha técnica del mismo dren, se encuentra en trámite de resolución **por incumplimiento de presentación.**

Aunado a ello, independientemente de que la Entidad haya identificado el estado situacional de los drenes y la quebrada de Parajitos en el "Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (2026)", la Comisión de Control decidió visitar el Dren Marcavelica y el tramo II del Dren Petro Perú, evidenciando condiciones que obstaculizan el flujo y reducen la capacidad de conducción de los drenes comprometiendo sus funcionalidades ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, situaciones que quedaron registradas en el Acta de Visita de Inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA y en el Acta de Visita de Inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II, ambas de 30 de setiembre de 2026, conforme al siguiente detalle:

<u>De la de visita de inspección al Dren Marcavelica</u>

> *"[…]*
> *1. Durante el recorrido de inspección se constató que el cauce del Dren Marcavelica presenta colmatación parcial. El tramo orientado hacia la Laguna Santa Julia, estructura receptora donde desemboca el referido dren, se encuentra obstruido por maleza densa que reduce la sección hidráulica del cauce y con acumulación de agua estancada. Por su parte, en el tramo orientado hacia el A.H. Túpac Amaru y Santa Julia Sectores A y B, se observó crecimiento parcial de vegetación herbácea y estancamiento de agua en determinados sectores. En ninguno de los tramos recorridos se evidenciaron labores de limpieza ni de descolmatación a la fecha de la visita, […]:*
> *[…]".*

Asimismo, lo señalado se evidencia en las siguientes vistas fotográficas:

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Vistas fotográficas n.° 1
Tramo de desembocadura del dren hacia la Laguna Santa Julia





Tramo de desembocadura del dren hacia la Laguna Santa Julia: cauce colmatado con maleza densa y acumulación de agua estancada.
Coordenadas UTM 17M — Fotografía n.° 1: 537612 E, 9425169 N; Fotografía n.° 2: 537598 E, 9425153 N.

Fuente: Acta de Visita de Inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Vista fotográfica n.° 2
Tramo del dren orientado hacia el A.H. Túpac Amaru y Santa Julia Sectores A y B



Tramo del dren orientado hacia el A.H. Túpac Amaru y Santa Julia Sectores A y B: crecimiento parcial de vegetación herbácea y agua estancada en determinados sectores.
Coordenadas UTM 17M: 537604 E, 9425153 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.°01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

A su vez, en la referida acta de visita de inspección, se señaló lo siguiente:

> *"[…]*
> *2. Asimismo, la representante de la SGRD de la MDVO manifestó que la elaboración de la ficha técnica para la ejecución de la intervención fue contratada a un proveedor que, a la fecha, ha incumplido sus obligaciones contractuales, por lo que se resolvió la orden de servicio. Precisó que, al persistir la necesidad, se formulará un nuevo requerimiento para la elaboración de la referida ficha técnica, en el cual se viene evaluando incluir la limpieza de una alcantarilla subterránea que forma parte del Dren Marcavelica y que conduce aportes de caudal provenientes de otros sectores, […]:*
> *[…]".*

De lo descrito en el párrafo precedente, se evidencia en las siguientes vistas fotográficas:

Vista fotográfica n.° 3
Tramo inicial de la alcantarilla subterránea, orientado hacia Santa Julia Sectores A y B



Tramo inicial de la alcantarilla subterránea, orientado hacia Santa Julia Sectores A y B, que forma parte del Dren Marcavelica con desembocadura en la Laguna Santa Julia: se encuentra libre de residuos sólidos u otros elementos que obstaculicen el flujo.
Coordenadas UTM 17M: 538049 E, 9426214 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Vistas fotográficas n.° 4
Tramo final de la alcantarilla subterránea, ubicado en Santa Julia Sectores A y B





Tramo final de la alcantarilla subterránea, ubicado en Santa Julia Sectores A y B, que forma parte del Dren Marcavelica con desembocadura en la Laguna Santa Julia: presenta acumulación parcial de residuos sólidos. Coordenadas UTM 17M — Fotografía n.° 5: 537898 E, 9425765 N; Fotografía n.° 6: 537897 E, 9425766 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Además, la citada acta de visita de inspección, señala lo siguiente:

> *"[…]*
> *3. Cabe precisar que, en el tramo inicial de la alcantarilla subterránea, se constató la presencia de personal obrero ejecutando labores de limpieza de dicha alcantarilla desde la Avenida Circunvalación, así como de otras alcantarillas con rejilla, paralelas y perpendiculares, que aportan caudal a la alcantarilla subterránea. Según lo manifestado por dichos obreros, estos fueron contratados por los moradores de la zona, quienes resultan directamente afectados ante la ocurrencia de precipitaciones y que, por tal motivo, dispusieron la intervención de la alcantarilla a fin de retirar los elementos que obstruyan el flujo normal del agua, en previsión del anunciado Fenómeno El Niño 2026-2027. Asimismo, se observó que las alcantarillas con rejilla perpendiculares que aportan caudal a la alcantarilla subterránea se encuentran colmatadas con material granular, las cuales vienen siendo limpiadas por el personal obrero identificado en campo, […]:*
> *[…]".*

Lo expuesto en el párrafo anterior, se evidencia en las siguientes vistas fotográficas:

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Vistas fotográficas n.° 5
Limpieza de los moradores de la zona a las alcantarillas con rejilla y de la alcantarilla subterránea hasta la Avenida Circunvalación

	
Alcantarilla con rejilla paralela que aporta caudal a la alcantarilla subterránea, cuya limpieza ya fue ejecutada por el personal contratado por los moradores de la zona. Coordenadas UTM 17M: 538052 E, 9426237 N.	Personal obrero contratado por los moradores de la zona ejecutando la limpieza de las alcantarillas con rejilla y de la alcantarilla subterránea hasta la Avenida Circunvalación. Coordenadas UTM 17M: 538046 E, 9426220 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Vista fotográfica n.° 6
Alcantarilla con rejilla perpendicular colmatada con material granular



Alcantarilla con rejilla perpendicular que aporta caudal a la alcantarilla subterránea, colmatada con material granular. Coordenadas UTM 17M: 538035 E, 9426216 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

De la misma manera, la referida acta de visita de inspección, señala lo siguiente:

> *"[…]*
> *4. Como resultado del recorrido efectuado, se deja constancia de que, a la fecha de la visita, el Dren Marcavelica no evidencia intervención por parte de la MDVO y presenta condiciones que obstaculizan el flujo: colmatación parcial del cauce, obstrucción por maleza densa en el tramo de desembocadura hacia la Laguna Santa Julia, estancamiento de agua, acumulación parcial de residuos sólidos en el tramo final de la alcantarilla subterránea y alcantarillas con rejilla de aporte colmatadas con material granular. Dichas condiciones reducen la capacidad de conducción del sistema de drenaje y podrían comprometer su funcionalidad ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.*
> *[…]".*

<u>De la visita de inspección al Dren Petroperú</u>

> *"[…]*
> *1. Durante el recorrido de inspección se constató que el cauce del Tramo II del Dren Petro Perú presenta colmatación parcial. El punto de inicio del tramo II, se encuentra obstruido por vegetación herbácea y residuos sólidos, con acumulación de aguas residuales estancadas. Por su parte, en los tramos intermedios se observó la presencia localizada de vegetación herbácea y residuos sólidos, así como estancamiento de aguas residuales en la totalidad de la sección del dren, condición que constituye un potencial foco infeccioso para los moradores de la zona. En ninguno de los tramos recorridos se evidenciaron labores de limpieza ni de descolmatación a la fecha de la visita, […]:*
> *[…]".*

Las siguientes vistas fotográficas evidencian lo anteriormente expuesto:

Vista fotográfica n.° 7
Tramo inicial del Dren Petroperú



Tramo inicial del dren: crecimiento parcial de vegetación herbácea, presencia de residuos sólidos y acumulación de aguas residuales estancadas. Coordenadas UTM 17M: 536998 E, 9426110 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Vistas fotográficas n.° 8
Tramo intermedio del Dren Petroperú





Tramo intermedio del dren: cauce colmatado, con crecimiento parcial de vegetación herbácea, presencia de residuos sólidos y acumulación de aguas residuales estancadas.
Fotografía n.° 11 — Coordenadas UTM 17M: 536919 E, 9425929 N.
Fotografía n.° 12 — Coordenadas geográficas: latitud -5,1932283; longitud -80,6667317.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Vistas fotográficas n.° 9
Tramo intermedio del Dren Petroperú





Tramo intermedio del dren: cauce colmatado, con crecimiento parcial de vegetación herbácea, presencia de residuos sólidos y acumulación de aguas residuales estancadas.
Fotografía n.° 13 — Coordenadas UTM 17M: 536936 E, 9425971 N.
Fotografía n.° 14 — Coordenadas geográficas: latitud -5,193275; longitud -80,666745.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

Asimismo la refererida acta de visita de inspección señala además lo siguiente:

"[…]
2. Cabe precisar que, durante el recorrido del tramo II del Dren Petro Perú, se identificó tuberías de desagüe que vienen descargando aguas residuales directamente al cauce del dren, situación que habría originado la acumulación de aguas residuales estancadas y que constituye un potencial foco infeccioso para los moradores de la zona, […]:
[…]".

A su vez, lo detallado en el párrafo precedente, se aprecia en las siguientes vistas fotográficas:

Vista fotográfica n.° 10
Tubería de desagüe expuesta, con descarga de aguas residuales al cauce del Dren Petroperú



Tubería de desagüe expuesta, con descarga de aguas residuales al cauce del dren.
Coordenadas UTM 17M: 536934 E, 9425969 N.

Fuente: Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II de 30 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

De igual manera, la citada acta de visita de inspección, señala lo siguiente:

"[…]
3. Asimismo, la representante de la SGRD de la MDVO manifestó que, a la fecha, la ficha técnica para la ejecución de la intervención no ha sido aprobada, al haber sido observada por presentar inconsistencias en su contenido, sin que el levantamiento de dichas observaciones haya sido remitido a la SGRD para su evaluación; motivo por el cual se viene evaluando la posible resolución de la orden de servicio. Adicionalmente, respecto del tramo I del Dren Petro Perú, indicó que se vienen realizando las gestiones para formular el requerimiento que permita la contratación de un proveedor para la elaboración de la respectiva ficha técnica.
[…]
4. Como resultado del recorrido efectuado, se deja constancia de que, a la fecha de la visita, el tramo II del Dren Petro Perú no evidencia intervención por parte de la MDVO y presenta condiciones que obstaculizan el flujo: colmatación parcial del cauce, obstrucción parcial por vegetación herbácea, acumulación de residuos sólidos y estancamiento de aguas residuales en la totalidad de la sección de los tramos intermedios, este último presuntamente asociado a la descarga de tuberías de desagüe al cauce. Dichas condiciones reducen la capacidad de conducción del dren hacia su estructura receptora, el Dren Maldonado, y podrían comprometer su funcionalidad ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
[…]".


Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

De la visita de inspección, se advierte que ninguno de los dos drenes evidenciaba intervención de la Entidad y que ambos presentaban colmatación parcial, maleza y vegetación herbácea, residuos sólidos y agua estancada, condiciones que reducen su capacidad de conducción; asimismo, en el Dren Marcavelica, la limpieza de la alcantarilla subterránea venía siendo ejecutada por personal contratado por los propios moradores.

Resulta relevante precisar que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), mediante Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026, de 28 de setiembre de 2026, reportó lo siguiente:

Imagen n.° 2
Alerta de El niño Costero

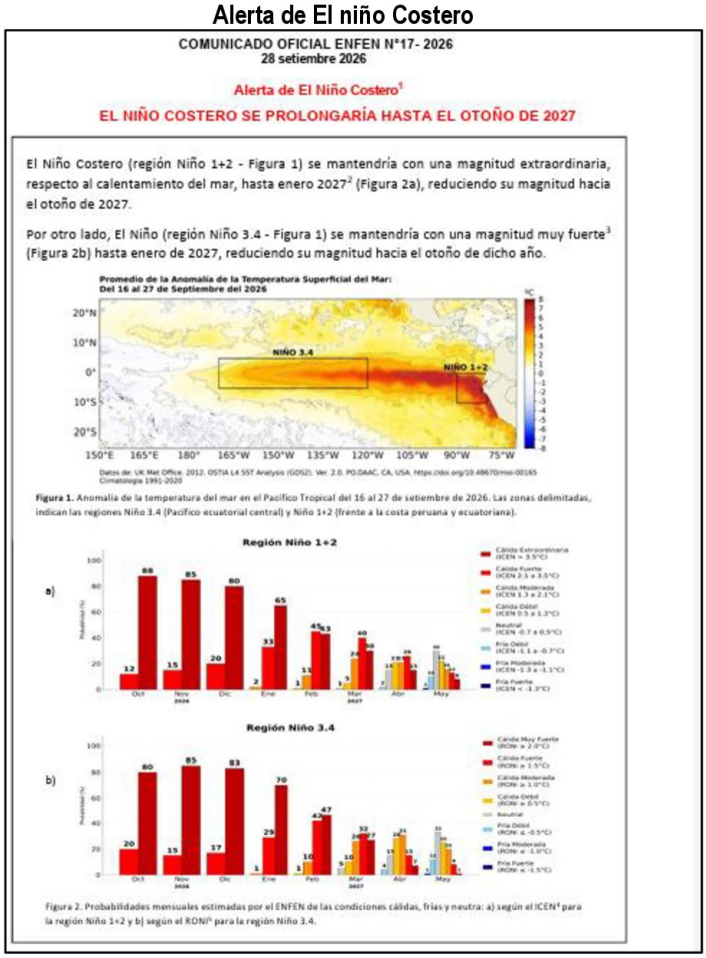

Fuente: Comunicado oficial ENFEN n.° 17-2026 de 28 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control.

Asimismo, el referido comunicado ante los escenarios anómalos del mar, prevé lo siguiente:

> *"[…]*
> *Para el trimestre octubre – diciembre, precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y valles de la vertiente occidental andina norte. No se descarta la ocurrencia de episodios puntuales de lluvia de moderada a fuerte intensidad[15], concentrándose principalmente en la costa norte, tal como se han venido presentando en los últimos días en la región costera de Tumbes. Esta condición favorecería a un incremento de los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, la Leche y Jequetepeque, principalmente.*
> *[…]".*

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[15] "Lluvias muy fuertes" se definen como el percentil 95% de la precipitación diaria; "lluvias fuertes" se definen como el percentil 90% de la precipitación diaria y "lluvias extremadamente fuertes" se definen como el percentil 99% de la precipitación diaria.

Conforme se advierte, el **ENFEN** prevé para el trimestre octubre–diciembre de 2026 precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, ámbito que comprende la el distrito Veintiséis de Octubre (Piura), con posibles episodios de lluvia de moderada a fuerte intensidad.

En tal sentido, al 5 de octubre de 2026, a veintiséis (26) días del vencimiento del Estado de Emergencia vigente[16] y ante el pronóstico de lluvias superiores a lo normal para el último trimestre del año, la Entidad no ha iniciado la limpieza y descolmatación de nueve (9) drenes **(31 de Enero, ENACE, Petro Perú, Marcavelica, Telefónica, Villa Hermosa, Villa Perú Canadá, Pumacahua y Cero)** ni de la quebrada Pajaritos; advirtiéndose que solo los **Drenes Japón–Turquía y 66** fueron intervenidos, mediante convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La situación expuesta se relaciona con la siguiente normativa:

- ✓ **Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada mediante Ley n.° 29664, publicada el 19 de febrero de 2011, vigente desde el 27 de mayo de 2011 y modificatorias.**

  "[...]
  CAPÍTULO V
  GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
  Artículo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
  14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento.
  14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres.
  [...]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

- ✓ **Decreto Legislativo n.º 1356, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial, publicado el 21 de julio de 2018, vigente desde el 22 de julio de 2018, y modificatorias.**

  "[…]
  Artículo 8. Operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial
  8.1 Los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, son responsables de operar y mantener la infraestructura del drenaje pluvial que se encuentre en su jurisdicción, conforme a lo establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
  […]".

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

- ✓ **Reglamento de la Ley n.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, publicado el 26 de mayo de 2011, vigente desde el 27 de mayo de 2011 y modificatorias.**

  "[...]
  TÍTULO V
  INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL
  [...]
  CAPÍTULO II
  ESTRATEGIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL RIESGO DE DESASTRES.

  Artículo 41.- Definición

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

[16] Decreto Supremo n.º 124-2026-PCM, publicado el 1 de setiembre de 2026.

[...]
41.5 Las entidades públicas priorizan la asignación de recursos presupuestales, para el desarrollo de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastre, preferentemente en lo referido a la atención de emergencias y el proceso de reconstrucción.
[...]

Artículo 49.- Acciones ante situación de peligro inminente
[...]
49.2 Las acciones a desarrollarse deben estar dirigidas únicamente a reducir el impacto del probable desastre por ocurrir y deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, a fin de salvaguardar la seguridad de la población, sus bienes y la infraestructura pública.
[...]

TÍTULO VI
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
Artículo 67.- Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre.
[...]
67.2 La Declaratoria del Estado de Emergencia tiene por finalidad la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias, frente a un peligro inminente o a la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del Gobierno Regional, protegiendo la vida e integridad de las personas, el patrimonio público y privado y restableciendo los servicios básicos indispensables.
[...]".

- ✓ **Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, que declara El Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y La Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, publicado el 2 de julio de 2026.**

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

"[…]
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes; […].
[…]".

- ✓ **Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, publicado el 1 de setiembre de 2026.**

"[…]
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Provincia Constitucional del Callao y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas,
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
[…]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

- ✓ **"Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (2026)", aprobado a través de Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026.**

"[…]
3.2 Desborde de drenes
El Distrito en su jurisdicción tiene aproximadamente 12 drenes dentro del casco urbano, como DREN PETRO PERÚ, DREN MARCAVELICA, DREN JAPON - TURQUIA, DREN VICTOR MALDONADO, DREN 66, DREN CERO, DREN ENACE, DREN PAREDES MACEDA, DREN TELEFONICA, DREN VILLA HERMOSA y DREN POMACAHUA y se desplazan en la mayoría hacia la laguna de los Humedales de Santa Julia y la Laguna "Los Patos" sector Coscomba, ubicada en el mismo distrito, allí se descarga las aguas recolectadas de las cuencas ciegas de diferentes zonas del distrito, sus infraestructuras hidráulicas son a tajo abierto y su sección geométrica es trapezoidal. Abarca varios asentamientos humanos y posesiones informales en su gran mayoría.

El estado situacional de las cajas hidráulicas de los drenes se encuentran colmatada (con presencia de arena, arcilla, vegetación, y con residuos de desechos de, material de construcción y basura), por lo que no cuenta con la capacidad suficiente de descargar el flujo de avenidas pluviales, y ante la ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño y/o Yaku generaría desborde de aguas pluviales, motivo que ante un evento de un niño costero urge la necesidad de intervenir con suma premura en la limpieza y descolmatación del drenaje pluvial de los citados drenes […].

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

3.2.1. Estado Situacional de Dren Turquía – Japón

El dren pluvial se desplaza en dirección Noroeste hacia la laguna "Los patos", ubicada en el mismo distrito, donde descarga las aguas recolectadas de las cuencas ciegas del Chilca e Ignacio Merino, su infraestructura hidráulica es a tajo abierto y su sección geométrica es trapezoidal. Abarca varios asentamientos humanos ubicados en su zona de influencia. La caja hidráulica del drenaje se encuentra colmatada (con presencia de arena y arcilla con presencia de vegetación), por lo que no cuenta con la capacidad suficiente de descargar el flujo de avenidas pluviales, originando desbordes en varios tramos por lo que es necesario y urgente la limpieza total del dren Turquía – Japón.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado en la caja hidráulica del dren de evacuación pluvial, con su extracción permitirá la recuperación de la sección hidráulica, para su ejecución se utilizará maquinaria pesada)*

3.2.2. Estado Situacional de Dren 66

Dren 66, es un dren que nace de la Laguna Los Humedales de Santa Julia del distrito de Veintiséis de Octubre y desemboca en el Dren Sechura que corresponde al distrito de Catacaos, tiene una longitud de aproximadamente 1,498.77 m, del Dren 66 nace el brazo del Dren Cero, Dren Cesar Vallejo llega a desembocar sus aguas en el Dren 66 y Dren Cero.

La situación actual del dren 66 es que se encuentra colmatado de maleza, lo que ha generado que pierda la zanjas de drenantes en algunas partes, debido a la totora impidiendo el flujo de su escorrentía de las aguas. En Épocas de lluvia su capacidad portante es insuficiente por lo que llega a desbordarse en las zonas colindantes afectando a varios sectores emplazados en el distrito. Por ello, ante la ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño, urge la necesidad de intervenir con acciones de mitigación de la limpieza y descolmatación del Dren 66 y Dren Cero, a fin de reforzar su sistema de drenaje en el consolidación y estabilización de taludes del citado dren.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado en la caja hidráulica del dren de evacuación pluvial, con su extracción permitirá la recuperación de la sección hidráulica, para su ejecución se utilizará maquinaria pesada)*

[…]

3.2.4. Estado Situacional de Dren Marcavelica

El Dren Marcavelica tiene un trazo de conducto cerrado de 600 m aproximadamente que inicia en el sector las Malvinas a 100 m de la Av. Don Bosco frente a la Mz. E-L2 y discurre hacia el AH Santa Julia frente, donde vierte sus aguas en la Laguna de Los Humedales de Santa Julia, actualmente se encuentra colmatado de vegetación, residuos de material de construcción, su sección hidráulica ha sido obstruida impidiendo la escorrentía de las aguas pluviales, de presentarse un periodo lluvioso generaría un desborde inundación causando daños de infraestructura pública y privada.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación de la desembocadura del dren siendo un total de 100 m, eliminando el excedente de vegetación y residuos*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado)*

[…]

3.2.5. Estado Situacional de Dren Petro Perú

El dren Petro Perú es un dren a tajo abierto traslada escorrentías pluviales, tramos de trazo natural, tramos de trazo tipo canal vía hacia el dren Maldonado y trazos que son cortados por vías vehiculares (Av. José Carlos Mariátegui, Calle Morropón y Av. Chulucanas).

[…]

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

C) ACCIONES:

- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado.*
- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, eliminando el excedente de vegetación y residuos*

3.2.6. Estado Situacional de Dren Enace (Dunas)

El Dren ENACE (Dunas), ubicado distrito de Veintiséis de Octubre, presenta una longitud aproximada de 757 m y una caja hidráulica de aproximadamente 7 m. El trazo del dren se desarrolla desde el punto de inicio con coordenadas UTM WGS-84 Zona 17 (Norte: 9 427 783.22 / Este: 534 651.62) hasta el punto final con coordenadas (Norte: 9 427 119.60 / Este: 534 333.42), atravesando zonas colindantes como la UPIS Las Dunas, el A.H. Ciudad del Sol y el Conjunto Habitacional Micaela Bastidas ENACE IV Etapa. Actualmente, el dren se encuentra colmatado por acumulación de vegetación, residuos sólidos y material de construcción, lo que ha reducido significativamente su sección hidráulica, impidiendo la adecuada escorrentía de las aguas pluviales. Ante la ocurrencia de un periodo lluvioso intenso, esta situación podría generar desbordes e inundaciones, ocasionando daños a la infraestructura pública y privada de las zonas aledañas.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes reforzando su talud.*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en remoción del material acumulado en la caja hidráulica*

3.2.7. Estado Situacional de Dren Paredes Maceda

La intervención tiene como finalidad realizar la descolmatación del tramo final del Dren Paredes Maceda, con una longitud aproximada de 45.9 m, correspondiente al sector donde desemboca sus aguas en el Dren Maldonado. Dicho tramo se encuentra colmatado por acumulación de vegetación, sedimentos y residuos, lo que ha reducido su sección hidráulica e impide la adecuada evacuación de las aguas pluviales, incrementando el riesgo de desbordes e inundaciones en las zonas colindantes durante eventos de lluvia.

[…]

ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación del cauce del dren, arrimando el material del mismo lecho hacia ambos márgenes reforzando su talud*
- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en la remoción del material acumulado en la caja hidráulica.*

3.2.8. Estado Situacional de Dren Telefónica

El Dren Telefónica, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, cuenta con una longitud aproximada de 142 m y una caja hidráulica de 6 m. Colinda con las zonas A.H. Villa Perú Canadá, Nueva Esperanza y San Sebastián. Actualmente, puede presentar acumulación de sedimentos, vegetación o residuos que limiten la escorrentía de aguas pluviales, lo que podría generar desbordes e inundaciones en las áreas adyacentes durante períodos de lluvia intensa.

[…]

ACCIONES:

- *Realizar la limpieza de material excedente y limpieza de la vegetación*

3.2.9. Estado Situacional del Dren Mateo Pomacahua

El tramo final del Dren Mateo Pomacahua, con una longitud aproximada de 40 m, ubicado en el sector colindante con A.H. Villa Perú Canadá, se encuentra afectado por acumulación de sedimentos, vegetación y residuos. Esta condición ha reducido la sección hidráulica, limitando la escorrentía de aguas pluviales y aumentando el riesgo de desbordes e inundaciones en las áreas aledañas durante periodos de lluvia intensa.

[…]

C) ACCIONES:

- *Se prevé realizar la limpieza y descolmatación de la desembocadura del dren siendo, eliminando el excedente de residuos*

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

- *Rehabilitación de la caja hidráulica (Acción que consiste en el corte y remoción del material acumulado*

[…]

3.3. Desborde de la Quebrada Pajaritos

Otra de las zonas críticas más importantes es Quebrada Pajaritos, la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, en base a su mandato, realizó un recorrido in situ por la zona a las zonas más afectadas por inundaciones climáticas en años anteriores, como es el caso de FEN 2017 y YAKU 2023, las cuales se encontraron en mal estado en la convivencia de Quebrada Pajaritos, de los puntos anteriores, se confirma que existe material de relleno de escombros de construcción y basura arrojados por personas inescrupulosas, lo que se suma a la vegetación existente, que no permite que el agua fluya naturalmente para descargar su caudal, debido a que el estrangulamiento en muchos tramos.

Asimismo, la quebrada no ha tenido intervención de la descolmatación y limpieza en años por parte de las entidades a cargo tanto del ANA y de la Junta de Regantes del Bajo Piura, este hecho agrava más al punto de que en época de lluvias intensas sea el motivo de colapso en varios puntos de la quebrada, afectando a terrenos agrícolas privados y públicos, daños en la infraestructura y pérdidas de ganadería producto de la acumulación de sedimentos, maleza y residuos sólidos, lo que reduce su capacidad de flujo y aumenta el riesgo de inundaciones durante temporadas de lluvias intensas.

[…]

IV. ACCIONES A EJECUTAR

4.1. Acciones Estructurales

[…]

4.2. Acciones No Estructurales

- *Intervención "Limpieza y tratamiento de las cajas hidráulicas, eliminación de excesos, en los Drenes de PETRO PERÚ, DREN MARCAVELICA, DREN JAPON - TURQUIA, DREN VICTOR MALDONADO, DREN 66, DREN CERO, DREN ENACE, DREN PAREDES MACEDA, DREN TELEFONICA y DREN POMACAHUA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE – PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA".*

[…]".

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

La situación expuesta genera el riesgo de desbordes e inundaciones afectando a la población e infraestructura del distrito; debido a la falta de aprobación de fichas técnicas, que impide el inicio de la limpieza y descolmatación en nueve (9) drenes y la quebrada Pajaritos, pese a su colmatación y al estado de emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control al Proceso, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición de cada una de ellas y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

No aplica.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en la "Ejecución presupuestal y acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026 y 2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la "Ejecución presupuestal y acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026 y 2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proceso.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Veintiséis de Octubre, 16 de octubre de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 11:24:08 -05:00

Ingrid Aleida Ramírez Huasasquiche
Supervisora
Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 11:33:20 -05:00

Sandra Maribel More Zapata
Jefa
Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 11:54:08 -05:00

Julio César Córdova Córdova
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre
Contraloría General de la República

APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FENÓMENO EL NIÑO 2026 Y 2027 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE

1. **LA ENTIDAD REGISTRA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DE 31,2% EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068, A CUARENTA Y UN (41) DÍAS DE DECLARADO EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO; SITUACIÓN QUE LIMITA LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO, AFECTANDO A LOS HABITANTES DE ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES EN EL DISTRITO.**

N°	Documento
1	Informe Técnico n.° 005-2026-CG/OC6042-MAGD de 12 de octubre de 2026.
2	Reporte de la Ejecución del Gasto del Programa Presupuestal 0068 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, extraído del Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas al 12 de octubre de 2026.
3	"Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de La Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (2026)", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026.
4	Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026 de 28 de setiembre de 2026.

2. **FALTA DE APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, IMPIDE EL INICIO DE LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN NUEVE (9) DRENES Y LA QUEBRADA PAJARITOS, PESE A SU COLMATACIÓN Y AL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO 2026-2027, GENERANDO EL RIESGO DE DESBORDES E INUNDACIONES, AFECTANDO A LA POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.**

N°	Documento
1	Informe Técnico n.° 005-2026-CG/OC6042-MAGD de 12 de octubre de 2026.
2	Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN MARCAVELICA de 30 de setiembre de 2026.
3	Acta de visita de inspección n.° 01-2026-CGR/OCI-6042-SVC-DREN PETRO PERÚ TRAMO II de 30 de setiembre de 2026.
4	"Plan de Acción del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de La Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (2026)", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 017-2026-MDVO-A de 27 de enero de 2026.
5	Informe n.° 1263-2026-MDVO-OGA-OFIC.ABAST de 5 de agosto de 2026 y órdenes de servicio.
6	Oficio n.° 232-2026-MDVO-GSC-SGGRD de 17 de setiembre de 2026 y sus anexos.
7	Oficio n.° 192-2026-GM/MDVO de 5 de octubre de 2026 y sus anexos.
8	Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026 de 28 de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:32:45 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ HUASASQUICHE Ingrid Aleida FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-10-2026 11:53:27 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por CORDOVA CORDOVA Julio Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 11:57:47 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Veintiseis De Octubre, 16 de Octubre de 2026

OFICIO N° 000537-2026-CG/OC6042

Señor:
José Alejandro Madrid Alamo
Alcalde
Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre
Prolongación Av. Grau Mz. N Lote. 01 AA. HH Las Capullanas
Piura/Piura/Veintiséis de Octubre

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 034-2026-OCI/6042-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
c) Oficio n.° 000515-2026-CG/OC6042 de 30 de setiembre de 2026.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución presupuestal y las acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 034-2026-OCI/6042-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Julio César Córdova Córdova
Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Distrital Veintiséis de Octubre
Contraloría General de la República

(JCC/smz)

Nro. Emisión: 00663 (6042 - 2026) Elab:(U22268 - 6042)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **TRFRBDE**

Firmado digitalmente por MORE ZAPATA Sandra Maribel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 12:28:53 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2026-CG/6042-02-003-030

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000537-2026-CG/OC6042
EMISOR	:	SANDRA MARIBEL MORE ZAPATA - JEFE DE COMISION - OCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	JOSE ALEJANDRO MADRID ALAMO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20529997401
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° FOLIOS	:	35

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución presupuestal y las acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas conteni

Se adjunta lo siguiente:

1. IVC n.° 034-2026-OC-6042-SVC
2. Oficio n.° 000537-2026-CG-OC6042

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AU1WCB9**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2026 12:30:22 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000537-2026-CG/OC6042
EMISOR	:	SANDRA MARIBEL MORE ZAPATA - JEFE DE COMISION - OCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	JOSE ALEJANDRO MADRID ALAMO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución presupuestal y las acciones en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027 de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas conteni

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20529997401**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2026-CG/6042-02-003-030
2. IVC n.° 034-2026-OC-6042-SVC
3. Oficio n.° 000537-2026-CG-OC6042

NOTIFICADOR : SANDRA MARIBEL MORE ZAPATA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **B10HSRS**
